

ZAROZ-M-GGN-ACCAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU : 1
DARI TANGGAL : 09 Oktober 2008
S.D TANGGAL : 12 Oktober 2008

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI
PADANG TUJUH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI

CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURNO ALAM BINA GROUP



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEMERTANAN
LOKASI : PADANG TUJUH
TAHUN : 2008
NO. KONTRAK : 592/172/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : 1
DARI TANGGAL : 09 Oktober 2008
S.D. TANGGAL : 12 Oktober 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES			Ket
			MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S.D. MINGGU INI %	
a	b	c	d	e	f	g
A. LANTAI I						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12.91	-	2.58	2.58	
II	PEKERJAAN BETON	77.76	-	-	-	
III	PEKERJAAN DINDING	3.62	-	-	-	
B. LANTAI II						
I	PEKERJAAN BETON	5.71	-	-	-	
	JUMLAH	100.00	-	2.58	2.58	
REALISASI PROGRES MINGGUAN						
RENCANA PROGRES MINGGUAN						
DEVIASI						



Disetujui Oleh
 Kepala Pelaksana Teknis
 Kegiatan
 Peng. Gedung Kantor Dinas
 Kementan
 Kabupaten
 Pasaman Barat

ASRI HAMDU, ST
 NIP. 410 022 252

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengelola Teknis



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Sani Alam Bina

Pravitno, ST
 Pengawas Lapangan



Pasaman Barat, 12 Oktober 2008

Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Del Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMERANGKUAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMERANGKUAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : I
 DARI TANGGAL : 09 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 12 Oktober 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		PROGRES MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
A. LANTAI I											
I PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	-	-	476,15	2,58	476,15	2,58	
	Jumlah			12,91				2,58		2,58	
II PEKERJAAN BETON											
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ²	14,60	4,45	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ²	4,39	1,39	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	14,70	5,89	-	-	-	-	-	-	
3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	m ³	2,20	0,82	-	-	-	-	-	-	
4	Pasang Balok B2 uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-	
5	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	1,58	0,58	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	m ³	22,83	7,37	-	-	-	-	-	-	
7	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	m ³	3,56	1,33	-	-	-	-	-	-	
8	Pasang Balok Bb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,47	0,19	-	-	-	-	-	-	
9	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,87	0,32	-	-	-	-	-	-	
10	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,90	0,71	-	-	-	-	-	-	
11	Pasang Balok Bb uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-	
12	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,07	0,39	-	-	-	-	-	-	
13	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m ³	18,00	6,75	-	-	-	-	-	-	
14	Pasang Balok Bb uk. 15/20 cm Elevasi 6,0 m	m ³	3,06	1,23	-	-	-	-	-	-	
15	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	m ³	2,16	0,72	-	-	-	-	-	-	
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	11,59	5,45	-	-	-	-	-	-	
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	0,96	0,40	-	-	-	-	-	-	
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 15/35 cm	M ³	1,21	0,32	-	-	-	-	-	-	
19	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ³	1,54	0,63	-	-	-	-	-	-	
20	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke4 uk. 15/25 cm	M ³	2,19	0,67	-	-	-	-	-	-	
16	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ³	5,16	1,91	-	-	-	-	-	-	
17	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 uk. 20/20 cm	M ³	0,80	0,21	-	-	-	-	-	-	
18	Pasang Slek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237,77	0,38	-	-	-	-	-	-	
19	Pasang Lisplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ³	0,49	0,19	-	-	-	-	-	-	
20	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ³	48,20	21,87	-	-	-	-	-	-	
21	Pasang Plat Dack Tebal 10 cm	M ³	24,66	10,91	-	-	-	-	-	-	
22	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ³	0,51	0,16	-	-	-	-	-	-	
23	Pasang Plat Tangga Beton	M ³	3,92	1,62	-	-	-	-	-	-	
24	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1,62	0,67	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah			77,76							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES				KET.	
					MINGGU TALI VOLUME	BOBOT	MINGGU INI VOLUME	BOBOT		S/D MINGGU INI VOLUME
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
III PEKERJAAN DINDING										
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ³	5,06	0,29	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ³	65,05	3,33	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			3,62						
B. LANTAI II										
PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	3,47	1,39	-	-	-	-	-	-
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	7,27	3,42	-	-	-	-	-	-
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	2,16	0,90	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			5,71						



Ditetapkan Oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Pm, Gedung Kantor Dinas
 Kabupaten
 Paseran Barat
 NIP. 090 116 122

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengadaa Teknis
 ASRI HANDI, ST
 NIP. 410 022 232



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Sempurna Bina
 Erdindo, ST
 Pengawas Lapangan




Pasuruan Barat, 12 Oktober 2008
 Ditanda-tangani Oleh
 PT. DAI SURYA JAYA
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/ITJ/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : 1
 DARI TANGGAL : 09 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 12 Oktober 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												PRESTASI	KETERANGAN
			BULAN KE I			BULAN KE II			BULAN KE III			BULAN KE IV				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. LANTAI I															100 %	
I PEKERJAAN PENDAHULUAN		12.91	6.45	6.45												
II PEKERJAAN BETON		77.76			12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96					50 %	
III PEKERJAAN DINDING		3.62									1.81	1.81				
B. LANTAI II																
I PEKERJAAN BETON		5.71													0 %	
JUMLAH		100.00														
JUMLAH ROBOT			6.45	6.45	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	1.81	1.81	2.85	2.85		
ROBOT RENCANA			6.45	12.91	25.87	38.83	51.79	64.75	77.71	90.67	92.48	94.29	97.15	100.00		
REALISASI ROBOT RENCANA			2.852													
ROBOT CEPAT																
ROBOT LAMBAT																

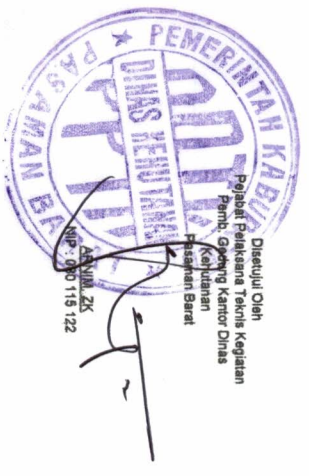

Disetujui Oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Pemb. Gedung Kantor Dinas
 Kehutanan
 Pasaman Barat



Disetujui Oleh
 Direktur
 PT. OHLI SURYA JAYA
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

PROPOSAL - MINGGU - GAGAL

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU : II

DARI TANGGAL : 13 Oktober 2008

S.D TANGGAL : 19 Oktober 2008

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI

PADANG TUJUH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI



CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURINO ALAM BINA GROUP

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN



Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBAHANGUNAN GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN : PEMBAHANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI : PADANG TUJUH


TAHUN : 2008

NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHU/2008

MINGGU KE : II
DARI TANGGAL : 13 Oktober 2008
S.D. TANGGAL : 19 Oktober 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU TALLU		PROGRES MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
A. LANTAI I											
I PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	476,15	2,58	512,40	2,78	988,55	5,36	
	Jumlah			12,91		2,58		2,78		5,36	
II PEKERJAAN BETON											
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ²	14,60	4,45	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ²	4,39	1,39	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	14,70	5,89	-	-	-	-	-	-	
3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	M ³	2,20	0,82	-	-	-	-	-	-	
4	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	M ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-	
5	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	M ³	1,58	0,58	-	-	-	-	-	-	
6	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	M ³	22,83	7,37	-	-	-	-	-	-	
7	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	M ³	3,56	1,33	-	-	-	-	-	-	
8	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	M ³	0,47	0,19	-	-	-	-	-	-	
9	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	M ³	0,87	0,32	-	-	-	-	-	-	
10	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	M ³	1,90	0,71	-	-	-	-	-	-	
11	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	M ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-	
12	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	M ³	1,07	0,39	-	-	-	-	-	-	
13	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	M ³	18,00	6,75	-	-	-	-	-	-	
14	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 6,0 m	M ³	3,06	1,23	-	-	-	-	-	-	
15	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	M ³	2,16	0,72	-	-	-	-	-	-	
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	11,59	5,45	-	-	-	-	-	-	
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	0,96	0,40	-	-	-	-	-	-	
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke1 uk. 15/35 cm	M ³	1,21	0,32	-	-	-	-	-	-	
19	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ³	1,54	0,63	-	-	-	-	-	-	
20	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke4 uk. 15/25 cm	M ³	2,19	0,67	-	-	-	-	-	-	
16	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ³	5,16	1,91	-	-	-	-	-	-	
17	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 Uk. 20/20 cm	M ³	0,80	0,21	-	-	-	-	-	-	
18	Pasang Stek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237,77	0,38	-	-	-	-	-	-	
19	Pasang Lestiplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ²	0,49	0,19	-	-	-	-	-	-	
20	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ²	48,20	21,87	-	-	-	-	-	-	
21	Pasang Plat Deck Tebal 10 cm	M ²	24,66	10,91	-	-	-	-	-	-	
22	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ³	0,51	0,16	-	-	-	-	-	-	
23	Pasang Plat Tangga Beton	M ³	3,92	1,62	-	-	-	-	-	-	
24	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1,62	0,67	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah			77,76		-		-		-	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU TALLU		PROGRES		S/D MINGGU INI	KET.
					VOLUME	BOBOT	MINGGU INI	BOBOT		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
III PEKERJAAN DINDING										
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ³	5.06	0.29		-		-	-	-
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ³	65.05	3.33		-		-	-	-
	Jumlah			3.62		-		-	-	-
B. LANTAI II										
PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	3.47	1.39		-		-	-	-
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	7.27	3.42		-		-	-	-
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	2.16	0.90		-		-	-	-
	Jumlah			5.71		-		-	-	-

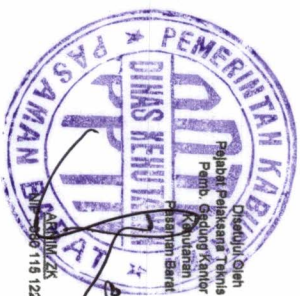

Disetujui Oleh
 Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan
 Pemo. Gedung Kantor Dinas
 Kabupaten Pasaman Barat
 ASRI HANU/ ZIK
 NIP. 90 118 122

[Signature]

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengabdian Teknis
 ASRI HANU, ST
 NIP. 410 022 232

[Signature]



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Santi Alam Bina
 Erandito, ST
 Pengawas Lapangan

[Signature]



Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Dewi Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

[Signature]


Pasaman Barat 19 Oktober 2008

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/ITZ/KONTRAK/DIRSHUT/2008

MINGGU KE : II
 DARI TANGGAL : 13 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 19 Oktober 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												PRESTASI	KETERANGAN
			BULAN KE I			BULAN KE II			BULAN KE III							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. LANTAI I																
I PEKERJAAN PENDAHULUAN		12.91	6.45	6.45												
II PEKERJAAN BETON		77.76			12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96						
III PEKERJAAN DINDING		3.62									1.81	1.81				
B. LANTAI II																
I PEKERJAAN BETON		5.71														
JUMLAH		100.00														
JUMLAH ROBOT			6.45	6.45	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	1.81	1.81	2.85	2.85		
ROBOT RENCANA			6.45	12.91	25.87	38.83	51.79	64.75	77.71	90.67	92.48	94.29	97.15	100.00		
REALISASI ROBOT RENCANA			2.582	5.360												
ROBOT CEPAT																
ROBOT CEPAT																
ROBOT LAMBAT																



Ditandatangani Oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Pemb. Gedung Kantor Dinas
 Kehutanan
 Pasaman Barat
 ASNIM ZK
 NIP. 1968115 122

Dibuat Oleh Kontraktor
 RT. Dell Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Dirkur II
 Pasaman Barat, 19 Oktober 2008

TAUGGUNGJAWAB

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU :

III

DARI TANGGAL :

20 Oktober 2008

S.D TANGGAL :

26 Oktober 2008

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI

PADANG TUJUH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI



CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURINO ALAM BINA GROUP

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN




Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : III
 DARI TANGGAL : 20 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 26 Oktober 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES				Ket
			MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S.D. MINGGU INI %		
a	b	c	d	e	f	g	
A. LANTAI I							
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12.91	5.36	3.43	8.79		
II	PEKERJAAN BETON	77.76	-	1.39	1.39		
III	PEKERJAAN DINDING	3.62	-	-	-		
B. LANTAI II							
I	PEKERJAAN BETON	5.71	-	-	-		
	JUMLAH	100.00	5.36	4.82	10.18		
	REALISASI PROGRES MINGGUAN						
	RENCANA PROGRES MINGGUAN						
	DEVIASI						



Direktori Ombudsman
 Kepala Seksi Teknis Pelaksanaan
 P. S. S. Kantor Dinas
 Kabupaten Pasaman Barat
 KKNM, ZK
 No. 145/100

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengelola Teknis
 ASRI HAMDI, ST
 NIP. 410 022 282



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Saritama, Bina
 Pengendalian Lapangan



Pasaman Barat 26 Oktober 2008
 Dibuat Oleh Kontakor
 PT. Deji Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI MASUTION
 Direktur II

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TERJER
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUR/2008

MINGGU KE : III
 DARI TANGGAL : 20 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 26 Oktober 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES				KET.	
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU INI		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
A. LANTAI I										
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	988,55	5,36	632,40	3,43	1.620,95	8,79
	Jumlah			12,91		5,36		3,43		8,79
II PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/ 25 cm	M ²	14,60	4,45	-	-	-	-	-	
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/ 20 cm	M ²	4,39	1,39	-	4,39	1,39	4,39	1,39	
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/ 35 cm	M ³	14,70	5,89	-	-	-	-	-	
3	Pasang Balok B2 uk. 20/ 25 cm Elevasi 4,0 m	m ³	2,20	0,82	-	-	-	-	-	
4	Pasang Balok Rb uk. 15/ 20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	
5	Pasang Balok Bk uk. 15/ 20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	1,58	0,58	-	-	-	-	-	
6	Pasang Balok B1 uk. 25/ 35 cm Elevasi 4,10 m	m ³	22,83	7,37	-	-	-	-	-	
7	Pasang Balok B2 uk. 20/ 25 cm Elevasi 4,10 m	m ³	3,56	1,33	-	-	-	-	-	
8	Pasang Balok Rb uk. 15/ 20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,47	0,19	-	-	-	-	-	
9	Pasang Balok Bk uk. 15/ 20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,87	0,32	-	-	-	-	-	
10	Pasang Balok B2 uk. 20/ 25 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,90	0,71	-	-	-	-	-	
11	Pasang Balok Rb uk. 15/ 20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	
12	Pasang Balok Bk uk. 15/ 20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,07	0,39	-	-	-	-	-	
13	Pasang Balok B2 uk. 20/ 25 cm Elevasi 5 m	m ³	18,00	6,75	-	-	-	-	-	
14	Pasang Balok Rb uk. 15/ 20 cm Elevasi 6,0 m	m ³	3,06	1,23	-	-	-	-	-	
15	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/ 30 cm	m ³	2,16	0,72	-	-	-	-	-	
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/ 20 cm	M ³	11,59	5,45	-	-	-	-	-	
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/ 20 cm	M ³	0,96	0,40	-	-	-	-	-	
18	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 15/ 35 cm	M ³	1,21	0,32	-	-	-	-	-	
19	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/ 20 cm	M ³	1,54	0,63	-	-	-	-	-	
20	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke4 uk. 15/ 25 cm	M ³	2,19	0,67	-	-	-	-	-	
16	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KPl uk. 13/ 13 cm	M ³	5,16	1,91	-	-	-	-	-	
17	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KPr2 Uk. 20/ 20 cm	M ³	0,80	0,21	-	-	-	-	-	
18	Pasang Stiek Kolom Praktis uk. 13/ 13 cm	Kg	237,77	0,38	-	-	-	-	-	
19	Pasang Lstiplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ³	0,49	0,19	-	-	-	-	-	
20	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ³	48,20	21,87	-	-	-	-	-	
21	Pasang Plat Dack Tebal 10 cm	M ³	24,66	10,91	-	-	-	-	-	
22	Pasang Balok B3 25/ 50 Balok Bawah Bordes	M ³	0,51	0,16	-	-	-	-	-	
23	Pasang Plat Tangga Beton	M ³	3,92	1,62	-	-	-	-	-	
24	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1,62	0,67	-	-	-	-	-	
	Jumlah			77,76			1,39		1,39	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU TALLU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
III	PEKERJAAN DINDING										
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ³	5.06	0.29	-	-	-	-	-	-	
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ³	65.05	3.33	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah			3.62	-	-	-	-	-	-	
	B. LANTAI II										
I	PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	3.47	1.39	-	-	-	-	-	-	
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	7.27	3.42	-	-	-	-	-	-	
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	2.16	0.90	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah			5.71	-	-	-	-	-	-	



Ditetapkan Oleh
 Kepala Dinas Teknik Kegiatan
 Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Pasaman Barat
 ZK
 NIP. 0807115122

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengabdian Teknis
 ASRI HAMDI, ST
 NIP. 410 022 232



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Sanj Alam Bina
 Prayitno, ST
 Pengawas Lapangan



Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Del Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Diriku II

Pasaman Barat 26 Oktober 2008



TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/72/KONTRAK/DIRHUT/2008

MINGGU KE : III
 DARITANGGAL : 20 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 26 Oktober 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												PRESTASI	KETERANGAN								
			BULAN KE I			BULAN KE II			BULAN KE III			1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
A. LANTAI I																								
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12.91	6.45	6.45																				100 %
II	PEKERJAAN BETON	77.76			12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	50 %
III	PEKERJAAN DINDING	3.62																						
B. LANTAI II																								
I	PEKERJAAN BETON	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	0 %
JUMLAH		100.00																						
	JUMLAH ROBOT		6.45	6.45	6.45	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	2.85
	ROBOT RENCANA		6.45	12.91	12.91	25.87	38.83	51.79	64.75	77.71	90.67	92.48	94.29	97.15	100.00									2.85
	REALISASI ROBOT RENCANA		2.582	5.360	10.179																			
	ROBOT CEPAT																							
	ROBOT CEPAT																							
	ROBOT LAMBAT																							



Diwakili Oleh
 Pejabat Pembina Teknis Kegiatan
 Pemda. Gedung Kantor Dinas
 Kehutanan
 Kabupaten Batak
 Kabupaten Batak
 JALUR ZK
 NIP. 090 116 122

Pasaman Barat 26 Oktober 2008
 Dibuat Oleh Kontraktor
 Etn. Ceil Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN HARIAN

PT. DELI SURYA JAYA

PADA HARI : MINGGU

TANGGAL : 26 OKTOBER 2008

S/D TANGGAL : 26 OKTOBER 2008

TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

MINGGU KE : III

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PU KAB. PASAMAN BARAT

I. JAM KERJA
SIANG JAM : 08.00 s/d. 18.00 = 9 JAM
MALAM JAM : .. JAM

II. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Pembantu Pelaksana	Org	1
3	Adm Lapangan	Org	1
4	Logistik/ Gudang	Org	1
5	Tukang Kayu	Org	2
6	Kepala Tukang Kayu	Org	1
7	Mandor	Org	1
8	Pekerja	Org	30
9	Tukang Batu	Org	2
10	Kepala Tukang Batu	Org	-
11	Tukang Cat	Org	-
12	Kepala Tukang Cat	Org	-
13	Tukang Besi	Org	-
14	Kepala Tukang Besi	Org	-

V. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
	Pembersihan Lapangan	M2	820.00

III. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Situ	M3	24
6			

VI. INSTRUKSI

NO	ISI INSTRUKSI	PARAF

IV. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Cangkuli	Unt	20
2			
3			
4			
5			

VII. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Germis													
Hujan													
JAM <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>JML.</td>	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Germis													
Hujan													

Ket. = Baik = Germis = Hujan

Diketahui Oleh:
Asisten Teknis,
ASRIHAMDIL ST
NIP. 410 022 252



Simpang Empat, 26 Oktober 2008
Dibuat Oleh:
PT. DELI SURYA JAYA
MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

ZARON-MAGNAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU : IV

DARI TANGGAL : 27 Oktober 2008

S.D TANGGAL : 02 Nopember 2008

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI

PADANG TUJUH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI



CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURINO ALAM BINA GROUP

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN



Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KERTANTANAN
 LOKASI : PADANG TERJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 592/172/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : IV
 DARI TANGGAL : 27 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 02 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES			Ket
			MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S.D. MINGGU INI %	
a	b	c	d	e	f	g
A. LANTAI I						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12.91	8.79	4.12	12.91	
II	PEKERJAAN BETON	77.76	1.39	0.16	1.55	
III	PEKERJAAN DINDING	3.62	-	-	-	
B. LANTAI II						
I	PEKERJAAN BETON	5.71	-	-	-	
	JUMLAH	100.00	10.18	4.29	14.46	
	REALISASI PROGRES MINGGUAN					
	RENCANA PROGRES MINGGUAN					
	DEVIASI					



Dipertujui Oleh
 Kepala Dinas Perumahan,
 Ruang Terbuka Hijau dan
 Perencanaan Kota
 Kabupaten Pasaman Barat
 M. KAMAL ZK
 NIP. 400.148.199

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengalola Teknis
 ASRI HAMLI ST
 NIP. 410.022.282



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Sani Alam Bina
 EROKINO, ST
 Pengawas Lapangan



Pasaman Barat 02 Nopember 2008
 Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Delli Surya Jaya
 MOHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TENGAH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : sz2172/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : IV
 DARI TANGGAL : 27 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 02 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES				KET.	
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	BOBOT		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
A. LANTAI I										
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	1.620,95	8,79	759,81	4,12	2.380,76	12,91
	Jumlah			12,91		8,79		4,12		12,91
II PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ²	14,60	4,45	-	-	-	-	-	-
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ²	4,39	1,39	4,39	1,39	-	-	4,39	1,39
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ²	14,70	5,89	-	-	-	-	-	-
3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	m ³	2,20	0,82	-	-	0,44	0,16	0,44	0,16
4	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-
5	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	1,58	0,58	-	-	-	-	-	-
6	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	m ³	22,83	7,37	-	-	-	-	-	-
7	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	m ³	3,56	1,33	-	-	-	-	-	-
8	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,47	0,19	-	-	-	-	-	-
9	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,87	0,32	-	-	-	-	-	-
10	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,90	0,71	-	-	-	-	-	-
11	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-
12	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,07	0,39	-	-	-	-	-	-
13	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m ³	18,00	6,75	-	-	-	-	-	-
14	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 5 m	m ³	3,06	1,23	-	-	-	-	-	-
15	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	m ³	2,16	0,72	-	-	-	-	-	-
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ²	11,59	5,45	-	-	-	-	-	-
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ²	0,96	0,40	-	-	-	-	-	-
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke1 uk. 15/35 cm	M ²	1,21	0,32	-	-	-	-	-	-
19	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ²	1,54	0,63	-	-	-	-	-	-
20	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke4 uk. 15/25 cm	M ²	2,19	0,67	-	-	-	-	-	-
16	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 19/13 cm	M ²	0,80	0,21	-	-	-	-	-	-
17	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 Uk. 20/20 cm	M ²	0,80	0,21	-	-	-	-	-	-
18	Pasang Slek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237,77	0,38	-	-	-	-	-	-
19	Pasang Lathplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ²	0,49	0,19	-	-	-	-	-	-
20	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ³	48,20	21,87	-	-	-	-	-	-
21	Pasang Plat Deck Tebal 10 cm	M ²	24,66	10,91	-	-	-	-	-	-
22	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ³	0,51	0,16	-	-	-	-	-	-
23	Pasang Plat Tangga Beton	M ²	3,92	1,62	-	-	-	-	-	-
24	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1,62	0,67	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			77,76		1,39		0,16		1,55

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRESS			KET.		
					MINGGU TALLU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
III	PEKERJAAN DINDING									
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 12	M ³	5,06	0,29						
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 14	M ³	65,05	3,33						
	Jumlah			3,62						
B. LANTAI II										
PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	3,47	1,39						
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	7,27	3,42						
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	2,16	0,90						
	Jumlah			5,71						



Ditetapkan Oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Pem. Gedung Kantor Dinas
 Kesehatan
 Kabupaten
 Pasaman Barat
 H. Zulkarnaini, ZK
 NIP. 1060 118 122

[Signature]

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengabdian Teknis
 ASRI HAMDI, ST
 NIP. 410 022 232

[Signature]



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Sani Alam Bina
 Eridina, ST
 Pengawas Lapangan

[Signature]



Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Daili Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

[Signature]

Pasaman Barat 02 Nopember 2008



TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 52/172/KONTRAK/DHS/UT/2008

MINGGU KE : IV
 DARITANGGAL : 27 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 02 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												PRESTASI	KETERANGAN
			BULAN KE I			BULAN KE II			BULAN KE III			BULAN KE IV				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. LANTAI I																
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12.91	6.45	6.45											100%	
II	PEKERJAAN BETON	77.76			12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96					50%	
III	PEKERJAAN DINDING	3.62													0%	
B. LANTAI II																
I	PEKERJAAN BETON	5.71													2.85	
JUMLAH																
	JUMLAH ROBOT	100.00	6.45	6.45	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	1.81	1.81	2.85	2.85		
	ROBOT RENCANA	-	6.45	12.91	23.87	38.83	51.79	64.75	77.71	90.67	92.48	94.29	97.15	100.00		
	REALISASI ROBOT RENCANA	-	2.582	3.360	10.179	14.464										
	ROBOT CEPAT															
	ROBOT LAMBAT															



Pasaman Barat, 02 Nopember 2008
 Dibuat Oleh Kontraktor
 P.1. Delli Surya Jaya
 MUHAMMAD FALZI NASUTION
 Direktur II

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARU		LAPORAN HARIAN		PT. DELI SURYA JAYA	
		PADA HARI : SENIN TANGGAL : 27 OKTOBER 2008	MINGGU KE : IV TANGGAL : 27 OKTOBER 2008 S/D TANGGAL : 02 NOVEMBER 2008		

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

I. JAM KERJA
 SIANG JAM 08.00 s/d. 18.00 = 9 JAM
 MALAM JAM = .. JAM

II. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Pembantu Pelaksana	Org	-
3	Adm Lapangan	Org	1
4	Logistik/Gudang	Org	1
5	Tukang Kayu	Org	3
6	Kepala Tukang Kayu	Org	1
7	Mandor	Org	1
8	Pekerja	Org	12
9	Tukang Batu	Org	
10	Kepala Tukang Batu	Org	
11	Tukang Cat	Org	
12	Kepala Tukang Cat	Org	
13	Tukang Besi	Org	3
14	Kepala Tukang Besi	Org	1

V. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	Timbunan Sirtu		
2	Pekerjaan Begisting		

III. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Kayu s/7	M3	8
2	Papan Bekisting	M3	10
3	Semen	Zak	200
4	Besi	Kg	450
5	Paku	Kg	10.000
6	Pasir	M3	15
7	Kerikil	M3	17
8	Sirtu	M3	35

VI. INSTRUKSI

NO	ISI INSTRUKSI	PARAF

IV. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			

VII. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>JML.</th>	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket. = Baik = Gerimis = Hujan

Diketahui Oleh:
 Pengawas Pengelola Teknis
 ASRIHAMDI, ST
 NIP. 410 022 252

Konsultansi Pengawas
 Prayitno, ST
 Pengawas Lapangan

Simpang Empat, 27 Oktober 2008
 Dibuat Oleh:
 PT. DELI SURYA JAYA
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Site ektur II

REPOR-MAKING

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU : V
DARI TANGGAL : 03 Nopember 2008
S.D TANGGAL : 09 Nopember 2008

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI
PADANG TUJUH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI



CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURINO ALAM BINA GROUP

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR**
 PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN**
 LOKASI : **PADANG TUJUH**
 TAHUN : **2008**

MINGGU KE : **V**
 DARI TANGGAL : **03 Nopember 2008**
 S.D. TANGGAL : **09 Nopember 2008**

NO. KONTRAK : **592/172/KONTRAK/DISHUT/2008**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES				Ket
			MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S.D. MINGGU INI %		
a	b	c	d	e	f	g	
A. LANTAI I							
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12.91	12.91	-	12.91		
II	PEKERJAAN BETON	77.76	1.55	4.73	6.28		
III	PEKERJAAN DINDING	3.62	-	0.60	0.60		
B. LANTAI II							
I	PEKERJAAN BETON	5.71	-	-	-		
	JUMLAH	100.00	14.46	5.33	19.80		
	REALISASI PROGRES MINGGUAN						
	RENCANA PROGRES MINGGUAN						
	DEVIASI						




Diperiksa Oleh
 Kepala Pelaksanaan Teknis
 Kabupaten Pasaman Barat
 Pamb. Gedung Kantor Dinas
 Kehutanan
 Pasaman Barat
 ASRI HAMDI, ST
 NIP. 410 022 252

(Signature)

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengalida Teknis



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Sani Alam Bina
 Emritio, ST
 Pengawas Lapangan



Pasaman Barat 09 Nopember 2008

Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Dell Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Diketur II

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBAANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBAANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : V
 DARI TANGGAL : 03 Nopember 2008
 S.D. TANGGAL : 09 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		PROGRES MINGGU INI		S/D MINGGU INI	KET.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
A. LANTAI I										
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	2.380,76	12,91	-	-	2.380,76	12,91
	Jumlah			12,91		12,91				12,91
II PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ²	14,60	4,45	-	-	-	-	-	-
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ²	4,39	1,39	4,39	1,39	-	-	4,39	1,39
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ²	14,70	5,89	-	-	-	-	-	-
3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	m ³	2,20	0,82	0,44	0,16	-	-	0,44	0,16
4	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-
5	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	1,58	0,58	-	-	-	-	-	-
6	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	m ³	22,83	7,37	-	-	-	-	-	-
7	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	m ³	3,56	1,33	-	-	-	-	-	-
8	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,47	0,19	-	-	-	-	-	-
9	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,87	0,32	-	-	-	-	-	-
10	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,90	0,71	-	-	-	-	-	-
11	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-
12	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,07	0,39	-	-	-	-	-	-
13	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m ³	18,00	6,75	-	-	-	-	-	-
14	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 6,0 m	m ³	3,06	1,23	-	-	-	-	-	-
15	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	m ³	2,16	0,72	-	-	-	-	-	-
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ²	11,59	5,45	-	-	-	-	-	-
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ²	0,96	0,40	-	-	-	-	-	-
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke1 uk. 15/35 cm	M ²	1,21	0,32	-	-	-	-	-	-
19	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ²	1,54	0,63	-	-	-	-	-	-
20	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke4 uk. 15/25 cm	M ²	2,19	0,67	-	-	-	-	-	-
16	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KPr1 uk. 13/13 cm	M ²	5,16	1,91	-	-	-	-	-	-
17	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KPr2 uk. 20/20 cm	M ²	0,80	0,21	-	-	-	-	-	-
18	Pasang Slek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237,77	0,38	-	-	-	-	237,77	0,38
19	Pasang Lapislank Beton Bk.3 Teras Depan	M ²	0,49	0,19	-	-	-	-	-	-
20	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ²	48,20	21,87	-	-	-	-	-	-
21	Pasang Plat Duck Tebal 10 cm	M ²	24,66	10,91	-	-	-	-	-	-
22	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ²	0,51	0,16	-	-	-	-	-	-
23	Pasang Plat Tangga Beton	M ²	3,92	1,62	-	-	-	-	-	-
24	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ²	1,62	0,67	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			77,76	1,55		4,73			6,28

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES				KET.	
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU INI		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
III. PEKERJAAN DINDING										
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ³	5,06	0,29	-	-	0,84	0,05	0,84	0,05
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ³	65,05	3,33	-	-	10,84	0,56	10,84	0,56
	Jumlah			3,62				0,60		0,60
B. LANTAI II										
PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	3,47	1,39	-	-	-	-	-	-
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	7,27	3,42	-	-	-	-	-	-
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	2,16	0,90	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			5,71						



Dibuat oleh
 Pejabat Pembina Teknis Kegiatan
 Dinas Pemerintahan dan Kependudukan
 Pasaman Barat
 NIP. 410 118 192

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengaloha Teknis
 ASRI HANDI, ST
 NIP. 410 022 252



Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Seni Alam Bina
 Prayitno, ST
 Pengawas Lapangan



Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Debi Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Dirker II


Pasaman Barat 09 Nopember 2008

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
LOKASI : PADANG TUJUH
TAHUN : 2008
NO. KONTRAK : 522/ITZ/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : V
 HARI TANGGAL : 03 Nopember 2008
 S.D. TANGGAL : 09 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN												PRESTASI	KETERANGAN
			BULAN KE I			BULAN KE II			BULAN KE III							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	A. LANTAI I															
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12,91	6,45	6,45												
II	PEKERJAAN BETON	77,76			12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96						
III	PEKERJAAN DINDING	3,62									1,81	1,81				
I	B. LANTAI II															
	PEKERJAAN BETON	5,71												2,85	2,85	
	Jumlah	100,00														
	Jumlah Robot		6,45	6,45	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	1,81	1,81	2,85	2,85		
	Robot Rencana		6,45	12,91	25,87	38,83	51,79	64,75	77,71	90,67	92,48	94,29	97,15	100,00		
	Realisasi Robot Rencana		2,582	5,360	10,179	14,464	19,798									
	Robot Cepat															
	Robot Lambat															

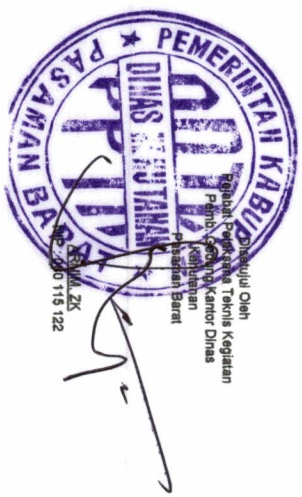

Disetujui Oleh
 Kepala Pengawasan Teknis Kegiatan
 Pando Satrio, N. Kantor Dinas
 Kehutanan
 Pasaman Barat
 2008
 NPM. ZK
 200115122

Pasaman Barat, 09 Nopember 2008
 Oleh
 Oluwal Oluwal Kontraktor
 PT. Deil Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN HARIAN

PT. DELI SURYA JAYA

PADA HARI : SELASA

TANGGAL : 04 NOVEMBER 2008

MINGGU KE : V

TANGGAL : 03 NOVEMBER 2008

S/D TANGGAL : 09 NOVEMBER 2008

KEGIATAN

: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PU KAB. PASAMAN BARAT

I. JAM KERJA

SIANG JAM : 08.00 s/d. 18.00 = 9 JAM

MALAM JAM : .. JAM

II. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Pembantu Pelaksana	Org	-
3	Adm Lapangan	Org	1
4	Logistik/ Gudang	Org	1
5	Tukang Kayu	Org	3
6	Kepala Tukang Kayu	Org	1
7	Mandor	Org	1
8	Pekerja	Org	40
9	Tukang Batu	Org	3
10	Kepala Tukang Batu	Org	1
11	Tukang Cat	Org	-
12	Kepala Tukang Cat	Org	-
13	Tukang Besi	Org	3
14	Kepala Tukang Besi	Org	1

V. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	Timbunan Sirtu		
2	Pabrikasi Besi		
3	Pekerjaan Begisting		
4	Pekerjaan Kolom		
5	Pekerjaan Batu Bata		

III. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Sirtu	M3	18
2	Atap	Kd	1.50
3	Paku	Kg	5
4	Triplek	Kd	4
5	Sirtu	M3	0.00
6			

IV. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji	Unt	1
2	Palu	Unt	2
3	Theodolite	Set	1
4	Meteran	Unt	2
5			


VII. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML
Baik													
Germis													
Hujan													
Baik													
Germis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML

Ket. = Baik = Germis = Hujan

ASRIHAMDJ, ST
NIP. 410 022 252

Diketahui Oleh:
Asisten Teknis



Pengawas Lapangan
PRAYITNO, ST

MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

Simpang Empat, 04 Nopember 2008
Dibuat Oleh:
PT. DELI SURYA JAYA



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN HARIAN

PT. DELI SURYA JAYA

PADA HARI : SABTU

TANGGAL : 08 NOVEMBER 2008

MINGGU KE : V

TANGGAL : 03 NOVEMBER 2008

S/D TANGGAL : 09 NOVEMBER 2008

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PU KAB. PASAMAN BARAT

I. JAM KERJA

SIANG JAM : 08.00 s/d. 18.00 = 9 JAM
MALAM JAM : .. JAM

II. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Pembantu Pelaksana	Org	-
3	Adm Lapangan	Org	1
4	Logistik/ Gudang	Org	1
5	Tukang Kayu	Org	3
6	Kepala Tukang Kayu	Org	1
7	Mandor	Org	1
8	Pekerja	Org	40
9	Tukang Batu	Org	3
10	Kepala Tukang Batu	Org	1
11	Tukang Cat	Org	-
12	Kepala Tukang Cat	Org	-
13	Tukang Besi	Org	3
14	Kepala Tukang Besi	Org	1

V. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	Timbunan Sirtu		
2	Pabrikasi Besi		
3	Pekerjaan Begisting		
4	Pekerjaan Kolom		
5	Pekerjaan Batu Bata		

III. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Sirtu	M3	0
2	Pasir	M3	22
3	Batu Kali	M3	12
4			
5			
6			

VI. INSTRUKSI

NO	ISI INSTRUKSI	PARAF

IV. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Cangkul	Unt	8
2	Palu	Unt	6
3	Gergaji	Unt	4
4	Meteran	Unt	2
5			

VII. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket. = Baik = Gerimis = Hujan

ASRI HAMDIL, ST
NIP. 410 022 252

Diketahui Oleh:
Asisten Teknis.

Pengawas Lapangan
FRAYITNO, ST

Konsultan Pengawas

MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

PT. DELI SURYA JAYA
Dibuat Oleh:

Simpang Empat, 08 November 2008

NAUGGZ-MAROPAL

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU : VI

DARI TANGGAL : 10 Nopember 2008

S.D TANGGAL : 16 Nopember 2008

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI
PADANG TUJUH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI

CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURINGO ALAM BINA GROUP



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN




Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
LOKASI : PADANG TUJUH
TAHUN : 2008
NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : VI
DARI TANGGAL : 10 Nopember 2008
S.D. TANGGAL : 16 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES			Ket
			MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S.D. MINGGU INI %	
a	b	c	d	e	f	g
A. LANTAI I						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	14,46	14,46	-	14,46	
II	PEKERJAAN BETON	82,65	9,60	28,08	37,69	
III	PEKERJAAN DINDING	2,89	0,60	2,07	2,67	
	JUMLAH	100,00	24,67	30,15	54,82	
REALISASI PROGRES MINGGUAN						
RENCANA PROGRES MINGGUAN						
DEVIASI						



Dikoferkasi Oleh
 Pengawas Pengalola Teknis
 ASRIHAMDI, ST
 NIP. 410 022 252



Pasaman Barat 16 Nopember 2008
 Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Dail Surya Jaya
 MOHAMMAD FAUZI NASUTTON
 Diktur II

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR**
 PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN**
 LOKASI : **PADANG TUJUH**
 TAHUN : **2008**
 NO. KONTRAK : **522/172/KONTRAK/DISHUT/2008**

MINGGU KE : **VI**
 DARl TANGGAL : **10 Nopember 2008**
 S.D. TANGGAL : **16 Nopember 2008**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	ROBOT (%)	MINGGU LALU		PROGRES MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KET.	
					VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
A. LANTAI												
PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	2.380,76	12,91	-	2.380,76	12,91	2.380,76	12,91	
2	Plank Papan Nama Proyek	Bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	1,00	0,02	1,00	0,02	
3	Pembuatan Direksi Keet	M ²	45,00	0,51	45,00	0,51	-	45,00	0,51	45,00	0,51	
4	Pembuatan Los Kerja	M ²	28,00	0,21	28,00	0,21	-	28,00	0,21	28,00	0,21	
5	Pembersihan Lapangan	M ²	1.887,00	0,34	1.887,00	0,34	-	1.887,00	0,34	1.887,00	0,34	
6	Pas. Pondasi Batu Kali	m ³	14,41	0,46	14,41	0,46	-	14,41	0,46	14,41	0,46	
	Jumlah			14,46		14,46					14,46	
II. PEKERJAAN BETON												
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ³	14,60	4,45	-	-	14,60	4,45	14,60	4,45	4,45	
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ³	5,53	1,75	4,39	1,39	1,14	0,36	5,53	1,75	1,75	
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	14,70	5,89	-	-	14,70	5,89	14,70	5,89	5,89	
4	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	m ³	2,20	0,82	0,44	0,16	0,55	0,21	0,99	0,37	0,37	
5	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	0,30	0,12	-	-	0,08	0,03	0,08	0,03	0,03	
6	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	1,58	0,58	-	-	0,40	0,14	0,40	0,14	0,14	
7	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	m ³	22,83	7,37	5,71	1,84	5,71	1,84	11,42	3,69	3,69	
8	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	m ³	3,56	1,33	0,89	0,33	0,89	0,33	1,78	0,67	0,67	
9	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,47	0,19	-	-	0,12	0,05	0,12	0,05	0,05	
10	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,87	0,32	0,22	0,08	0,22	0,08	0,44	0,16	0,16	
11	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,90	0,71	0,48	0,18	0,48	0,18	0,95	0,36	0,36	
12	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	0,30	0,12	0,27	0,10	0,08	0,03	0,15	0,06	0,06	
13	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,07	0,39	0,27	0,10	0,27	0,10	0,54	0,20	0,20	
14	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m ³	18,00	6,75	4,50	1,69	4,50	1,69	9,00	3,37	3,37	
15	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 6,0 m	m ³	3,06	1,23	-	-	0,77	0,31	0,77	0,31	0,31	
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	m ³	1,11	0,37	-	-	0,28	0,09	0,28	0,09	0,09	
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	26,46	11,06	6,62	2,76	6,62	2,76	13,23	5,53	5,53	
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ³	1,54	0,63	-	-	0,39	0,16	0,39	0,16	0,16	
19	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ³	5,16	1,91	-	-	1,29	0,48	1,29	0,48	0,48	
20	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 Uk. 20/20 cm	M ³	0,80	0,21	-	-	0,20	0,05	0,20	0,05	0,05	
21	Pasang Stiek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237,77	0,38	237,77	0,38	-	237,77	0,38	237,77	0,38	
22	Pasang Lestiplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ²	0,49	0,19	-	-	0,12	0,05	0,12	0,05	0,05	
23	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ²	48,20	21,87	-	-	12,05	5,47	12,05	5,47	5,47	
24	Pasang Plat Dack Tebal 10 cm	M ²	24,66	10,91	-	-	6,17	2,73	6,17	2,73	2,73	
25	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ³	0,51	0,16	-	-	0,13	0,04	0,13	0,04	0,04	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES				KET.	
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
26	Pasang Plat Tangga Beton	M ²	3.92	1.62	-	-	0.98	0.40	0.98	0.40
27	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1.62	0.67	-	-	0.41	0.17	0.41	0.17
28	Pekerjaan Membobok	Thik	98.00	0.09	98.00	0.09	-	-	98.00	0.09
29	Pasang Slek Kolom K3	Kg	247.74	0.40	247.74	0.40	-	-	247.74	0.40
30	Pasang Balok Praktis uk. 15/15 cm Dilatae Kuzen	M3	0.68	0.17	0.68	0.17	-	-	0.68	0.17
	Jumlah			82.65		9.60		28.08		37.69
III PEKERJAAN DINDING										
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ²	5.06	0.29	0.84	0.05	3.61	0.21	4.46	0.26
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ²	50.79	2.60	10.94	0.56	36.28	1.86	47.12	2.41
	Jumlah			2.89		0.60		2.07		2.67



Ditujukan Oleh
 Pejabat Inkuiransi, Timnis Kegiatan
 Bimbi Gedung Kantor Dinas Kehutanan
 Pasaman Barat
 ARIM ZK
 NIP. 90 115 122

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengelola Teknis
 ASRI HAMDI, ST
 NIP. 410 022 252



Diperiksa Oleh
 Koordinator Pengawas
 CV. Prima Seni Alam Bina
 Prayitno, ST
 Pengawas Lapangan



Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Delli Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II


Pasaman Barat 16 Nopember 2008

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/ITZ/KONTRAK/DHUT/2008

MINGGU KE : VI
 DARI TANGGAL : 10 Nopember 2008
 S.D. TANGGAL : 16 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN										PRESTASI	KETERANGAN
			BULAN KE. I			BULAN KE. II				BULAN KE. III				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A. LANTAI I														
I PEKERJAAN PENDAHULUAN		14,46	7,23	7,23									100 %	
II PEKERJAAN BETON		82,65			13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77			50 %	
III PEKERJAAN DINDING		2,89									1,45	1,45	0 %	
	JUMLAH	100,00	7,23	7,23	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	1,45	1,45		
	JUMLAH ROBOT		7,23	7,23	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	1,45	1,45		
	ROBOT RENCANA	-	7,23	14,46	28,23	42,01	55,78	69,56	83,33	97,11	98,55	100,00		
	REALISASI ROBOT RENCANA		2,582	5,360	10,179	14,464	24,667	34,816						
	ROBOT CEPAT													
	ROBOT CEPAT													
	ROBOT LAMBAT													



Pasaman Barat, 16 Nopember 2008

ZARU-M-ZAGZAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU : VII

DARI TANGGAL : 17 Nopember 2008

S.D TANGGAL : 23 Nopember 2008

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI

PADANG TUJUH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI



CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURINO ALAM BINA GROUP

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEMERTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 392/172/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : VII
 DARI TANGGAL : 17 Nopember 2008
 S.D. TANGGAL : 23 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES			Ket
			MINGGU LALU %	MINGGU INI %	S.D. MINGGU INI %	
a	b	c	d	e	f	g
A. LANTAI I						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	14,46	14,46	-	14,46	
II	PEKERJAAN BETON	82,65	37,69	30,29	67,98	
III	PEKERJAAN DINDING	2,89	2,67	0,13	2,80	
	JUMLAH	100,00	54,82	30,42	85,24	
	REALISASI PROGRES MINGGUAN					
	RENCANA PROGRES MINGGUAN					
	DEVIASI					



Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengalola Teknis
 ASRI HAMDI, ST
 NIP. 410 022 292



Diperiksa Oleh
 Koordinator Pengawas
 CV. Prima Seni Alam Blina
 ERANDI, ST
 Pengawas Lapangan



Pasaman Barat 23 Nopember 2008
 Dikur oleh Kontraktor
 PT. DILLI SAYA JAYA
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Dikur II

LAPORAN MINGGUAN

KEGATATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PERABANGAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008

MINGGU KE : VII
 DARI TANGGAL : 17 Nopember 2008
 S.D. TANGGAL : 23 Nopember 2008

NO. KONTRAK : 522172/KONTRAK/DISHUT/2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES			S/D MINGGU INI	K	KET.
					MINGGU LAJU	MINGGU INI	MINGGU LAJU			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A. LANTAI										
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	2.380,76	12,91	-	2.380,76	12,91	
2	Plank Papan Nama Proyek	Bh	1,00	0,02	1,00	0,02	-	1,00	0,02	
3	Pembuatan Direksi Keet	M ²	45,00	0,51	45,00	0,51	-	45,00	0,51	
4	Pembuatan Los Kerja	M ²	28,00	0,21	28,00	0,21	-	28,00	0,21	
5	Pembersihan Lapangan	M ²	1.887,00	0,34	1.887,00	0,34	-	1.887,00	0,34	
6	Pas. Pondasi Batu Kali	m ³	14,41	0,46	14,41	0,46	-	14,41	0,46	
	Jumlah			14,46		14,46			14,46	
II PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ³	14,60	4,45	14,60	4,45	-	14,60	4,45	
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ³	5,53	1,75	5,53	1,75	-	5,53	1,75	
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	14,70	5,89	14,70	5,89	-	14,70	5,89	
4	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	m ³	2,20	0,82	0,99	0,37	0,88	0,33	1,87	0,70
5	Pasang Balok Rp uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	0,30	0,12	0,08	0,03	0,12	0,05	0,20	0,08
6	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	1,58	0,58	0,40	0,14	0,63	0,23	1,03	0,37
7	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	m ³	22,83	7,37	11,42	3,69	9,13	2,95	20,55	6,63
8	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	m ³	3,56	1,33	1,78	0,67	1,42	0,53	3,20	1,20
9	Pasang Balok Rp uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,47	0,19	0,12	0,05	0,19	0,08	0,31	0,12
10	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,87	0,32	0,44	0,16	0,35	0,13	0,78	0,29
11	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,90	0,71	0,95	0,36	0,76	0,28	1,71	0,64
12	Pasang Balok Rp uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	0,30	0,12	0,15	0,06	0,12	0,05	0,27	0,11
13	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,07	0,39	0,54	0,20	0,43	0,16	0,96	0,35
14	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m ³	18,00	6,75	9,00	3,37	7,20	2,70	16,20	6,07
15	Pasang Balok Rp uk. 15/20 cm Elevasi 6,0 m	m ³	3,06	1,23	0,77	0,31	1,22	0,49	1,99	0,80
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	M ³	1,11	0,37	0,28	0,09	0,83	0,28	1,11	0,37
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	26,46	11,06	13,23	5,53	13,23	5,53	26,46	11,06
18	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 10/20 cm	M ³	1,54	0,63	0,39	0,16	0,87	0,39	1,16	0,43
19	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ³	5,16	1,91	1,29	0,48	3,87	1,43	5,16	1,91
20	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 Uk. 20/20 cm	M ³	0,80	0,21	0,20	0,05	0,60	0,16	0,80	0,21
21	Pasang Stiek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237,77	0,38	237,77	0,38	-	237,77	0,38	
22	Pasang Lapislank Beton Bk.3 Teras Depan	M ²	48,20	21,87	12,05	5,47	20,96	9,51	33,01	14,98
23	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ²	24,66	10,91	6,17	2,73	9,86	4,36	16,03	7,99
24	Pasang Plat Dack Tebal 10 cm	M ²	0,51	0,16	0,13	0,04	0,20	0,06	0,33	0,10
25	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ³								

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	ROBOT (%)	PROGRES				KET.	
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU INI		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
26	Pasang Plat Tangga Beton	M ²	3,92	1,62	0,98	0,40	1,57	0,65	2,55	1,05
27	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1,62	0,67	0,41	0,17	0,65	0,27	1,05	0,43
28	Pekerjaan Memhobok	THK	98,00	0,09	98,00	0,09	-	-	98,00	0,09
29	Pasang Slek Kolom K3	Kg	247,74	0,40	247,74	0,40	-	-	247,74	0,40
30	Pasang Balok Praktis uk. 15/15 cm Diatas Kuzen	M3	0,68	0,17	0,68	0,17	-	-	0,68	0,17
	Jumlah			82,65		37,69		30,29		67,98
III PEKERJAAN DINDING										
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ²	5,06	0,29	4,46	0,26	0,24	0,01	4,70	0,27
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ²	50,79	2,60	47,12	2,41	2,20	0,11	49,32	2,53
	Jumlah			2,89		2,67		0,13		2,80



Ditunjuk Oleh
Kepala Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
NIP. 890 115 122
ZS

ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 282



Diperiksa Oleh
Pengawas Lapangan
Prayitno, ST
NIP. 410 022 282



Dibuat Oleh Kontraktor
PT. DAILI SURYA JAYA
MURHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II

Pasaman Barat 23 Nopember 2008

TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/ITZ/KONTRAK/IDSHUT/2008


MINGGU KE : VII
 DARI TANGGAL : 17 Nopember 2008
 S.D. TANGGAL : 23 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ROBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN										PRESTASI	KETERANGAN	
			BULAN KE. I			BULAN KE. II				BULAN KE. III					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
A.	LANTAI I														
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	14.46	7.23	7.23										100 %	
II	PEKERJAAN BETON	82.65			13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77				50 %	
III	PEKERJAAN DINDING	2.89										1.45	1.45	0 %	
	JUMLAH	100.00													
	JUMLAH ROBOT		7.23	7.23	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77					
	ROBOT BENCANA		7.23	14.46	28.23	42.01	55.78	69.56	83.33	97.11					
	REALISASI ROBOT RENCANA		2.892	5.360	10.179	14.464	24.667	34.816	44.969	55.121					
	ROBOT CEPAT														
	ROBOT CEPAT														
	ROBOT LAMBAT														



Ditandatangani Oleh
 Pejabat Pembina Teknis Kegiatan
 Pimp. Sekeloa Kantor Dinas
 Kehutanan
 Pasaman Barat
 M. ZK
 0115 122

Pasaman Barat, 23 Nopember 2008
 Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Dell Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI MASUTION
 Direktur II

 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	<h1>LAPORAN HARIAN</h1>	PT. DELI SURYA JAYA
KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN		
MINGGU KE : VII TANGGAL : 17 NOVEMBER 2008 S/D TANGGAL : 23 NOVEMBER 2008		

I. JAM KERJA
 08.00 s/d. 18.00 = 9 JAM
 MALAM JAM = .. JAM

II. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Pembantu Pelaksana	Org	-
3	Adm Lapangan	Org	1
4	Logistik/ Gudang	Org	1
5	Tukang Kayu	Org	3
6	Kepala Tukang Kayu	Org	1
7	Mandor	Org	1
8	Pekerja	Org	40
9	Tukang Batu	Org	3
10	Kepala Tukang Batu	Org	1
11	Tukang Cat	Org	-
12	Kepala Tukang Cat	Org	-
13	Tukang Besi	Org	3
14	Kepala Tukang Besi	Org	1

V. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	Pekerjaan Begisting	M2	27.00
2	Pabrikasi Besi	Kg	250.00
3	Pekerjaan Balok	M3	12.00
4	Pekerjaan Batu Bata	M3	2.00

III. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Kayu 5/7	M3	8
2	Papan Bekisting	M3	10
3	Semen		
4	Besi		
5			
6			

IV. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			

VII. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML
Baik													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML
Baik													
Hujan													

Ket. = Baik = GERMIS = Hujan

Diketahui Oleh:
 Pengawas Pengelola Teknis
 ASRI HAMDJI, ST
 NIP. 410 022 252



Simpang Empat, 17 Nopember 2008
 Dibuat Oleh:
 PT. DELI SURYA JAYA
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Site ektur II

ZARUBAZAR

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

BULAN KE : 1

DARI TANGGAL : 09 Oktober 2008

S.D TANGGAL : 02 Nopember 2008

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI

PADANG TUJUH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI



CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURINO ALAM BINA GROUP

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat



REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

BULAN KE : 1

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

DARI TANGGAL : 09 Oktober 2008

LOKASI : PADANG TUJUH

S.D. TANGGAL : 02 Nopember 2008

TAHUN : 2008

NO KONTRAK : 592/172/KONTRAK/DISHUT/2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES				Ket
			BULAN LALU %	BULAN INI %	S.D. BULAN INI %		
a	b	c	d	e	f	g	
A. LANTAI I							
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12.91	2.58	10.33	12.91		
II	PEKERJAAN BETON	77.76	-	1.55	1.55		
III	PEKERJAAN DINDING	3.62	-	-	-		
B. LANTAI II							
I	PEKERJAAN BETON	5.71	-	-	-		
	JUMLAH	100.00	2.58	11.88	14.46		
REALISASI PROGRES MINGGUAN							
RENCANA PROGRES MINGGUAN							
DEVIASI							

Diseetujui Oleh
Pejabat Palaksanaan Teknik
Kepala
Pemb. Gedung Kantor Dinas
Kehutanan
Pasaman Barat

Diperiksa Oleh
Pengawas Pengadaia Teknik

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV. Prima Seni Alam Bina

Pasaman Barat 02 Nopember 2008

ARINI, ZK
NIP. 700 142 173

ASRIHAMOLI, ST
NIP. 410 022 282

ERATNO, ST
Pengawas Lapangan

MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Diktur. II

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMHANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMHANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

BULAN KE : I
 DARI TANGGAL : 09 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 02 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES			S/D BULAN INI	KET.	
					BULAN LALU	BULAN INI	BULAN INI			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
A. LANTAI I										
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	476,15	2,58	1.904,61	10,33	2.380,76	12,91
	Jumlah			12,91		2,58		10,33		12,91
II PEKERJAAN BETON										
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ²	14,60	4,45	-	-	-	-	-	-
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ³	4,39	1,39	-	-	4,39	1,39	4,39	1,39
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	14,70	5,89	-	-	-	-	-	-
3	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	m ³	2,20	0,82	-	-	0,44	0,16	0,44	0,16
4	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-
5	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	1,58	0,58	-	-	-	-	-	-
6	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	m ³	22,83	7,37	-	-	-	-	-	-
7	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	m ³	3,56	1,33	-	-	-	-	-	-
8	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,47	0,19	-	-	-	-	-	-
9	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,87	0,32	-	-	-	-	-	-
10	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,90	0,71	-	-	-	-	-	-
11	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	0,30	0,12	-	-	-	-	-	-
12	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,07	0,39	-	-	-	-	-	-
13	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m ³	18,00	6,75	-	-	-	-	-	-
14	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 6,0 m	m ³	3,06	1,23	-	-	-	-	-	-
15	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	m ³	2,16	0,72	-	-	-	-	-	-
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	11,59	5,45	-	-	-	-	-	-
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	0,96	0,40	-	-	-	-	-	-
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke1 uk. 15/35 cm	M ³	1,21	0,32	-	-	-	-	-	-
19	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ³	1,54	0,63	-	-	-	-	-	-
20	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke4 uk. 15/25 cm	M ³	2,19	0,67	-	-	-	-	-	-
16	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KPr1 uk. 13/13 cm	M ³	5,16	1,91	-	-	-	-	-	-
17	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KPr2 Uk. 20/20 cm	M ³	0,80	0,21	-	-	-	-	-	-
18	Pasang Slek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	Kg	237,77	0,38	-	-	-	-	-	-
19	Pasang Leliplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ²	0,49	0,19	-	-	-	-	-	-
20	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ³	48,20	21,87	-	-	-	-	-	-
21	Pasang Plat Deck Tebal 10 cm	M ³	24,66	10,91	-	-	-	-	-	-
22	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ³	0,51	0,16	-	-	-	-	-	-
23	Pasang Plat Tangga Beton	M ³	3,92	1,62	-	-	-	-	-	-
24	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1,62	0,67	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			77,76				1,55		1,55

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	PROGRES				KET.
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN INI	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
III PEKERJAAN DINDING									
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ³	5,06	0,29	-	-	-	-	-
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ³	65,05	3,33	-	-	-	-	-
	Jumlah			3,62					
B. LANTAI II									
PEKERJAAN BETON									
1	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ³	3,47	1,39	-	-	-	-	-
2	Pasang Kolom Beton Bertulang K2 uk. 20/20 cm	M ³	7,27	3,42	-	-	-	-	-
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ³	2,16	0,90	-	-	-	-	-
	Jumlah			5,71					



Dipertika Oleh
 Pejabat Pembina Teknis Kegiatan
 Kepala Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Pasaman Barat
 NIM. ZK
 Nomor : 080 118 122

ASRI HANU, ST
 NIP. 410 022 232



Dipertika Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Seni Alam Bina
 Pengawas Lapangan
 Erandita, ST



Dibuat Oleh Kontraktor
 PT. Dewi Surya Jaya

MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Dikur II

Pasaman Barat 02 Nopember 2008

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PERKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TJJEH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/172/KONTRAK/DISHUT/2008

BULAN KE : 1
 DARI TANGGAL : 09 Oktober 2008
 S.D. TANGGAL : 02 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES			Ket
			BULAN LALU %	BULAN INI %	S.D. BULAN INI %	
a	b	c	d	e	f	g
A. LANTAI I						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	12.91	2.58	10.33	12.91	
II	PEKERJAAN BETON	77.76	-	1.55	1.55	
III	PEKERJAAN DINDING	3.62	-	-	-	
B. LANTAI II						
I	PEKERJAAN BETON	5.71	-	-	-	
	JUMLAH	100.00	2.58	11.88	14.46	
REALISASI PROGRES MINGGUAN						
RENCANA PROGRES MINGGUAN						
DEVIASI						



Disebutkan Oleh
 Kepala Pelaksana Teknis
 Bidang Pelaksanaan
 Kantor Dinas
 Kehutanan
 Kalimantan Barat
 NIM. ZK
 NIP. 410 022 262

Diperiksa Oleh
 Pengawas Pengelola Teknis

ASRI HAMLI, ST
 NIP. 410 022 262

Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. Prima Sani Alam Bina

Erando, ST
 Pengawas Lapangan

Pasaman Barat 02 Nopember 2008
 Ditetapkan Oleh Kontraktor
 PT. Deli Surya Jaya
 MUHAMMAD FAUZI NASUTION
 Direktur II

ZARUBAZAR

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU : II

DARI TANGGAL : 02 Nopember 2008

S.D TANGGAL : 23 Nopember 2008

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

LOKASI

PADANG TUJUH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KONTRAKTOR

PT. DELI SURYA JAYA

KONSULTANT SUPERVISI



CV. PRIMA SENI ALAM BINA
PLANNING DIVISION
MATURING ALAM BINA GROUP

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN



Jalan Jati II Pasaman Baru - Simpang Empat

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

MINGGU KE : II

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

DARI TANGGAL : 02 Nopember 2008

LOKASI : PADANG TUJUH

S.D. TANGGAL : 23 Nopember 2008

TAHUN : 2008

NO. KONTRAK : 322/172/KONTRAK/DISHUT/2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRES			Ket
			BULAN LALU %	BULAN INI %	S.D. BULAN INI %	
a	b	c	d	e	f	g
A. LANTAI I						
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	14,46	12,91	1,55	14,46	
II	PEKERJAAN BETON	82,65	1,55	66,43	67,98	
III	PEKERJAAN DINDING	2,89	-	2,80	2,80	
	JUMLAH	100,00	14,46	70,77	85,24	
	REALISASI PROGRES MINGGUAN					
	RENCANA PROGRES MINGGUAN					
	DEVIASI					



Disetujui Oleh
Kepala Dinas Teknik
Bina, Gedung Kantor Dinas
Kebudayaan
Pasaman Barat

Diperiksa Oleh
Pangawas Pengalola Teknis

ASRI HANDI, ST
NIP. 410 022 252



Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV. PRIMA SENI ALAM BINA

ERATNO, ST
Pengawas Lapangan



Pasaman Barat 23 Nopember 2008
Dibuat Oleh Kontraktor
PT. DELL SURYA JAYA

MUHAMMAD FAUZI NASUTION
Direktur II


LAPORAN BULANAN

KECIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN
 LOKASI : PADANG TUJUH
 TAHUN : 2008
 NO. KONTRAK : 522/72/KONTRAK/DISHUT/2008

MINGGU KE : II
 DARl TANGGAL : 02 Nopember 2008
 S.D. TANGGAL : 23 Nopember 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	ROBOT (%)	BULAN LALU		PROGRES BULAN INI		S/D BULAN INI		KET.
					VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
A. LANTAI I											
I PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Timbunan Lokasi Proyek	M ³	2.380,76	12,91	2.380,76	12,91	-	-	2.380,76	12,91	
2	Plank Papan Nama Proyek	Bh	1,00	0,02	-	-	1,00	0,02	1,00	0,02	
3	Pembuatan Dheksi Keet	M2	45,00	0,51	-	-	45,00	0,51	45,00	0,51	
4	Pembuatan Los Kerja	M2	28,00	0,21	-	-	28,00	0,21	28,00	0,21	
5	Pembersihan Lapangan	M2	1.887,00	0,34	-	-	1.887,00	0,34	1.887,00	0,34	
6	Pas. Pondasi Batu Kali	m ³	14,41	0,46	-	-	14,41	0,46	14,41	0,46	
	Jumlah			14,46		12,91		1,55		14,46	
II PEKERJAAN BETON											
1	Pasang Sloof Beton Bertulang S2 uk. 20/25 cm	M ²	14,60	4,45	-	-	14,60	4,45	14,60	4,45	
2	Pasang Sloof Beton Bertulang S3 uk. 15/20 cm	M ²	5,53	1,75	4,39	1,39	1,14	0,36	5,53	1,75	
3	Pasang Kolom Beton Bertulang K1 uk. 25/35 cm	M ²	14,70	5,89	-	-	14,70	5,89	14,70	5,89	
4	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,0 m	m ³	2,20	0,82	0,44	0,16	1,43	0,54	1,87	0,70	
5	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	0,30	0,12	-	-	0,20	0,08	0,20	0,08	
6	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,0 m	m ³	1,58	0,58	-	-	1,03	0,37	1,03	0,37	
7	Pasang Balok B1 uk. 25/35 cm Elevasi 4,10 m	m ³	22,83	7,37	-	-	20,55	6,63	20,55	6,63	
8	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,10 m	m ³	3,56	1,33	-	-	3,20	1,20	3,20	1,20	
9	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,47	0,19	-	-	0,31	0,12	0,31	0,12	
10	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,10 m	m ³	0,87	0,32	-	-	0,78	0,29	0,78	0,29	
11	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,90	0,71	-	-	1,71	0,64	1,71	0,64	
12	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	0,30	0,12	-	-	0,27	0,11	0,27	0,11	
13	Pasang Balok BK uk. 15/20 cm Elevasi 4,7 m	m ³	1,07	0,39	-	-	0,96	0,35	0,96	0,35	
14	Pasang Balok B2 uk. 20/25 cm Elevasi 5 m	m ³	18,00	6,75	-	-	16,20	6,07	16,20	6,07	
15	Pasang Balok Rb uk. 15/20 cm Elevasi 5 m	m ³	3,06	1,23	-	-	1,99	0,80	1,99	0,80	
16	Pasang Kolom Beton Bertulang K4 uk. 30/30 cm	m ³	1,11	0,37	-	-	1,11	0,37	1,11	0,37	
17	Pasang Kolom Beton Bertulang K3 uk. 20/20 cm	M ²	26,46	11,06	-	-	26,46	11,06	26,46	11,06	
18	Pasang Kolom Beton Bertulang Ke2 uk. 10/20 cm	M ²	1,54	0,63	-	-	0,39	0,16	0,39	0,16	
19	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP1 uk. 13/13 cm	M ²	5,16	1,91	-	-	5,16	1,91	5,16	1,91	
20	Pasang Kolom Praktis Beton Bertulang KP2 Uk. 20/20 cm	M ²	0,80	0,31	-	-	0,80	0,21	0,80	0,21	
21	Pasang Stiek Kolom Praktis uk. 13/13 cm	M ²	237,77	0,38	-	-	237,77	0,38	237,77	0,38	
22	Pasang Lstiplank Beton Bk.3 Teras Depan	M ²	0,49	0,19	-	-	0,32	0,13	0,32	0,13	
23	Pasang Plat Lantai Tebal 12 cm	M ²	48,20	21,87	-	-	33,01	14,98	33,01	14,98	
24	Pasang Plat Dack Tebal 10 cm	M ²	24,66	10,91	-	-	16,03	7,09	16,03	7,09	
25	Pasang Balok B3 25/50 Balok Bawah Bordes	M ²	0,51	0,16	-	-	0,33	0,10	0,33	0,10	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	ROBOT (%)	PROGRES				KET.	
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	ROBOT		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
26	Pasang Plat Tangga Beton	M ²	3,92	1,62	-	-	2,55	1,05	2,55	1,05
27	Pasang Beton Bertulang Anak Tangga Beton	M ³	1,62	0,67	-	-	1,05	0,43	1,05	0,43
28	Pekerjaan Memhobok	TRK	98,00	0,09	-	-	98,00	0,09	98,00	0,09
29	Pasang Slek Kolom K3	Kg	247,74	0,40	-	-	247,74	0,40	247,74	0,40
30	Pasang Balok Praktis uk. 15/15 cm Dilatas Kuzen	M3	0,68	0,17	-	-	0,68	0,17	0,68	0,17
	Jumlah			82,65		1,55		66,43		67,98
PEKERJAAN DINDING										
1	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:2	M ²	5,06	0,29	-	-	4,70	0,27	4,70	0,27
2	Pek. Dinding 1/2 Bata ad. 1:4	M ²	50,79	2,60	-	-	49,32	2,53	49,32	2,53
	Jumlah			2,89		-		2,80		2,80



Diperiksa Oleh
Pengawas Pengalola Teknis

[Signature]
ASRIHAMOLI, ST
NIP. 410 022 292



Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV. Prima Seni Alam Bina

[Signature]
Rendina, ST
Pengawas Lapangan

Dibuat Oleh Kontraktor
PT. Dali Surya Jaya

[Signature]
MURHAMMAD FAUZI NASUTION
Diktur II

Pasaman Barat 23 Nopember 2008
