



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Jl. KKN. Km 1 Simpang Empat Telp. 0753-466287

## **BERITA ACARA PHO**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG  
WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
NOMOR KONTRAK : 522/028/SPK-Peng / DISHUT-PB/2007 ✓  
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2007  
NILAI KONTRAK : Rp. 49.402.000,-  
NOMOR ADD – 1 KONTRAK : -  
TANGGAL : -  
NILAI ADDENDUM : -

**PELAKSANA**

**CV. WIRATAMA KARYA**

PINAGA, NAGARI AUA KUNIANG, KEC. PASAMAN

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN ( PHO )**  
**PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK**  
**DAN PENGAMANAN PONDASI**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

Nomor : 522/09/PPTK/DISHUT-PB...../2007  
Tanggal : 21 DESEMBER.....2007

---

ANTARA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

**CV. WIRATAMA KARYA**

Atas Pelaksanaan Pekerjaan

**PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK**  
**DAN PENGAMANAN PONDASI**

---

Kontrak : 522/028/SPK-Peng / DISHUT-PB/2007  
Tanggal : 05 NOPEMBER 2007  
ADD – 1 Kontrak No : -  
Tanggal : -

---

Pada hari ini <sup>sehari</sup> Jumat tanggal ~~dua puluh~~ <sup>dua puluh</sup> ~~dua~~ <sup>dua</sup> Desember bertahun *dua ribu tujuh*, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **EDWAR. Z, AMd.**  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan ( PPTK )  
Alamat : Jln. KKN. Km 1 Simpang Empat Kab. Pasaman Barat Telp. 0753- 466287

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya disebut **PENGGUNA JASA**

2. Nama : **KHAIRUNAS**  
Jabatan : Direktur **CV. WIRATAMA KARYA**  
Alamat : Pinga, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. WIRATAMA KARYA Selanjutnya disebut **PENYEDIA JASA**.

Berdasarkan Kontrak Pada :

Kontrak No : 522/028/SPK-Peng / DISHUT-PB/2007 Tanggal 05 Nopember 2007  
1. ADD – 1 Kontrak No : -  
2. Berita Acara Penelitian dan Penerimaan Pekerjaan  
Dinas Kehutanan Kab. Pas. Bar. No. 522/08/PPTK/DISHUT-PB Tanggal 19 DESEMBER 2007

Dengan ini PENYEDIA JASA dan PENGGUNA JASA sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PENYEDIA JASA dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas telah menyerahkan Pekerjaan kepada PENGGUNA JASA telah menerima dengan baik dari PENYEDIA JASA pekerjaan sebagai berikut :

Nama Kegiatan : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
Pekerjaan : Pembuatan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Sasak dan Pengamanan Pondasi  
Kontrak No/Tgl : 522/028/SPK-Peng / DISHUT-PB/2007 Tanggal 05 Nopember 2007  
Nilai Kontrak : **Rp. 49.402.000,-**  
ADD-1 Kontrak No./Tgl : -  
Nilai ADD-1 Kontrak : -  
BAP HP. PHO No/Tgl : Tanggal 2007

2. Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan ADD-1 Kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
3. Pekerjaan tersebut di atas sudah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya.
4. Rekanan/Kontraktor berkewajiban memperbaiki dan menambah segala kerusakan dalam masa 104 ( seratus empat ) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima ini ditanda tangani.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( PHO ) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas.


Yang Menyerahkan  
**PENYEDIA JASA**  
**CV. WIRATAMA KARYA**

**KHAIRUNAS**  
Direktur

Yang Menerima  
**PENGGUNA JASA**  
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**EDWAR. Z. Amd**  
NIP. 080 087 109

Disetujui Oleh :  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
NIP. 710 019 855



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN. Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

## BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN / PROFESIONAL HAND OVER ( PHO )

NOMOR : 522/08/PPTK/DISHUT-PB/2007

Tanggal : 19 DESEMBER 2007

**KEGIATAN** : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
**LOKASI** : SASAK, KEC. SASAK RANAH PASISIE  
**KONTRAKTOR** : CV. WIRTAMA KARYA  
**NO KONTRAK** : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007

Pada Hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Desember Dua Ribu Tujuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:  
 Berdasarkan surat keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/574/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 22 November 2007.

Selaku Panitia Peneliti dan Penerimaan Pekerjaan/Profesional Hand Over ( PHO ) Dinas kehutanan  
 Kabupaten Pasaman Barat telah meneliti dan menerima Pekerjaan yang diserahkan CV. WIRATAMA KARYA








1. Pelaksana Pekerjaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	MENURUT KONTRAK			VOLUME PELAKSANAAN			KETERANGAN
		SATUAN	VOLUME	BOBOT	SIAP	VOLUME	BOBOT	
<b>A PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>								
1	Pembersihan Lapangan	M2	210,00	1,19				
2	Pas. Papan Bouwplank	M1	19,00	0,81				
<b>B PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	Galian Tanah Pondasi	M3	37,50	2,13				
2	Urugan Bekas Galian	M3	9,37	0,26				
3	Urugan Tanah Didatangkan	M3	39,70	5,44				
4	Pasangan Anstampang Batu Kali	M3	15,00	5,85				
5	Pasangan Pondasi Batu Kali	M3	33,00	32,38				
<b>C PEKERJAAN BETON</b>								
1	Pasangan Sloof 13/20	M3	2,25	14,92				
2	Pasangan Kolom 13/13	M3	0,95	7,16				
3	Pek. Ring Balok Uk. 13/20	M3	1,80	10,75				
<b>D PEKERJAAN DINDING</b>								
1	Pas. Dinding Batako 1:4	M2	66,00	10,87				
2	Afwerking Kolom	M2	12,00	1,02				
3	Pas. Pagar BRC	Unit	4,00	1,57				
4	Pas. Pintu Dorong + Aksesoris	Unit	1,00	4,45				
5	Pas. Kawat Berduri	M1	180,00	1,20				
				100,00				

- Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak dan ADD-1 Kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Kontrak dan Spesifikasi teknis.
- Pekerjaan tersebut di atas sudah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya
- Rekanan/Kontraktor berkewajiban memperbaiki dan menambah segala kerusakan dan kekurangan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari
- Segala biaya yang ditimbulkan selama masa pemeliharaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ( PHO ) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

**PANITIA PENELITIAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN  
PROVISIONAL HAND OVER ( PHO )  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. DARUL CHUTNI	KETUA / MERANGKAP ANGGOTA	1. 
2.	ZULCHAIMI CH. NASUTION	SEKRETARIS/MERANGKAP ANGGOTA	2. 
3.	SYAFRIADI CHANDRA. SE. M.SI	ANGGOTA	3. 
4.	Drs. SASTRA LUBIS	ANGGOTA	4. 
5.	AKDIMEN, BE.	ANGGOTA	5. 
6.	SETIA BAKTI, SH	ANGGOTA	6. 
7.	RAMAIZAR	ANGGOTA	7. 

Pengawas Lapangan  
Dinas Kehutanan




**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Penyedia Jasa  
CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Direktur

Pejabat Pelaksana teknis kegiatan  
( PPTK )



**EDWAR. Z. Amd.**  
Nip. 080 087 109

## DAFTAR CACAT / KURANG

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : SASAK KEC. SASAK RANAH PASISIE, KAB. PASAMAN BARAT  
 NONTRAK : /028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS CACAT	PENANGANAN	TANGGAPAN
		1. Timbunan di- belakang pagar Kontraksi Aggr di Atap dan di Atik 2. Pagar Aggr di Atap dan dan sempit tidak 3. Pembersihan Sd? - material Aggr di sekitarnya.		Segera dilaksa- nakan. Segera di laka- nakan Segera dilaksa- nakan.

Panitia Serah Terima



**Drs. H. DARUL CHUTNI**

Kontraktor Pelaksana  
**CV. WIRATAMA KARYA**



**KHAIRUNAS**  
 Direktur

## PERSYARATAN SERAH TERIMA PEKERJAAN ( PHO/FHO )

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT

PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK  
 DAN PENGAMANAN PONDASI

KONTRAK NO./TGL : 522/028/SPK-Peng / DISHUT-PB/2007

PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

LOKASI : SASAK KEC. SASAK RANAH PISISIE KAB. PASAMAN BARAT

NO	URAIAN	CEKLIS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	KONTRAK	✓		
2.	MC - O	✓		
3.	AKTUAL CHECK	✓		
4.	FOTO DOKUMENTASI	✓		
5.	LAPORAN ( MINGGUAN/HARIAN )	✓		
6.	SHOP DRAWING	✓		
7.	ASBUILD DRAWING	✓		
8.	JAMINAN PEMELIHARAAN	✓		

Penyedia Jasa  
**CV. WIRATAMA KARYA**



**KHAIRUNAS**  
 Direktur

Disetujui Oleh :  
 Panitia Serah Terima

**Drs. H. DARUL CHUTNI**  
 Ketua

**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO/FHO)  
PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK  
DAN PENGAMANAN PONDASI  
TAHUN ANGGARAN 2007**

---

**NOTULEN RAPAT**

Hari / Tanggal : RABU / 19 Desember 2007  
Jam : 9<sup>00</sup> WIB  
Tempat : Kantor Dmas Kebutanan

Kesimpulan Rapat :

1. Pelaksanaan Persiapan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) akan dilakukan pemeriksaan Administrasi dan Fisik Pekerjaan dilapangan
2. Pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama dan dibuatkan kelengkapan hasil pemeriksaan serta Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan
3. Jadwal Kunjungan ke lapangan akan disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun untuk seluruh paket pekerjaan
4. Bila dalam pemeriksaan. Baik administrasi maupun fisik dilapangan ternyata belum memenuhi persyaratan untuk PHO, maka pelaksanaan serah terima pekerjaan tidak dapat dilakukan
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan sekaligus merupakan hasil kunjungan lapangan dan tindakan setelah kunjungan lapangan
6. Sesuai dengan Kontrak No 522/028/SPK-Peng / DISHUT-PB/2007 tanggal 5 Nopember 2007, Penyedia Jasa wajib memelihara pekerjaan selama 90 ( sembilan puluh ) hari kalender setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
7. Segala biaya yang timbul selama masa pemeliharaan pekerjaan tersebut di atas menjadi tanggungan Penyedia Jasa

Demikianlah Notulen Rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas

Disetujui Oleh :  
Ketua Panitia

Pencatat Hasil Rapat  
Sekretaris

  
**Drs. H. DARUL CHUTNI**

  
**ZULCHAIMI. CH Nst**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Jl. KKN. Km 1 Simpang Empat Telp. 0753-466287

Simpang Empat, 18 Desember 2007

Nomor : 522/07/PPTK/DISHUT - PB/2007  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan PHO Pekerjaan  
Pembuatan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Sasak  
Dan Pengamanan Pondasi  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Kepada Yth :  
Panitia Serah Terima & Penerima Pekerjaan  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
di -

Simpang Empat

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari direktur CV. WIRATAMA KARYA No. 07/PPHO-WK/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, perihal permohonan PHO Pekerjaan PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI berlokasi di Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak No. 522/028/SPK-Peng / DISHUT-PB/2007. tanggal 5 Nopember 2007

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami harapkan kepada saudara untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan pekerjaan dan mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Serah Terima Pertama ( PHO ) tersebut

Demikianlah kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas kerjasamanya kami aturkan terima kasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )**

  
**EDWAR. Z. AMd.**

Nip. 080 087 109

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Bapak Kepala Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
3. Saudara Pengawas Lapangan
4. Saudara Direktur CV. WIRATAMA KARYA
5. Pertinggal



# CV. WIRATAMA KARYA

KONTRAKTOR. LAVERANSIR DAN PERDAGANGAN UMUM

Jl. Raya Simpang Empat – Talu, Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

BANKIR  
BANK NAGARI  
CAB. SIMP. EMPAT

Pinaga, 17 Desember 2007

Nomor : 07 /PPHO-WK/XII/2007  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan PHO Pekerjaan  
Pembuatan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Sasak  
Dan Pengamanan Pondasi

Kepada Yth :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet  
di-

Simpang Empat


Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Gedung Sarang Burung Walet Sasak Dan Pengamanan Pondasi Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat yang kami laksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007 Tanggal 5 Nopember 2007 sampai saat ini Pelaksanaan Pekerjaan Kami Telah mencapai bobot 100%

Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, bersama ini kami mohonkan kepada Bapak, kiranya untuk dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama ( PHO ).

Demikianlah Permohonan ini kami ajukan kepada bapak, kiranya Bapak berkenan untuk mempertimbangkannya dan terima kasih

Hormat Kami  
**CV. WIRATAMA KARYA**



**KHAIRUNAS**  
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat
3. Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet DISHUT Kab. Pas. Bar.
4. Bapak Kepala Pengawasan Kabupaten Pasaman Barat
5. Bapak Kabag Keuangan Kabupaten Pasaman Barat
6. Pengawas Lapangan
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**Jl. KKN. Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**KEGIATAN TAHUN 2007**

**FOTO DOKUMENTASI**

**NOMOR KONTRAK : 522/028/SPK-Peng /DISHUT-PB/2007**  
**TANGGAL KONTRAK : 05 NOPEMBER 2007**

**KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET**

**PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG  
WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI**

**LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE**

**PELAKSANA**

**CV. WIRATAMA KARYA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Jl. KKN. Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**KEGIATAN TAHUN 2007**

**MUTUAL CHECK - O**  
**( MC - O )**

**NOMOR KONTRAK : 522/028/SPK-Peng /DISHUT-PB/2007**  
**TANGGAL KONTRAK : 05 NOPEMBER 2007**

**KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET**  
**PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI**  
**LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE**

**PELAKSANA**

**CV. WIRATAMA KARYA**

# MUTUAL CHECK - O (MC - O)

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 NO KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA  
 LOKASI : SASAK, KEC. SASAK RANAH PASISIE

NO	SKETSA GAMBAR	PERHITUNGAN	VOLUME
		<p><b>A. PEKERJAAN PENDAHULUAN</b></p> <p>1. Pembersihan Lapangan                  2. Pasangan Bouwplank (1,00 x 19 bh)</p> <p><b>B. PEKERJAAN PONDASI</b></p> <p>1. Galian Tanah Pondasi  <math>0,50 \times 1,00 \times 75,00 =</math></p> <p>2. Timbunan bekas galian  <math>\frac{1}{4} \times 37,50 =</math></p> <p>3. Urugan Tanah Didatangkan                  ① <math>\frac{0,20 + 0,40}{2} \times 4,00 \times 16,50 = 19,80</math>                  ② <math>\frac{0,20 + 0,40}{2} \times 2,00 \times 16,50 = 9,90</math>                  ③ <math>0,40 \times 2,00 \times 8,00 = 6,40</math>                  ④ <math>0,20 \times 3,00 \times 6,00 = 3,60</math>  <u>39,70</u></p>	<p>210,00 M<sup>3</sup>                  19,00 M<sup>3</sup></p> <p>37,50 M<sup>3</sup></p> <p>9,37 M<sup>3</sup></p> <p>39,70 M<sup>3</sup></p>

Diperiksa Oleh :  
 Pengawas Lapangan

**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
 NIP. 410 028 042






Dibuat Oleh  
 Pelaksana Lapangan

**KHAIRUNAS**

# MUTUAL CHECK - O

## (MC - O)

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 NO KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA  
 LOKASI : SASAK, KEC. SASAK RANAH PASISIE

NO	SKETSA GAMBAR	PERHITUNGAN	VOLUME
		4. Pasangan Anstamping Batu Kali $0,20 \times 1,00 \times 75,00 =$	15,00 M <sup>3</sup>
		5. Pasangan Batu Kali (Pondasi) $0,30 + 0,80 \times 0,80 \times 75,00 =$	33,00 M <sup>3</sup>
		<b>C. PEKERJAAN BETON</b>	
	Balok Slof 	1. Pas. Slof 15/20 $0,15 \times 0,20 \times 75,00 = 2,25$	
	Reng Balok 	2. Pas. Reng Balok $0,15 \times 0,20 \times 60,00 = 1,80$	
	Kolom praktis 	3. Pas. Kolom Praktis $0,15 \times 0,15 \times 1,50 \times 28 = 0,95$	5,00 M <sup>3</sup>

Diperiksa Oleh :  
 Pengawas Lapangan

Dibuat Oleh  
 Pelaksana Lapangan




**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
 NIP. 410 028 042



**KHAIRUNAS**

# MUTUAL CHECK - O (MC - O)

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 NO KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA  
 LOKASI : SASAK, KEC. SASAK RANAH PASISIE

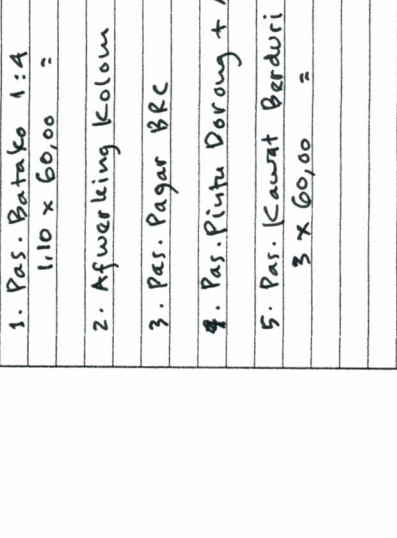NO	SKETSA GAMBAR	PERHITUNGAN	VOLUME
		<p><u>D. PEKERJAAN PINDING</u></p> <p>1. Pas. Batako 1:4 1,10 x 60,00 =</p> <p>2. Afwerking Kolom</p> <p>3. Pas. Pagar BRC</p> <p>4. Pas. Pintu Dorong + Aksesoris</p> <p>5. Pas. Kawat Berduri 3 x 60,00 =</p>	<p>66,00 M<sup>2</sup></p> <p>12,00 M<sup>2</sup></p> <p>4,00 Unit</p> <p>1,00 Unit</p> <p>180,00 Ml</p>

Diperiksa Oleh :  
 Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
 NIP. 410 028 042

Dibuat Oleh  
 Pelaksana Lapangan



**KHAIRUNAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. KKN. Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**KEGIATAN TAHUN 2007**

**LAPORAN MINGGUAN**  
**KEMAJUAN PEKERJAAN**

**MINGGU KE** : I-VI  
**TANGGAL** : 05 NOPEMBER 2007  
**S/D TANGGAL** : 16 DESEMBER 2007

**NOMOR KONTRAK** : 522/028/SPK-Peng /DISHUT-PB/2007  
**TANGGAL KONTRAK** : 05 NOPEMBER 2007

**KEGIATAN** : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG  
WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
**LOKASI** : KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE

**PELAKSANA**

**CV. WIRATAMA KARYA**



## LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : : SASAK  
 KECAMATAN : : SASAK RANAH PESISIR  
 KABUPATEN : : PASAMAN BARAT


MINGGU KE : 1  
 TANGGAL : 05 NOPEMBER 2007  
 S/D TANGGAL : 11 NOPEMBER 2007

No.	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						TOTAL KEMAJUAN PEKERJAAN	
		Volume	SATUAN	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		Volume	Bobot (%)
				Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)		
1	2	3		7	8	9	10	11	12	21	22
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembersihan Lapangan	210,00	M2								
2	Pas. Papan Bouwplank	19,00	M1								
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	37,50	M3								
2	Urugan Bekas Galian	9,37	M3								
3	Urugan Tanah Didatangkan	39,70	M3								
4	Pasangan Anstamping Batu Kali	15,00	M3								
5	Pasangan Pondasi Batu Kali	33,00	M3								
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pasangan Sloof 13/20	2,25	M3								
2	Pasangan Kolom 15/15	0,95	M3								
3	Pek. Ring Belok Uk. 13/20	1,80	M3								
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Betaiko 1:4	66,00	M2								
2	Afwerking Kolom	12,00	M2								
3	Pas. Pagar BKC	4,00	Unit								
4	Pas. Pintu Dorong + Aksesoris	1,00	Unit								
5	Pas. Kawat Berduri	180,00	M1								
	JUMLAH										

NILAI

Diketahui Oleh :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
  
**EDWAR. Z. Amd.**  
 NIP. 080 087 109

Diperiksa Oleh :  
 Pengawas Lapangan  
  
**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
 NIP. 410 028 042

Sasak, 11 Nopember 2007  
 Dibuat Oleh :  
**CV. WIRATAMA KARYA**  
  
**KHAIRUNAS**  
 Direktur









HARI : JUM'AT

TANGGAL : 9 NOV. 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
NIHIL			

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Sasak, 9 NOV. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



KHAIRUNAS  
Pelaksana

HARI : **SABTU**

TANGGAL : **10 Nov . 2007**

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
<b>NIHIL</b>			

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan


Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, **10 Nov . 2007**  
Dibuat Oleh :

**CV. WIRATAMA KARYA**



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : **MIN660**

TANGGAL : **11 NOV** . 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
LIBUR			

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan


Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, **11 NOV** . 2007  
Dibuat Oleh :

**CV. WIRATAMA KARYA**



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana



# LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : SASAK  
 KECAMATAN : SASAK RANAH PASISIE  
 KABUPATEN : PASAMAN BARAT

MINGGU KE : II  
 TANGGAL : 12 NOPEMBER 2007  
 S/D TANGGAL : 18 NOPEMBER 2007

No.	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak										LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN					
		Volume	SATUAN	BOBOT ( % )	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		TOTAL KEMAJUAN PEKERJAAN						
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)					
1	2	3				7	8	9	10	11	12	21	22				
<b>A PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>																	
1	Pembersihan Lapangan	210,00	M2	1,19	-	-	210,00	1,19	1,19	210,00	1,19	210,00	100,00				
2	Pas. Papan Bouwplank	19,00	M1	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>B PEKERJAAN PONDASI</b>																	
1	Galian Tanah Pondasi	37,50	M3	2,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Urugan Bekas Galian	9,37	M3	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Urugan Tanah Didatangkan	39,70	M3	5,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Pasangan Anstamping Batu Kali	15,00	M3	5,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Pasangan Pondasi Batu Kali	33,00	M3	32,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>C PEKERJAAN BETON</b>																	
1	Pasangan Sloof 13/20	2,25	M3	14,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Pasangan Kolom 15/15	0,95	M3	7,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Pek. Ring Balok Uk. 13/20	1,80	M3	10,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>D PEKERJAAN DINDING</b>																	
1	Pas. Dinding Batako 1:4	66,00	M2	10,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Afwerking Kolom	12,00	M2	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Pas. Pagar BRC	4,00	Unit	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Pas. Pintu Dorong + Aksesoris	1,00	Unit	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Pas. Kawat Berduri	180,00	M1	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>JUMLAH</b>				100,00	-	-	-	-	1,19	-	-	1,19	-				

Sasak, 18 Nopember 2007  
 Dibuat Oleh :  
**CV. WIRATAMA KARYA**



**KHAIRUNAS**  
 Direktur

Diperiksa Oleh :  
 Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
 NIP. 410 028 042

Diketahui Oleh :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**EDWAR, Z. Amd.**  
 NIP. 080 087 109











HARI : SABTU

TANGGAL : 17 Nov 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	3
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
	Pembersihan Lapangan	M <sup>2</sup>	42,00

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
	Batu Kali	M <sup>3</sup>	25,00
	Pasir	M <sup>3</sup>	12,00

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
	-		
	-		

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis					////	////							
Hujan							////	////					

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan




**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 17 Nov 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : MINGGU

TANGGAL : 18 Nov 2007

### BUKU HARIAN STANDARD LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

#### I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

#### IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
	L I B U R		

#### II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

#### V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

#### III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

#### VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan  
  
**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 18 Nov - 2007  
Dibuat Oleh :  
CV. WIRATAMA KARYA  
  
**KHAIRUNAS**  
Pelaksana





## LAPORAN MINGGUAN

**KEGIATAN** : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
**LOKASI** : SASAK  
**KECAMATAN** : SASAK RANAH PASISIE  
**KABUPATEN** : PASAMAN BARAT

MINGGU KE : III  
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2007  
 S/D TANGGAL : 25 NOPEMBER 2007

No.	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						TOTAL KEMAJUAN PEKERJAAN		
		Volume	SATUAN	BOBOT (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		Volume	Bobot (%)
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)		
1	2	3		7	8	9	10	11	12	21	22	
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>											
1	Pembersihan Lapangan	210,00	M2	1,19	1,19	-	-	210	1,19	210,00	100,00	
2	Pas. Papan Bouwplank	19,00	M1	0,81	-	19,00	0,81	19,00	0,81	19,00	100,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>											
1	Galian Tanah Pondasi	37,50	M3	2,13	-	37,50	2,13	37,50	2,13	37,50	100,00	
2	Urugan Bekas Galian	9,37	M3	0,26	-	-	-	0,00	-	-	-	
3	Urugan Tanah Didatangkan	39,70	M3	5,44	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pasangan Anstamping Batu Kali	15,00	M3	5,85	-	15,00	5,85	15,00	5,85	15,00	100,00	
5	Pasangan Pondasi Batu Kali	33,00	M3	32,38	-	13,00	12,76	13,00	12,76	13,00	39,39	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>											
1	Pasangan Sloof 13/20	2,25	M3	14,92	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pasangan Kolom 15/15	0,95	M3	7,16	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pek. Ring Balok Uk. 13/20	1,80	M3	10,75	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>											
1	Pas. Dinding Batako 1:4	66,00	M2	10,87	-	-	-	-	-	-	-	
2	Afwerking Kolom	12,00	M2	1,02	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pas. Pagar BRC	4,00	Unit	1,57	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pas. Pintu Dorong + Aksesoris	1,00	Unit	4,45	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pas. Kawat Berduri	180,00	M1	1,20	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>			100,00	1,19		21,55		22,74			

Sesak, 25 Nopember 2007

Dipetik Oleh :

Pengawas Lapangan

Diketahui Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EDWAR. Z. Amd.

NIP. 080 087 109

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA

PASAMAN BARAT

KHARUNAS

Direktur

HARI : **SENIN**

TANGGAL : 19 NOV. 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	10
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	Pas. Bouwplank	M <sup>2</sup>	19,00
2	Galian Tanah Pondasi	M <sup>3</sup>	12,50

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
	Batu Kali	M <sup>3</sup>	16,00
	Pasir	M <sup>3</sup>	12,00
	Papan Klas III	M <sup>2</sup>	0,50
	Paku	Kg	5,00

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
	Papan kelas III	M <sup>2</sup>	<del>11</del> 0,17
	Pancung	M <sup>2</sup>	26,00
	Paku	Kg	0,10

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh	1				
2	Palu	bh	1				
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	3				

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis	///												
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis			///	///	///								
Hujan									///			///	

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 19 NOV. 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : SELASA

TANGGAL : 20 NOV . 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	1
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	10
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Galian Tanah Pondasi	M <sup>3</sup>	12,50
2.	-		

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Batu Kali	M <sup>3</sup>	16,00

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
----	-------------	--------	--------

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh	1				
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	3				

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 20 NOV . 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : RABU

TANGGAL : 21 NOV. 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	9
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Galian Tanah Pondasi	M <sup>3</sup>	12,50

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
	Semen	2 sak	50,00

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
----	-------------	--------	--------

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	3				

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan	==												
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan											///	==	

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan




KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Sasak, 21 Nov. 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



KHAIRUNAS  
Pelaksana

HARI : KAMIS

TANGGAL : 22 Nov 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	23
8	Tukang Batu	Org	3
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Austampang	M <sup>3</sup>	8,00
2.	Pas. Pondasi	M <sup>3</sup>	4,00

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Semen	Zak	60,00

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Batu Kali	M <sup>3</sup>	14,40
2.	Pasir	M <sup>3</sup>	6,09
3.	Semen	Zak	13,00

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7.	Sendok	Bh	2
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	1				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan




KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Sasak, 22 Nov 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



KHAIRUNAS  
Pelaksana



HARI : **SABTU**

TANGGAL : **24 Nov. 2007**

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	0
8	Tukang Batu	Org	2
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Par. Batu Kali	M3	3,00

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
----	-------------	--------	--------

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Batu Kali	M3	3,60
2.	Pasir	M3	1,60
3.	Semen	Zak	10,00

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7.	Sekam	Bk	1
2	Palu	bh		8.	Ember	Bk	2
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	1				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	1				

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis			///	///	///								
Hujan	///	///											

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, **24 Nov. 2007**  
Dibuat Oleh :

**CV. WIRATAMA KARYA**



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana







## LAPORAN MINGGUAN

**KEGIATAN** : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
**LOKASI** : SASAK  
**KECAMATAN** : SASAK RANAH PASISIE  
**KABUPATEN** : PASAMAN BARAT

MINGGU KE : IV  
 TANGGAL : 26 NOPEMBER 2007  
 S/D TANGGAL : 02 DESEMBER 2007

No.	Uraian Pekerjaan	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN													
		Menurut Kontrak		Minggu Lalu				Minggu ini				s/d Minggu ini		TOTAL KEMAJUAN PEKERJAAN	
		Volume	SATUAN	BOBOT (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	
1	2	3		7	8	9	10	11	12	21	22				
<b>A PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>															
1	Pembersihan Lapangan	210,00	M2	1,19	210,00	1,19	-	210	1,19	210,00			100,00		
2	Pas. Papan Bouwplank	19,00	M1	0,81	19,00	0,81	-	19,00	0,81	19,00			100,00		
<b>B PEKERJAAN PONDASI</b>															
1	Galian Tanah Pondasi	37,50	M3	2,13	37,50	2,13	-	37,50	2,13	37,50			100,00		
2	Urugan Bekas Galian	9,37	M3	0,26	-	9,37	0,26	9,37	0,26	9,37			100,00		
3	Urugan Tanah Didatangkan	39,70	M3	5,44	-	39,70	5,44	39,70	5,44	39,70			100,00		
4	Pasangan Anstamping Batu Kali	15,00	M3	5,85	15,00	5,85	-	15,00	5,85	15,00			100,00		
5	Pasangan Pondasi Batu Kali	33,00	M3	32,38	13,00	12,76	20,00	19,62	32,38	33,00			100,00		
<b>C PEKERJAAN BETON</b>															
1	Pasangan Sloof 13/20	2,25	M3	14,92	-	2,25	14,92	2,250	14,92	15,08			100,00		
2	Pasangan Kolom 15/15	0,95	M3	7,16	-	-	-	-	-	-					
3	Pek. Ring Balok Uk. 13/20	1,80	M3	10,75	-	-	-	-	-	-					
<b>D PEKERJAAN DINDING</b>															
1	Pas. Dinding Batako 1:4	66,00	M2	10,87	-	26,00	4,28	26,00	4,28	26,00			39,39		
2	Afwerking Kolom	12,00	M2	1,02	-	-	-	-	-	-					
3	Pas. Pagar BRC	4,00	Unit	1,57	-	-	-	-	-	-					
4	Pas. Pintu Dorong + Aksesoris	1,00	Unit	4,45	-	-	-	-	-	-					
5	Pas. Kawat Berduri	180,00	M1	1,20	-	-	-	-	-	-					
<b>JUMLAH</b>				100,00		22,74		44,52		67,26					

Sasak, 02 Desember 2007

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan

*(Signature)*

**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Diketahui Oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

*(Signature)*  
**EDWARC Z. Amdl.**  
NIP. 080 087 109

Dibuat Oleh :  
**CV. WIRATAMA KARYA**

*(Signature)*  
**CV. WIRATAMA KARYA**  
PASAMAN BARAT

**KHAIRUNAS**  
Direktur

HARI : SENIN

TANGGAL : 26 Nov . 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	28
8	Tukang Batu	Org	8
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Pondasi Batu Kali	m <sup>3</sup>	10,80

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Batu Kali	m <sup>3</sup>	12,00
2.	Pasir	m <sup>3</sup>	5,22
3.	Semen	zak	33,00

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7	Sdt Semen	Bh	2
2	Palu	bh		8	Ember	Bh	4
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis	////	////			///		///						
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 26 Nov . 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : SELASA

TANGGAL : 27 NOV . 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	28
8	Tukang Batu	Org	8
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Pondasi Batu Kali	M <sup>3</sup>	10,00

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Kerakel	M <sup>3</sup>	4,00
2.	Pasir	M <sup>3</sup>	4,00
3.	Semen	Zak	25,00

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Batu Kali	M <sup>3</sup>	12,00
2.	Pasir	M <sup>3</sup>	5,22
3.	Semen	ZAK	32,00

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		8	Sdek Semu	Bh	2
2	Palu	bh		8	Ember	Bh	4
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis										////			
Hujan											==	==	
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis									////	////			
Hujan													==

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Sasak, 27 Nov. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



KHAIRUNAS  
Pelaksana

HARI : RABU

TANGGAL : 28 Nov. 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	10
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Urugan Bekas Galian	M <sup>3</sup>	9,37
2.	Urugan di datangnya	M <sup>3</sup>	20,00

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	24,00

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	24,00

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7	Gerobak	Bh	3
2	Palu	bh		8	Keranjang	Bh	3
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	5				

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Sasak, 28 Nov. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



KHAIRUNAS  
Pelaksana

HARI : KAMIS

TANGGAL : 29 Nov. 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	7
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1	Urugan ditertuykan	M <sup>3</sup>	19,70

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	23,60
2.	Besi Beton	Kg	566,00
3.	Kawat ikat	Kg	3,00
4.	Batako	Bk	1.000,00

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	23,60

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7.	Gerobak	Bk	3
2	Palu	bh		8.	Kerajang	Bk	3
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	3				

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 29 Nov. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : JUMAT

TANGGAL : 30 Nov. 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	8
8	Tukang Batu	Org	4
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	2
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Slot	M <sup>3</sup>	2,25
2.	Pas. Batako	M <sup>2</sup>	16,50

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Batako	Bh	500,00

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
	Besi Beton	Kg	250,00
	Kawat Icat	Kg	1,25
	semen	zak	17,00
	Kerikil	M <sup>3</sup>	2,00
	Pasir	M <sup>3</sup>	1,50
	Batako	Bh	363,00

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis	////											////	
Hujan										////			

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan


Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Sasak, 30 Nov 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



KHAIRUNAS  
Pelaksana



HARI : **SABTU**

TANGGAL : **01 Des . 2007**

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	5
8	Tukang Batu	Org	3
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Bataleo	m <sup>2</sup>	9,50

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Papan Cor	M <sup>3</sup>	0,50

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Bataleo	Bh	209,00
2.	Semen	ZAK	2,00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	1,33

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7	Sdle Sem	Bh	2
2	Palu	bh		8	Gerobak	Bh	1
3	Parang	bh		9	Ember	Bh	2
4	Sekop	bh	1				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis							///						
Hujan						==							

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan




**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, **01 Des . 2007**

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : MINGGU

TANGGAL : 02 Des 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
LIBUR			

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 02 Des. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

# AKTUAL CHECK (BACK UP DATA)

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 NO KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA  
 LOKASI : SASAK, KEC. SASAK RANAH PASISIE

NO	SKETSA GAMBAR	PERHITUNGAN	VOLUME
		<p><b>B. PEK. PONDASI</b></p> <p>2. Urugan Bekas Galian  <math>\frac{1}{4} \times 37,50 =</math></p> <p>3. Urugan Tanah didatangkan                  ① <math>0,20 \times 0,40 \times 4,00 \times 16,50 = 19,80</math>  <math>\frac{2}{2}</math>                  ② <math>0,20 \times 0,40 \times 2,00 \times 16,50 = 9,90</math>  <math>\frac{2}{2}</math>                  ③ <math>0,40 \times 2,00 \times 8,00 = 6,40</math>                  ④ <math>0,20 \times 3,00 \times 6,00 = 3,60</math>  <math>\frac{39,70}{2}</math></p> <p>5. Pas. Pondasi Batu Kali.  <math>0,30 \times 0,80 \times 0,80 \times 45,45 =</math>  <math>\frac{20,00}{2}</math></p> <p><b>C. PEK. BETON</b></p> <p>1. Slof <math>\rightarrow 0,15 \times 0,20 \times 75,00 =</math></p> <p><b>D. PEK. PINDING</b></p> <p>1. Pas. Pinding Batako 1:4  <math>1,10 \times 23,64 =</math></p>	<p>9,37 M<sup>3</sup></p> <p>39,70 M<sup>3</sup></p> <p>20,00 M<sup>3</sup></p> <p>2,25 M<sup>3</sup></p> <p>26,00 M<sup>2</sup></p>

Diperiksa Oleh :  
 Pengawas Lapangan

**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
 NIP. 410 028 042

Dibuat Oleh  
 Pelaksana Lapangan

**KHAIRUNAS**

## LAPORAN MINGGUAN

**KEGIATAN** : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
**LOKASI** : SASAK  
**KECAMATAN** : SASAK RANAH PASISIE  
**KABUPATEN** : PASAMAN BARAT

MINGGU KE : V  
 TANGGAL : 03 DESEMBER 2007  
 S/D TANGGAL : 09 DESEMBER 2007

No.	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						TOTAL KEMAJUAN PEKERJAAN		
		Volume	SATUAN	BOBOT (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		Volume	Bobot (%)
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)		
1	2	3		7	8	9	10	11	12	21	22	
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>											
1	Pembersihan Lapangan	210,00	M2	1,19	1,19	-	-	210	1,19	210,00	100,00	
2	Pas. Papan Bouwplank	19,00	M1	0,81	0,81	-	-	19,00	0,81	19,00	100,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>											
1	Galian Tanah Pondasi	37,50	M3	2,13	2,13	-	-	37,50	2,13	37,50	100,00	
2	Urugan Bekas Galian	9,37	M3	0,26	0,26	-	-	9,37	0,26	9,37	100,00	
3	Urugan Tanah Didatangkan	39,70	M3	5,44	5,44	-	-	39,70	5,44	39,70	100,00	
4	Pasangan Anstamping Batu Kali	15,00	M3	5,85	5,85	-	-	15,00	5,85	-	100,00	
5	Pasangan Pondasi Batu Kali	33,00	M3	32,38	32,38	-	-	33,00	32,38	66,00	100,00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>											
1	Pasangan Sloof 13/20	2,25	M3	14,92	14,92	-	-	2,25	14,92	2,25	100,00	
2	Pasangan Kolom 15/15	0,95	M3	7,16	7,16	0,95	7,16	0,95	7,16	0,95	100,00	
3	Pek. Ring Belok Uk. 13/20	1,80	M3	10,75	10,75	1,80	10,75	1,80	10,75	1,80	100,00	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>											
1	Pas. Dinding Batako 1:4	66,00	M2	10,87	4,28	40,00	6,58	66,00	10,87	10,87	100,00	
2	Afwerking Kolom	12,00	M2	1,02								
3	Pas. Pagar BRC	4,00	Unit	1,57		4,00	1,57	4,00	1,57	4,00	100,00	
4	Pas. Pilitu Dorong + Aksesoris	1,00	Unit	4,45								
5	Pas. Kawat Berduri	180,00	M1	1,20								
	<b>JUMLAH</b>			100,00	81,03		26,06		93,32			

Diketahui Oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**EDWAR. Z. Amdl.**  
NIP. 080 087 109

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan

**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 09 Desember 2007

Dibuat Oleh :

**CV. WIRATAMA KARYA**



**KHAIRUNAS**  
Direktur

HARI : **SENIN**

TANGGAL : **03 Des . 2007**

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	8
8	Tukang Batu	Org	5
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Dinding Batako 1:4	M <sup>2</sup>	15,00

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Kerikil	M <sup>3</sup>	4,00
2.	Pasir	M <sup>3</sup>	4,00
3.	Semen	2ak	23,00

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Batako	Bh	330,00
2.	Semen	2ak	3,00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	0,21

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7	Salk Semen	Bh	2
2	Palu	bh		8	Gerobek	Bh	1
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis								////					
Hujan										////	////		
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis			////		////								
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, **03 Des . 2007**  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHARUNAS**  
Pelaksana

HARI : SELASA

TANGGAL : 04 Des . 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	7
8	Tukang Batu	Org	5
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Par. Dinding Batako 1:4	M <sup>2</sup>	15,00

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Batako	Bh	330,00
2.	Semen	Zak	3,00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	0,21

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7.	Sdk Semen	Bh	2
2	Palu	bh		8.	Gerobak	Bh	1
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	2				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 04 Des. 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : **FABU**

TANGGAL : **05 Des. 2007**

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	5
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Par. Dinding Batakes 1:4	M <sup>2</sup>	10,00

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Batako	Bk	220,00
2.	Semen	zak	2,00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	0,14

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7.	Sdg Semen	Bk	2
2	Palu	bh		8.	Gerobek	Bk	1
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh	1				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis					////								
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis					////								
Hujan								////					

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, **05 Des. 2007**

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : KAMIS

TANGGAL : 06 Des. 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	8
8	Tukang Batu	Org	4
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	2
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Kolom	M <sup>3</sup>	0,95

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Besi Beton	Kg	115,00
2	Kawat ikat	Kg	0,75
3	Semen	zak	6,00
4	Kerikil	M <sup>3</sup>	0,78
5	Pasir	M <sup>3</sup>	0,50

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7.	Sdg Semen	Bh	2
2	Palu	bh		8.	Gerobak	Bh	1
3	Parang	bh		9.	Ember	Bh	6
4	Sekop	bh	1				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Sasak, 06 Des. 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



KHAIRUNAS  
Pelaksana



HARI : JUMAT

TANGGAL : 07. Des. 2007

BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	16
8	Tukang Batu	Org	8
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	3
13	Kepala Tukang Besi	Org	

IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pat. Ring Bulok	M <sup>3</sup>	1,80 M <sup>3</sup>

II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Besi Beton	Kg	191,00
2.	Kawat ikat	Kg	1,00
3.	Semen	Zak	12,00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	1,50
5.	Pasir	M <sup>3</sup>	1,00

III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7.	Sdg Semen	Bh	2
2	Palu	bh		8.	Gerobak	Bh	1
3	Parang	bh		9.	Ember	Bh	6
4	Sekop	bh	1				
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis	///												
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis												///	
Hujan											///		

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Sasak, 07 Des. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



KHAIRUNAS  
Pelaksana

HARI : **SABTU**

TANGGAL : **08 Des. 2007**

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	2
8	Tukang Batu	Org	1
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	1
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Pagar BRC	Unit	4,00

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1	Pagar BRC	Unit	4,00

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pagar BRC	Unit	4,00

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh		7.	Sdg Sema	Bh	1
2	Palu	bh	1				
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan




**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, **08 Des. 2007**

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : MINGGU

TANGGAL : 09 Des. 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
LIBUR			

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan

**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 09 Des. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA

**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

# AKTUAL CHECK (BACK UP DATA)

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN FONDASI  
 NO KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA  
 LOKASI : SASAK, KEC. SASAK RANAH PASISIE

NO	SKETSA GAMBAR	PERHITUNGAN	VOLUME
	<p style="text-align: center;">KOLOM Praktis      RING BALOK</p> <p style="text-align: center;">Pas. Batako      L = 36,36 M'</p>	<p><b>C. PEK. BETON</b></p> <p>2. Pas. Kolom 15/15  <math>0,15 \times 0,15 \times 1,50 \times 28 =</math></p> <p>3. Pas. Ring Balok  <math>0,15 \times 0,20 \times 60,00 =</math></p> <p><b>D. PEK. DINDING</b></p> <p>1. Pas. Batako 1:4  <math>1,10 \times 36,36 =</math></p> <p>3. Pas. Pagar BRC</p>	<p>0,95 M<sup>3</sup></p> <p>1,80 M<sup>3</sup></p> <p>40,00 M<sup>2</sup></p> <p>400 Unit</p>

Diperiksa Oleh :  
 Pengawas Lapangan

Dibuat Oleh  
 Pelaksana Lapangan

**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
 NIP. 410 028 042

**KHAIRUNAS**

# LAPORAN MINGGUAN

**KEGIATAN** : **PEMBIANAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET**  
**PEKERJAAN** : **PENBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI**  
**LOKASI** : **SASAK**  
**KECAMATAN** : **SASAK RANAH PASISIE**  
**KABUPATEN** : **PASAMAN BARAT**

MINGGU KE : VI  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2007  
 S/D TANGGAL : 16 DESEMBER 2007

No.	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						TOTAL KEMAJUAN PEKERJAAN		
		Volume	SATUAN	BOBOT (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini		Volume	Bobot (%)
					Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)		
1	2	3		7	8	9	10	11	12	21	22	
<b>A PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>												
1	Pembersihan Lapangan	210,00	M2	1,19	1,19	-	-	210	1,19	210,00	100,00	
2	Pas. Papan Bouwplank	19,00	M1	0,81	0,81	-	-	7,00	0,81	7,00	100,00	
<b>B PEKERJAAN PONDASI</b>												
1	Galian Tanah Pondasi	37,50	M3	2,13	2,13	-	-	37,50	2,13	37,50	100,00	
2	Urugan Bekas Galian	9,37	M3	0,26	0,26	-	-	19,00	0,26	19,00	100,00	
3	Urugan Tanah Didatangkan	39,70	M3	5,44	5,44	-	-	39,70	5,44	39,70	100,00	
4	Pasangan Anstamping Batu Kali	15,00	M3	5,85	5,85	-	-	20,00	5,85	-	100,00	
5	Pasangan Pondasi Batu Kali	33,00	M3	32,38	32,38	-	-	33,00	32,38	66,00	100,00	
<b>C PEKERJAAN BETON</b>												
1	Pasangan Sloof 13/20	2,25	M3	14,92	14,92	-	-	15,000	14,92	15,00	100,00	
2	Pasangan Kolom 15/15	0,95	M3	7,16	7,16	-	-	0,95	7,16	0,95	100,00	
3	Pek. Ring Balok Uk. 13/20	1,80	M3	10,75	10,75	-	-	1,80	10,75	1,80	100,00	
<b>D PEKERJAAN DINDING</b>												
1	Pas. Dinding Batako 1:4	66,00	M2	10,87	66,00	7,16	-	66,00	10,87	10,87	100,00	
2	Afwerking Kolom	12,00	M2	1,02	-	12,00	-	12,00	1,02	12,00	100,00	
3	Pas. Pagar BRC	4,00	Unit	1,57	4,00	1,57	-	4,00	1,57	4,00	100,00	
4	Pas. Pihitu Dorong + Aksesoris	1,00	Unit	4,45	-	1,00	4,45	1,00	4,45	1,00	100,00	
5	Pas. Kawat Berdiri	180,00	M1	1,20	-	180,00	1,20	180,00	1,20	180,00	100,00	
<b>Jumlah</b>				100,00		89,61			6,68			

Sasak, 16 Desember 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**

Direktur

Diperiksa Oleh :

Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**

NIP. 410 028 042

Diketahui Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**EDWAR, Z. Amdl.**

NIP. 080 087 109

HARI : **SENIN**

TANGGAL : 10 Des. 2007

## BUKU HARIAN STANDARD LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

### I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	3
8	Tukang Batu	Org	1
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

### IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Afwerking Kolom	M <sup>2</sup>	12,00

### II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

### V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Semen	Zak	2,00
2.	Pasir	M <sup>3</sup>	0,70

### III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

### VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 10 Des. 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : SELASA

TANGGAL : 11 Des. 2007

## BUKU HARIAN STANDARD LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

### I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	2
8	Tukang Batu	Org	1
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

### IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Pintu Dorong + Aksesoris	Unit	1,00

### II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pintu Dorong + Ales	Unit	1,00

### V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pintu Dorong + Ales	Unit	1,00

### III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh	1	1.	Sdk Semen	Bh	1
2	Palu	bh	1	2.	Berber	Bh	2
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh	2				

### VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis	////	////											
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan										////	////	////	

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan




**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 11 Des. 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : **RABU**

TANGGAL : **12 Des. 2007**

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	1
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	1
7	Pekerja	Org	2
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	1
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pas. Pagar Kawat Berduri	M'	180,00

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Kawat Berduri	Kg	29,00

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME
1.	Kawat Berduri	Kg	29,00

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh	1				
2	Palu	bh	1				
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 12 Des. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana



HARI : KAMIS

TANGGAL : 13 Des. 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
	Nihil		

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 13 Des. 2007  
Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : Jumat

TANGGAL : 14 Des. 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
NIHIL			

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 14 Des. 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : SABTU

TANGGAL : 15 Des 2007

### BUKU HARIAN STANDARD LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE  
NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

#### I. TENAGA

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

#### IV. PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
	NIHIL		

#### II. BAHAN MASUK

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

#### V. PEMAKAIAN BAHAN

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

#### III. PERALATAN

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

#### VI. KEADAAN CUACA

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik  = Gerimis  = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 15 Des 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana

HARI : Minggu

TANGGAL : 16 Des. 2007

**BUKU HARIAN STANDARD  
LAPORAN HARIAN**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
 PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
 LOKASI : KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR  
 NO. KONTRAK : 522/028/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007  
 TGL. KONTRAK : 5 NOPEMBER 2007  
 PELAKSANA : CV. WIRATAMA KARYA

**I. TENAGA**

NO	JENIS TENAGA	SATUAN	JUMLAH
1	Pimpinan Pelaksana	Org	
2	Adm Lapangan	Org	
3	Logistik/Gudang	Org	
4	Tukang Kayu	Org	
5	Kepala Tukang Kayu	Org	
6	Mandor	Org	
7	Pekerja	Org	
8	Tukang Batu	Org	
9	Kepala Tukang Batu	Org	
10	Tukang Cat	Org	
11	Kepala Tukang Cat	Org	
12	Tukang Besi	Org	
13	Kepala Tukang Besi	Org	

**IV. PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
LIBUR			

**II. BAHAN MASUK**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**V. PEMAKAIAN BAHAN**

NO	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME

**III. PERALATAN**

NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH	NO	JENIS ALAT	STN	JUMLAH
1	Gergaji kayu	bh					
2	Palu	bh					
3	Parang	bh					
4	Sekop	bh					
5	Geget	bh					
6	Cangkul	Bh					

**VI. KEADAAN CUACA**

JAM	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													
JAM	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	JML.
Baik													
Gerimis													
Hujan													

Ket.  = Baik     = Gerimis     = Hujan

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan



**KURNIAWAN EKA PUTRA**  
NIP. 410 028 042

Sasak, 16 Des. 2007

Dibuat Oleh :

CV. WIRATAMA KARYA



**KHAIRUNAS**  
Pelaksana





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

JL. KKN Km.1, Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753)466287

## **SHOP DRAWING**

**KEGIATAN** : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET  
SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
**LOKASI** : SASAK, KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA

**TAHUN ANGGARAN 2007**

**PELAKSANA**

**CV. WIRATAMA KARYA**  
KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM

JL. RAYA SIMPANG EMPAT – TALU, PINAGA, NAGARI AUA KUNIANG, KEC. PASAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN

PEMBINAAN POTENSI  
SARANG BURUNG WALET

PEKERJAAN

PEMBUATAN PAGAR GEDUNG  
SARANG BURUNG WALET BAKAK  
DAN PENGAMANAN FONDASI

Diperiksa Oleh :  
Pengarah Lapangan



Diketahui Oleh :  
PPTK




Kontraktor Pelaksana  
CV. WIRATAMA KARYA



REKORBUKAS  
Dinas Kehutanan

Judul Gambar

Skala

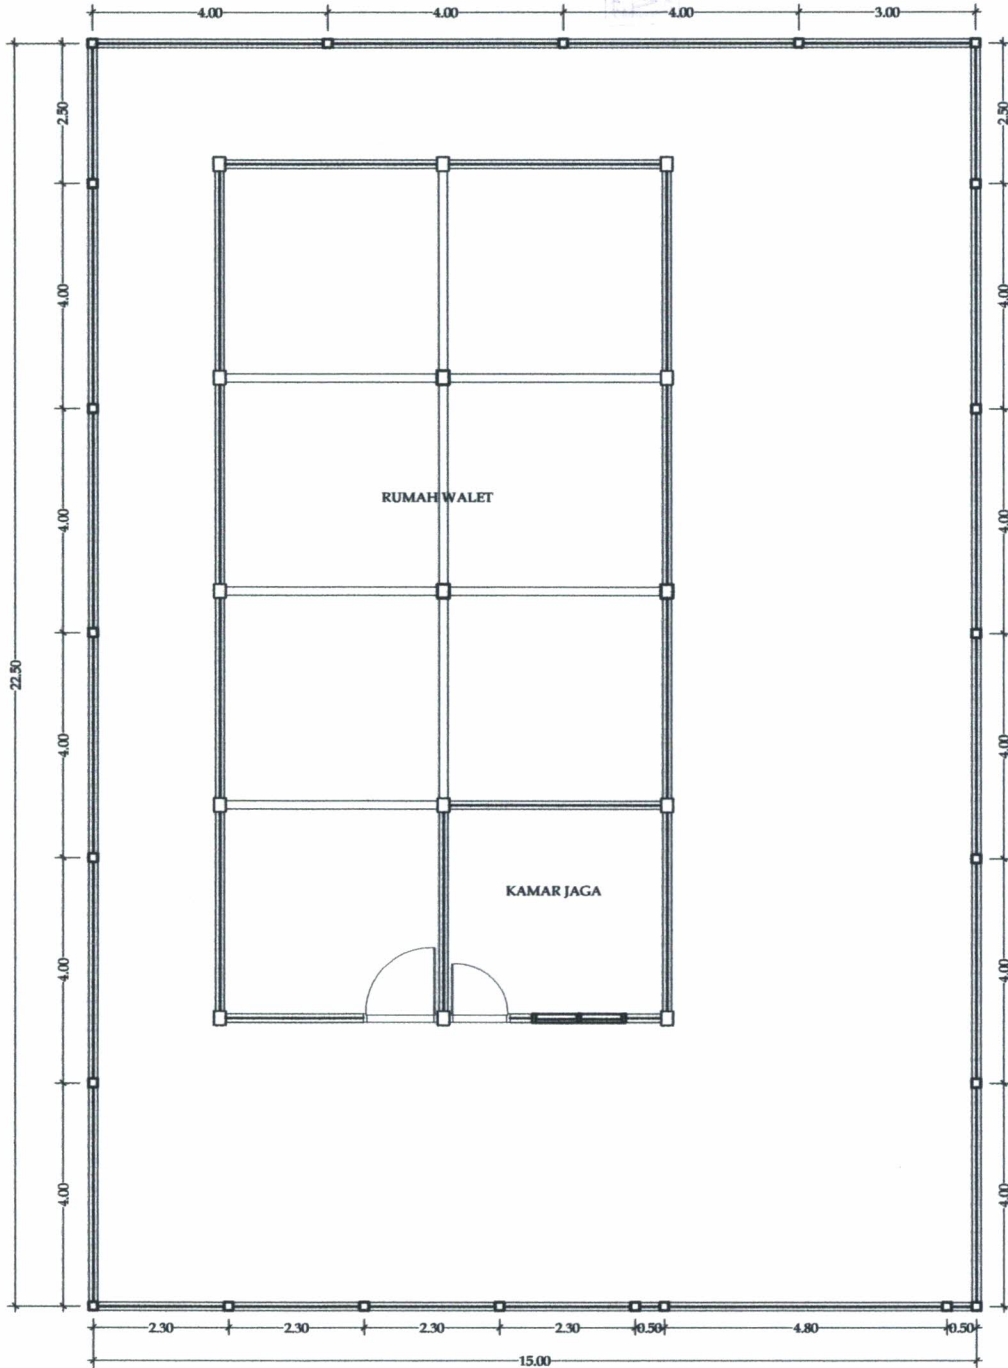

**D E N A H**  
skala 1:125

PEMERINTAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN  
PEMBINAAN POTENSI  
SARANG BURUNG WALET  
PERMUDAAN

PEMBUATAN PAGAR CEBUNG  
SARANG BURUNG WALET SASAK  
DAN PENGAMANAN FONDASI

Diyatias Oleh:  
Perencana Lapangan

KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 4110 028 462

Diketahui Oleh:  
PPTK

EDWAR Z. AMDE  
NIP. 080 087 109


Kontraktor Pelaksana  
CV. WIRATAMA KARYA

CV. WIRATAMA KARYA  
PASAMAN BARAT


KHARUNAS  
Direktur

Judul Gambar


Skala

**TAMPAK DEPAN**  
skala 1:100



**TAMPAK S. KIRI**  
skala 1:100



**TAMPAK S. KANAN**  
skala 1:100



PEMERINTAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN  
PEMBINAAN POTENSI  
SARANG BURUNG WALET

PEKERJAAN  
PEMBUATAN PAGAR GEDUNG  
SARANG BURUNG WALET SASAK  
DAN PENGAMANAN FONDASI

Dipersona Oleh:  
Pengawas Lapangan

  
KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 410 028 042

Diketahui Oleh:  
PPTK

  
EDWAR Z. AMMA  
NIP. 080 087 109


Kontraktor Pelaksana  
CV. WIRATAMA KARYA

  
CV. WIRATAMA KARYA  
PASAMAN BARAT  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DIREKTUR

Judul Gambar

Skala

**DETAIL "B"**  
skala 1:20

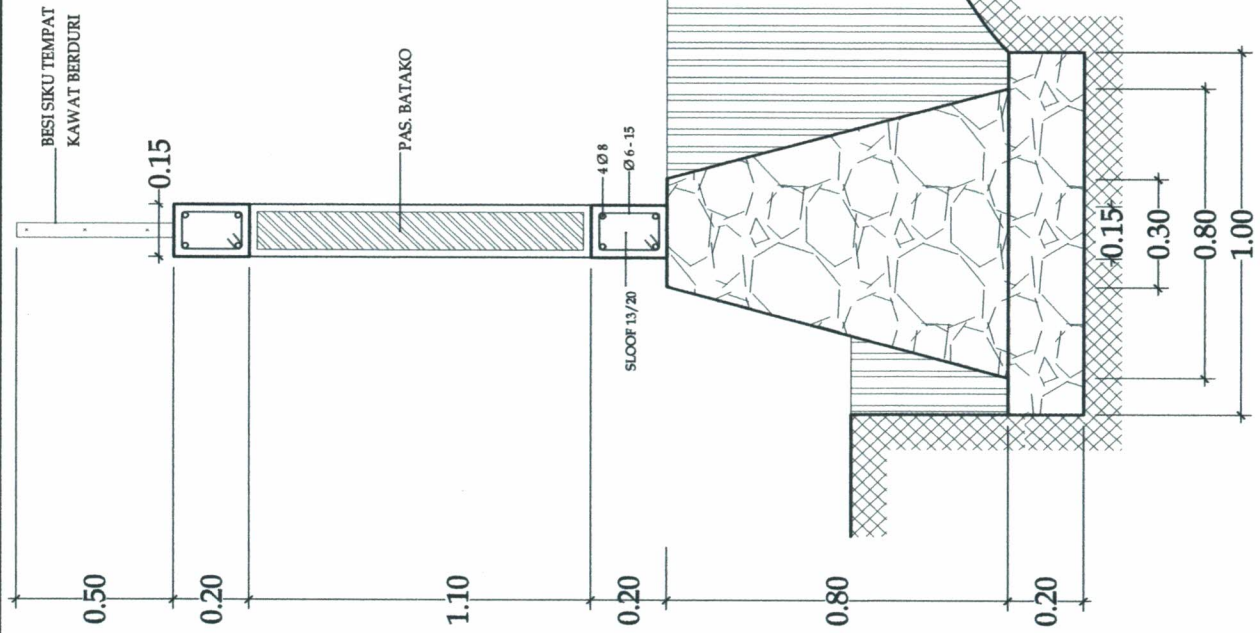

PEMERINTAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN

PEMBINAAN POTENSI  
SARANG BURUNG WALET

PEREKAMAN

PEMBUATAN PAGAR GEDUNG  
SARANG BURUNG WALET SASAK  
DAN PENGAMANAN PONDASI

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan

*[Signature]*

KURNIAWAN EKA PUTRA  
NIP. 407 028 082

Diketahui Oleh :  
PPTK

*[Signature]*

EDWAR S. 4026  
NIP. 080 087 109

Kontraktor Pelaksana  
CV. WIRATAMA KARYA


CV. WIRATAMA KARYA  
PASAMAN BARAT

KEMIRINDAS  
Direktur

Judul Gambar

Skala

**DETAIL "A"**  
skala 1:20

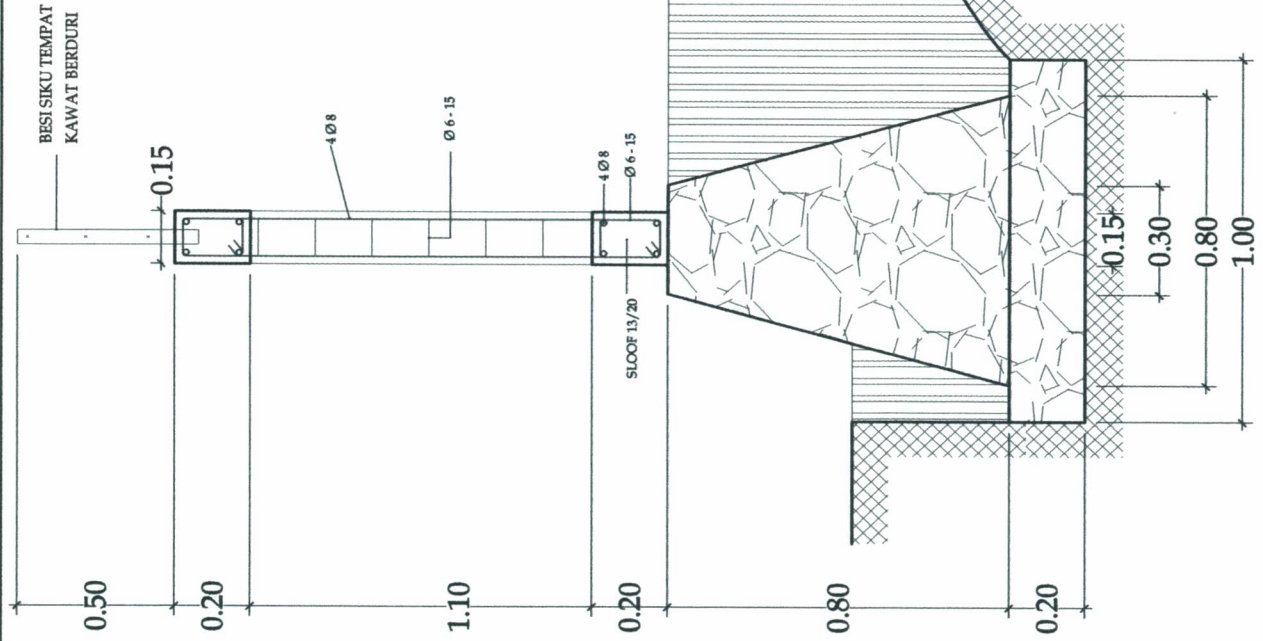





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

JL. KKN Km.1, Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753)466287

**ASBUILT DRAWING**

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET  
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET  
SASAK DAN PENGAMANAN PONDASI  
LOKASI : SASAK, KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA

**TAHUN ANGGARAN 2007**

**PELAKSANA**

**CV. WIRATAMA KARYA**  
KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM

JL. RAYA SIMPANG EMPAT – TALU, PINAGA, NAGARI AUA KUNIANG, KEC. PASAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN

PEMBINAAN FOTENSI  
SARANG BURUNG WALET

PEKERJAAN

PEMBUATAN PAGAR BEDIUNG  
SARANG BURUNG WALET SAKAK  
DAN PENGAMANAN FONDASI

Diperiksa Oleh :  
Pengawas Lapangan

*[Signature]*  
KURNIAWAN TEJA PUTRA  
NIP. 810708102

Diketahui Oleh :  
PPTK


*[Signature]*  
LEWANG GAMA  
NIP. 0011007109

Kontraktor Pelaksana  
CV. WIRATAMA KARYA

*[Signature]*  
CV. WIRATAMA KARYA  
PASAMAN BARAT

Judul Gambar

Skala

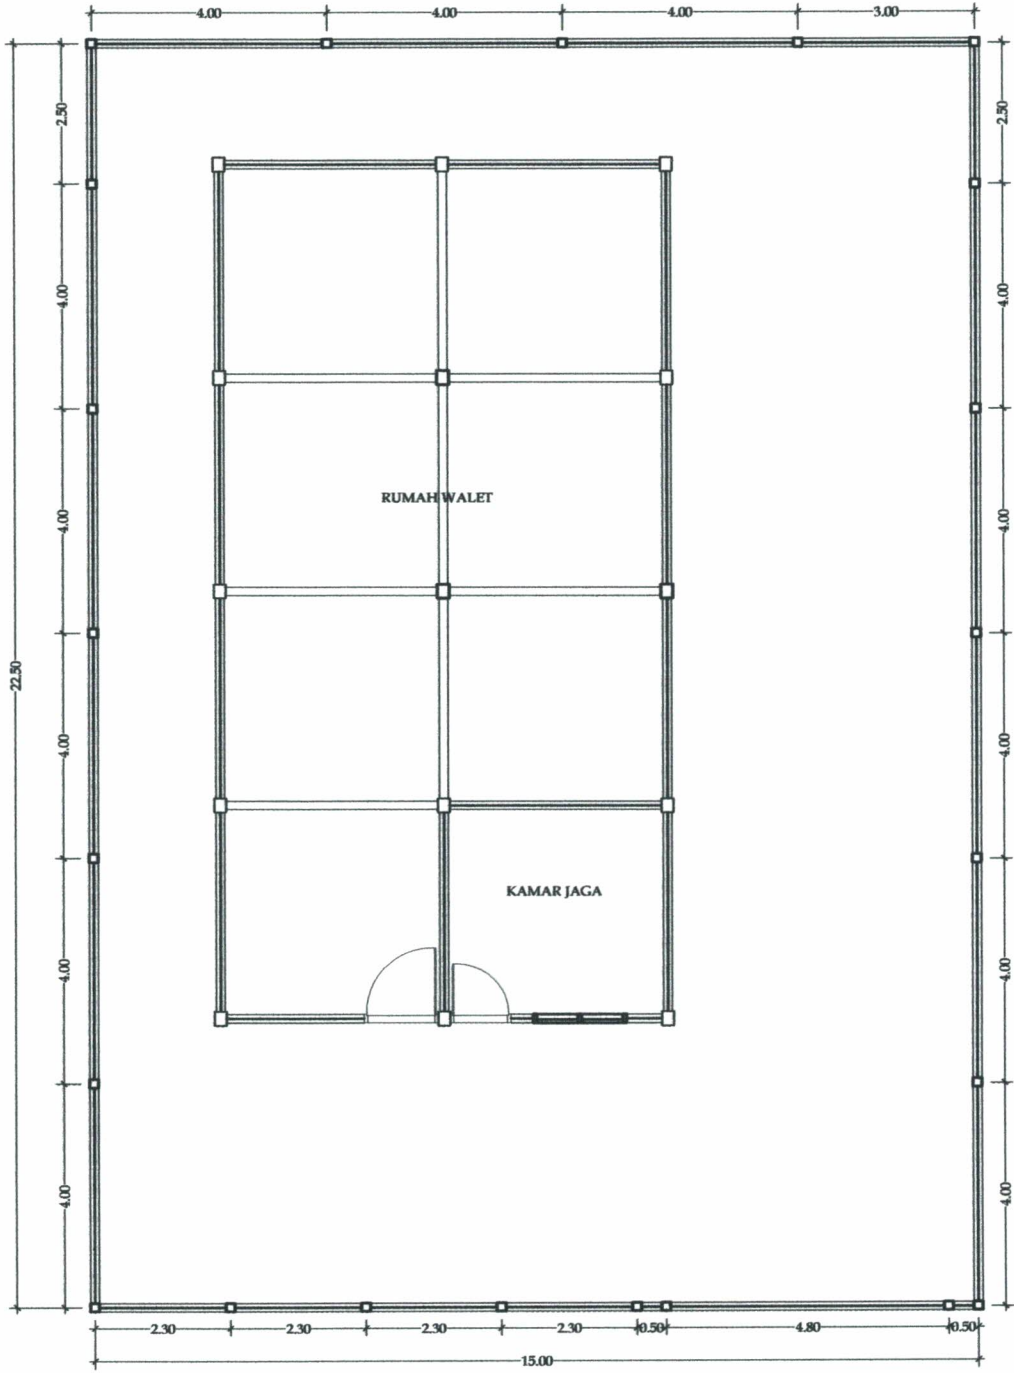

**DENAH**  
skala 1:125

PEMERINTAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN

PEMBINAAN POTENSI  
SARANG BURUNG WALET

PEKERJAAN

PEMBUATAN PAGAR GEDUNG  
SARANG BURUNG WALET SASAK  
DAN PENGAMANAN FONDASI

Dipinjam Oleh:  
Pengguna Lapangan

  
KURNIAWAN SAKA PUTRA  
NIP. 410 028 084

Diketahui Oleh:  
PPTK

  
EDWAK Z. AML  
NIP. 080 087 109


Kontraktor Pelaksana  
CV. WIRATAMA KARYA

  
CV. WIRATAMA KARYA  
PASAMAN BARAT


KEHAJIRAN  
Direktur

Judfiel Gembor


Standa



**TAMPAK DEPAN**  
skala 1:100



**TAMPAK S. KIRI**  
skala 1:100



**TAMPAK S. KANAN**  
skala 1:100

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN  
PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET

PEKERJAAN  
PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SAK DAN PENGAMANAN FONDASI

Dipersonal Oleh :  
Pengawas Lapangan

*[Signature]*  
KURNIAWAN-LEKA FLITRA  
NIP 410 028 082

Dituntun Oleh :  
PPTK

*[Signature]*  
EDWAR Z AMAL  
NIP 080 087 059


Kontraktor Pelaksana  
CV. WIRATAMA KARYA




*[Stamp: CV. WIRATAMA KARYA PASAMAN BARAT KEHUTANAN]*  
Direktur

Judul Gambar

Skala

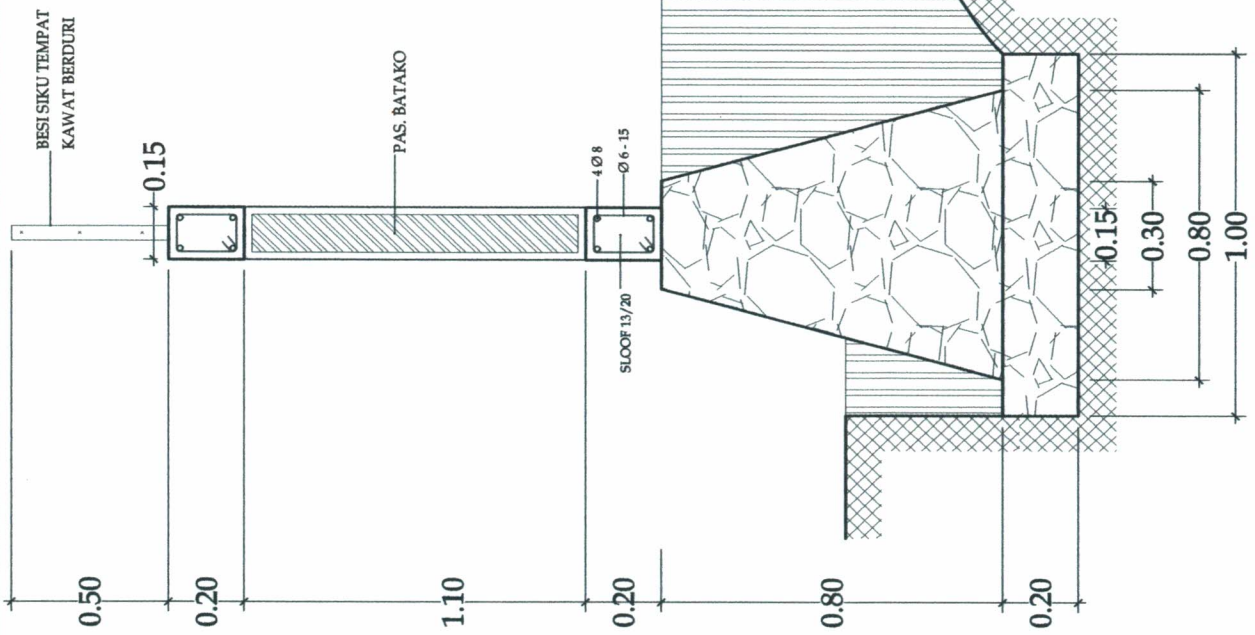**DETAIL "B"**  
skala 1:20



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN	KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET	PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR GEDUNG SARANG BURUNG WALET SASAK DAN PENGAMANAN FONDASI	Dibuat Oleh: Pengawas Lapangan 	Diketahui Oleh: PPTK EDWAR Z. AMZ NIP. 080.087.109 	Kontraktor Pelaksana CV. WIRATAMA KARYA KEARIFANAS Direktur 	Judul Gambar	Skala
---	---	--	--	---	---	--------------	-------

