Time schedule
M-8
diatas cover
M-9
TS M-19

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke I S/D Minggu Ke XIX

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL	:	26 Agustus 2010
NOMOR Addendum	:	540/166/ADD.I-KONTRAK/PLTMH/ IX /DPE-2010
TANGGAL	:	21 September 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.400.000,00**

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

Contraktor - Leveransir - Jasa & Teknik

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke XIV

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL	:	26 AGUSTUS 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.400.000,00**

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

Contraktor - Leveransir - Jasa & Teknik

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRAGARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KONTRAKTOR : CV. ASIS ENGINERIA
KABUPATEN : PASAMAN BARAT

No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke : XIV (EMPAT BELAS)
Dari Tanggal : 22 Nopember 2010
s/d Tanggal : 28 Nopember 2010

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
a	b	c	d	e	h	i	j	k	l	m
	RUMAH									
	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	Pembersihan Lapangan	m2	24.00	0.028	24.00	0.028		-	24.00	0.028
	Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.389	1.00	0.389		-	1.00	0.389
	Pek. Papan Bowplank & Pengukuran	Ls	20.00	0.126	20.00	0.126		-	20.00	0.126
	Plank Proyek	Ls	1.00	0.047	1.00	0.047		-	1.00	0.047
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI			-	-	-			-	-
	Galian Tanah Biasa	M3	8.64	0.027	8.64	0.027		-	8.64	0.027
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.96	0.018	0.96	0.018		-	0.96	0.018
	Aanstanpang Batu Kali	M3	1.82	0.053	1.82	0.053		-	1.82	0.053
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	14.17	1.329	14.17	1.329		-	14.17	1.329
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.56	0.004	2.56	0.004		-	2.56	0.004
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-				
	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	0.80	0.516	0.80	0.516		-	0.80	0.516
	Pek. Kolom 13/13	M3	0.19	0.149	0.19	0.149		-	0.19	0.149
	Pek. Reng Balok 20/25	M3	0.80	0.463	0.80	0.463		-	0.80	0.463
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	M3	0.44	0.071	0.44	0.071		-	0.44	0.071
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:4	M3	5.63	0.779	5.63	0.779		-	5.63	0.779
	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	M3	0.08	0.051	0.08	0.051		-	0.08	0.051
	Pek. Memeni Kozen	M2	4.14	0.007	4.14	0.007		-	4.14	0.007
	Plesteran	M2	81.40	0.443	81.40	0.443		-	81.40	0.443
				-	-	-				
	PEKERJAAN ATAP			-	-	-				
	Pek. Pas. Kuda-kuda	M3	0.25	0.103	0.25	0.103		-	0.25	0.103
	Pek. Pas. Gording	M3	0.31	0.001	0.31	0.001		-	0.31	0.001
	Pek. Atap Seng BJLS 20 K	M2	42.00	0.372	42.00	0.372		-	42.00	0.372
	Pek. Pas. Lisplank Papan	M2	6.00	0.112	6.00	0.112		-	6.00	0.112
	Pek. Resldu	M1	30.61	0.058	30.61	0.058		-	30.61	0.058
	Pek. Pas. Perabung	M1	7.00	0.012	7.00	0.012		-	7.00	0.012
	Pek. Baut kuda-kuda	Bh	12.00	0.015	12.00	0.015		-	12.00	0.015
	Pek. Pas. Besi Angker Kuda-kuda	Bh	6.00	0.005	6.00	0.005		-	6.00	0.005
				-	-	-				

Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
	Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
				Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
EKERJAAN LANTAI			-	-	-				
ek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	2.98	0.057	2.98	0.057		-	2.98	0.057
ek. Cor Lantai Beton 1:3:5	M3	5.07	0.434	5.07	0.434		-	5.07	0.434
			-	-	-				
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-	-	-				
Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	M3	0.09	0.011	0.09	0.011		-	0.09	0.011
Pek. Jendela Kaca	M2	0.80	0.032	0.80	0.032		-	0.80	0.032
Pek. Ventilasi Julasi	M2	2.89	0.101	2.89	0.101			2.89	0.101
Pek. Pas. Engsel Pintu	Bh	6.00	0.008	6.00	0.008		-	6.00	0.008
Pek. Pas. Grendel Pintu	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	Bh	1.00	0.023	1.00	0.023		-	1.00	0.023
Pek. Pas. Engsel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
Pek. Pas. Kait Angin	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
Pek. Pas. Grendel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
Pek. Hand Vantten	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
PEKERJAAN PIPA PESAT			-	-	-				
Pipa Pesat + Elbow Dia. 650 MM	M1	3.60	1.232	3.60	1.232		-	3.60	1.232
				-	-				
KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG				-	-				
PEKERJAAN PONDASI				-	-				
Galian Tanah Pondasi	M3	5.20	0.016	5.20	0.016		-	5.20	0.016
Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
Aanstanpang Batu Kali	M3	3.30	0.096	3.30	0.096		-	3.30	0.096
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6.02	0.703	6.02	0.703		-	6.02	0.703
Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
			-	-	-				
PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
Plesteran Dinding 1:2	M2	7.20	0.054	7.20	0.054		-	7.20	0.054
Pek. Balok 25/30	M3	0.45	0.267	0.45	0.267		-	0.45	0.267
			-	-	-				
PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	0.85	0.074	0.85	0.074		-	0.85	0.074
			-	-	-				
INTEK			-	-	-				
Galian Tanah Pondasi	M3	21.60	0.069	21.60	0.069		-	21.60	0.069
Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	1.20	0.023	1.20	0.023		-	1.20	0.023
Aanstanpang Batu Kali	M3	2.40	0.070	2.40	0.070		-	2.40	0.070
Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	7.58	0.885	7.85	0.916		-	7.85	0.916
Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	5.85	0.009	5.85	0.009		-	5.85	0.009
Coran Lantai	M3	0.96	0.082	0.96	0.082		-	0.96	0.082
Pintu Air dan Pintu Bendung	M2	2.00	2.488	2.00	2.488		-	2.00	2.488
Plesteran	M2	22.40	0.168	22.40	0.168		-	22.40	0.168
			-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	TALI BANDAR			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	90.00	0.285	90.00	0.285		-	90.00	0.285
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	2.50	0.047	2.50	0.047		-	2.50	0.047
	Aanstanpang Batu Kali	M3	15.00	0.439	15.00	0.439		-	15.00	0.439
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	19.88	2.319	19.88	2.320		-	19.88	2.320
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
	Coran Lantai	M3	4.00	0.342	4.00	0.342		-	4.00	0.342
	Urugan Tanah	M3	22.88	0.035	22.88	-			22.88	-
	Plesteran	M2	80.00	0.601	80.00	0.601		-	80.00	0.601
					-	-			-	-
	REHAB SALURAN IRIGASI				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	663.30	2.104	663.30	2.104		-	663.30	2.104
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	-	-						
	Aanstanpang Batu Kali	M3	28.56	0.835	28.56	0.835		-	28.56	0.835
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M3	176.14	20.556	176.14	20.556	-	-	176.14	20.556
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	41.28	0.062	41.28	0.062		-	41.28	0.062
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	559.20	4.200	559.20	4.200	-	-	559.20	4.200
	Pek. Saluran Gantung	M3	10.40	6.014	10.40	6.014		-	10.40	6.014
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	-	-	-	-			-	-
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	55.53	4.864	34.50	3.022	21.03	1.842	55.53	4.864
					-	-			-	-
	BAK PENENANG				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	-	-	-	-			-	-
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	11.71	0.222	11.71	0.222		-	11.71	0.222
	Aanstanpang Batu Kali	M3	13.63	0.398	13.63	0.398		-	13.63	0.398
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	36.84	4.299	36.84	4.299		-	36.84	4.299
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3		-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	96.20	0.722	96.20	0.722		-	96.20	0.722
	Pek. Balok 25/30	M3	7.96	4.604	7.96	4.604		-	7.96	4.604
	Pek. Plat	M3	0.32	0.210	0.32	0.210		-	0.32	0.210
	Pek. Pas. Saringan	Ls	2.00	0.768	2.00	0.768		-	2.00	0.768
	Pintu Air	Ls	1.00	0.233	1.00	0.233		-	1.00	0.233
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.81	0.034	1.81	0.034		-	1.81	0.034
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	3.89	0.340	3.89	0.340		-	3.89	0.340
				-	-	-			-	-

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN PELIMPAH			-	-	-			-	-
	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.91	0.025	1.91	0.025		-	1.91	0.025
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.28	0.024	1.28	0.024		-	1.28	0.024
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	M3	17.68	1.658	17.68	1.658		-	17.68	1.658
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	1.85	0.162	1.85	0.162		-	1.85	0.162
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK									
	Turbin Propolar	Unit	1.00	13.217						
	GeneratorAC Phasa 35 Kva + Balast Load	Ls	1.00	5.726						
	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00	4.665						
	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	1.00	1.166						
	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	1,000.00	6.220						
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING									
	Pelatihan Operator	Org	2.00	0.311						
	Tool Kit	Ls	1.00	0.155						
	Jumlah			100.00		66.694	-	1.84		68.54

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH,
PPTK

YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

LAPORAN MINGGUAN MATERIAL

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak : 520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke : **XIV (EMPAT BELAS)**
Tanggal : 22 Nopember 2010
s/d Tanggal : 28 Nopember 2010

No.	JENIS BAHAN	STN	JUMLAH MATERIAL								
			S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
			DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI
1	Pasir	M3	247.89	-	247.89	10.94	-	10.94	258.83	-	258.83
2	Semen	M3	1,771.02	-	1,771.02	97.58	-	97.58	1,868.60	-	1,868.60
3	Batu	M3	399.77	-	399.77	-	-	-	399.77	-	399.77
4	Kerikil	M3	71.04	-	71.04	16.40	-	16.40	87.45	-	87.45
5	Besi	Kg	1,475.37	-	1,475.37	-	-	-	1,475.37	-	1,475.37
6	Batu Bata	Bh	3,035.00	-	3,035.00	-	-	-	3,035.00	-	3,035.00
7	Kayu Banio	M3	0.31	-	0.31	-	-	-	0.31	-	0.31
8	Meni	Kg	9.94	-	9.94	-	-	-	9.94	-	9.94
9	Kayu Marsawa	M3	0.42	-	0.42	-	-	-	0.42	-	0.42
10	Atap	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Paku	Kg	0.63	-	0.63	-	-	-	0.63	-	0.63
12	Residu	Ltr	10.71	-	10.71	-	-	-	10.71	-	10.71
13	Seng Plat	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Papan Banio	M3	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0.56	-	0.56	-	-	-	0.56	-	0.56

Pengawas

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

Material Minggu XIV OK!

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN PERALATAN

KEGIATAN	*PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA*
PEKERJAAN	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak	520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak	: 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke	: **XIV (EMPAT BELAS)**
Tanggal	: *22 Nopember 2010*
s/d Tanggal	: 28 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	*Pelaksana*	54	1	1	1	1	1	1	-	60
2	Kepala Tukang	54	1	1	1	1	1	1	-	60
3	Tukang	108	2	2	2	2	2	2	-	120
4	Mandor	54	1	1	1	1	1	1	-	60
5	Pekerja	1,070	25	25	25	25	25	25	-	1,220
6	Logistig	54	1	1	1	1	1	1	-	60
		-								

II PERALATAN

No.	JENIS ALAT	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Cangkul	270	5	5	5	5	5	5		300
2	Sekop	162	3	3	3	3	3	3		180
3	Sendok Semen	270	5	5	5	5	5	5		300
4	Parang	108	2	2	2	2	2	2		120
5	Gergaji	108	2	2	2	2	2	2		120
6	Palu	162	3	3	3	3	3	3		180
7	Waterpass	54	1	1	1	1	1	1		60
8	Pahat	54	1	1	1	1	1	1		60
9	Bor Tangan	54	1	1	1	1	1	1		60
10	*Ketam*	54	1	1	1	1	1	1		60
11	Gerobak Dorong	432	8	8	8	8	8	8		480
12	Keranjang	270	5	5	5	5	5	5		300

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

KONTRAKTOR :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Tenaga Kerja Dan Perlatan Minggu XIV OK

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Senin
Tanggal : 22 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	2	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	25	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Pasir	M3	2.08
2	Semen	M3	18.56
3	*Batu*	*Zak*	-
4	Kerikil	M3	3.12
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	*Residu*	*M2*	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	5
2	Sekop	Unit	3
3	Sendok Semen	Unit	5
4	Parang	Unit	2
5	Gergaji	Unit	2
6	Palu	Unit	3
7	Waterpass	Unit	1
8	Pahat	Unit	1
9	Bor Tangan	Unit	1
10	Ketam	Unit	1
11	Grobak Dorong	Unit	8
12	Keranjang	Unit	5

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Pembersihan Lapangan	M2	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	
3	Aanstampang Batu Kali	M3	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	M3	
5	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	
6	Pekerjaan Kolom 13/13	M3	
7	Pekerjaan Reng Balok 20/25	M3	
8	Pekerjaan Cor Lantai Beton 1 : 2 : 3	M3	4.00

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Pasir	M3	2.08
2	Semen	M3	18.56
3	*Batu*	*Zak*	-
4	Kerikil	M3	3.12
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	*Residu*	*M2*	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA YASRI
Pelaksana

Minggu XIV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Selasa
Tanggal : 23 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	2	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	25	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Pasir	M3	2.08
2	Semen	M3	18.56
3	*Batu*	*Zak*	-
4	Kerikil	M3	3.12
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	*Residu*	*M2*	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	*Cangkul*	*Unit*	*5*
2	Sekop	Unit	3
3	Sendok Semen	Unit	5
4	Parang	Unit	2
5	Gergaji	Unit	2
6	Palu	Unit	3
7	Waterpass	Unit	1
8	Pahat	Unit	1
9	Bor Tangan	Unit	1
10	*Ketam*	*Unit*	*1*
11	Grobak Dorong	Unit	8
12	Keranjang	Unit	5

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	
2	Aanstampang Batu Kali	M3	
3	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	M3	
4	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	
5	Pekerjaan Kolom 13/13	M3	
6	Pekerjaan Reng Balok 20/25	M3	
7	Pekerjaan Cor Lantai Beton 1 : 2 : 3	M3	4.00

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Pasir	M3	2.08
2	Semen	M3	18.56
3	*Batu*	*Zak*	-
4	Kerikil	M3	3.12
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	*Residu*	*M2*	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	*Baik*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

Minggu XIV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Rabu
Tanggal : 24 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	2	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	25	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Pasir	M3	2.08
2	Semen	M3	18.56
3	Batu	Zak	-
4	Kerikil	M3	3.12
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	Residu	M2	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	5
2	Sekop	Unit	3
3	Sendok Semen	Unit	5
4	Parang	Unit	2
5	Gergaji	Unit	2
6	Palu	Unit	3
7	Waterpass	Unit	1
8	Pahat	Unit	1
9	Bor Tangan	Unit	1
10	Ketam	Unit	1
11	Grobak Dorong	Unit	8
12	Keranjang	Unit	5

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	
2	Aanstampang Batu Kali	M3	
3	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	M3	
4	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	
5	Pekerjaan Kolom 13/13	M3	
6	Pekerjaan Reng Balok 20/25	M3	
7	Pekerjaan Cor Lantai Beton 1 : 2 : 3	M3	4.00

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Pasir	M3	2.08
2	Semen	M3	18.56
3	Batu	Zak	-
4	Kerikil	M3	3.12
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	Residu	M2	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XIV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Kamis
Tanggal : 25 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	2	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	25	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Pasir	M3	2.08
2	Semen	M3	18.56
3	Batu	Zak	-
4	Kerikil	M3	3.12
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	Residu	M2	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	5
2	Sekop	Unit	3
3	Sendok Semen	Unit	5
4	Parang	Unit	2
5	Gergaji	Unit	2
6	Palu	Unit	3
7	Waterpass	Unit	1
8	Pahat	Unit	1
9	Bor Tangan	Unit	1
10	Ketam	Unit	1
11	Grobak Dorong	Unit	8
12	Keranjang	Unit	5

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	
2	Aanstampang Batu Kali	M3	
3	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	M3	
4	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	
5	Pekerjaan Kolom 13/13	M3	
6	Pekerjaan Reng Balok 20/25	M3	
7	Pekerjaan Cor Lantai Beton 1 : 2 : 3	M3	4.00

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Pasir	M3	2.08
2	Semen	M3	18.56
3	Batu	Zak	-
4	Kerikil	M3	3.12
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	Residu	M2	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XIV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Jumat
Tanggal : 26 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	2	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	25	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Pasir	M3	1.56
2	Semen	M3	13.92
3	Batu	Zak	-
4	Kerikil	M3	2.34
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	Residu	M2	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	5
2	Sekop	Unit	3
3	Sendok Semen	Unit	5
4	Parang	Unit	2
5	Gergaji	Unit	2
6	Palu	Unit	3
7	Waterpass	Unit	1
8	Pahat	Unit	1
9	Bor Tangan	Unit	1
10	Ketam	Unit	1
11	Grobak Dorong	Unit	8
12	Keranjang	Unit	5

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	
2	Aanstampang Batu Kali	M3	
3	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	M3	
4	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	
5	Pekerjaan Kolom 13/13	M3	
6	Pekerjaan Reng Balok 20/25	M3	
7	Pekerjaan Cor Lantai Beton 1 : 2 : 3	M3	3.00

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Pasir	M3	1.56
2	Semen	M3	13.92
3	Batu	Zak	-
4	Kerikil	M3	2.34
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	Residu	M2	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

Minggu XIV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	2	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	25	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Pasir	M3	1.06
2	Semen	M3	9.42
3	Batu	Zak	-
4	Kerikil	M3	1.58
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	Residu	M2	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	5
2	Sekop	Unit	3
3	Sendok Semen	Unit	5
4	Parang	Unit	2
5	Gergaji	Unit	2
6	Palu	Unit	3
7	Waterpass	Unit	1
8	Pahat	Unit	1
9	Bor Tangan	Unit	1
10	Ketam	Unit	1
11	Grobak Dorong	Unit	8
12	Keranjang	Unit	5

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	
2	Aanstampang Batu Kali	M3	
3	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	M3	
4	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	
5	Pekerjaan Kolom 13/13	M3	
6	Pekerjaan Reng Balok 20/25	M3	
7	Pekerjaan Cor Lantai Beton 1 : 2 : 3	M3	2.03

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Pasir	M3	1.06
2	Semen	M3	9.42
3	Batu	Zak	-
4	Kerikil	M3	1.58
5	Besi	Kg	-
6	Batu Bata	Bh	-
7	Kayu Banio	M3	-
8	Meni	kg	-
9	Kayu Marsawa	M3	-
10	Atap	Lembar	-
11	Paku	Kg	-
12	Residu	M2	-
13	Seng Plat	Lembar	-
14	Papan Banio	M3	-
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XIV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN	*PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK*
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
No. Kontrak	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak	26 AGUSTUS 2010
Hari	: Minggu
Tanggal	: 28 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		
2	Kepala Tukang	Oh		
3	Tukang	Oh		
4	Mandor	Oh		
5	Pekerja	Oh		
6	*Logistig*	*Oh*		

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	*Sendok Semen*	*Unit*	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	
		Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOL
	LIBUR		

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jur
Siang	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XIV OK!

" JADWAL PELAKSANAAN "

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
LOKASI : **KECAMATAN SUNGAI AUR**

KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PELAKSANA : CV. ASIS ENGINERIA

KONTRAK No. : **540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010**
TANGGAL : 18 September 2008
KONTRAK No. : **540/166/ADD.I/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010**
TANGGAL : 24 Desember 2010
Minggu Ke : XIV(EMPAT BELAS)
Dari Tanggal : 22 Nopember 2010
s/d Tanggal : 28 Nopember 2010

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PADA MINGGU KE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	KET
	RUMAH																					
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.589																				
	PEKERJAAN PONDASI	1.432																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	2.478																				
	PEKERJAAN ATAP	0.678																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.491																				
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	0.186																				
	PEKERJAAN PIPA PESAT	1.232																				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG																					
	PEKERJAAN PONDASI	0.837																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	0.321																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.092																				
	INTEK	3.793																				
	TALI BANDAR	4.073																				
	REHAB SALURAN IRIGASI																					
	PEKERJAAN PONDASI	23.557																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	10.214																				
	PEKERJAAN LANTAI	4.864																				
	BAK PENENANG																					
	PEKERJAAN PONDASI	4.920																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	6.538																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.375																				
	PEKERJAAN PELIMPAH	1.870																				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK	30.995																				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING	0.466																				
	RENCANA PER MINGGU		-	-	-	-	5.18	14.58	1.87	1.49	3.52	4.61	16.24	14.21	5.00	1.84	6.04	1.17	11.04	-	13.22	
	KOMULATIF RENCANA		-	-	-	-	5.18	19.75	21.62	23.11	26.63	31.25	47.49	61.70	66.69	68.54	74.57	75.74	86.78	86.78	100.00	
	REALISASI PER MINGGU		-																			
	KOMULATIF REALISASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

100
75
50
25
0

Realisasi ——
Rencana – – –

PPTK
YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

PENGAWAS LAPANGAN
MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

PENGAWAS LAPANGAN
DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA
AFRIAL SALIM
Kuasa Direktur

ASIS ENGINERIA

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke XV

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL	:	26 AGUSTUS 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.400.000,00**

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

Contraktor - Leveransir - Jasa & Teknik

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	No. Kontrak	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK	Tanggal Kontrak	:	26 AGUSTUS 2010
LOKASI	:	KECAMATAN SUNGAI AUR	Minggu Ke	:	XV (LIMA BELAS)
KONTRAKTOR	:	CV. ASIS ENGINERIA	Dari Tanggal	:	29 Nopember 2010
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT	s/d Tanggal	:	05 Desember 2010

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
a	b	c	d	e	h	i	j	k	l	m
	RUMAH									
	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	Pembersihan Lapangan	m2	24.00	0.028	24.00	0.028		-	24.00	0.028
	Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.389	1.00	0.389		-	1.00	0.389
	Pek. Papan Bowplank & Pengukuran	Ls	20.00	0.126	20.00	0.126		-	20.00	0.126
	Plank Proyek	Ls	1.00	0.047	1.00	0.047		-	1.00	0.047
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI			-	-	-			-	-
	Galian Tanah Biasa	M3	8.64	0.027	8.64	0.027		-	8.64	0.027
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.96	0.018	0.96	0.018		-	0.96	0.018
	Aanstanpang Batu Kali	M3	1.82	0.053	1.82	0.053		-	1.82	0.053
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	14.17	1.329	14.17	1.329		-	14.17	1.329
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.56	0.004	2.56	0.004		-	2.56	0.004
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-				
	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	0.80	0.516	0.80	0.516		-	0.80	0.516
	Pek. Kolom 13/13	M3	0.19	0.149	0.19	0.149		-	0.19	0.149
	Pek. Reng Balok 20/25	M3	0.80	0.463	0.80	0.463		-	0.80	0.463
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	M3	0.44	0.071	0.44	0.071		-	0.44	0.071
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:4	M3	5.63	0.779	5.63	0.779		-	5.63	0.779
	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	M3	0.08	0.051	0.08	0.051		-	0.08	0.051
	Pek. Memeni Kozen	M2	4.14	0.007	4.14	0.007		-	4.14	0.007
	Plesteran	M2	81.40	0.443	81.40	0.443		-	81.40	0.443
				-	-	-				
	PEKERJAAN ATAP			-	-	-				
	Pek. Pas. Kuda-kuda	M3	0.25	0.103	0.25	0.103		-	0.25	0.103
	Pek. Pas. Gording	M3	0.31	0.001	0.31	0.001		-	0.31	0.001
	Pek. Atap Seng BJLS 20 K	M2	42.00	0.372	42.00	0.372		-	42.00	0.372
	Pek. Pas. Lisplank Papan	M2	6.00	0.112	6.00	0.112		-	6.00	0.112
	Pek. Residu	M1	30.61	0.058	30.61	0.058		-	30.61	0.058
	Pek. Pas. Perabung	M1	7.00	0.012	7.00	0.012		-	7.00	0.012
	Pek. Baut kuda-kuda	Bh	12.00	0.015	12.00	0.015		-	12.00	0.015
	Pek. Pas. Besi Angker Kuda-kuda	Bh	6.00	0.005	6.00	0.005		-	6.00	0.005
				-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	2.98	0.057	2.98	0.057		-	2.98	0.057
	Pek. Cor Lantai Beton 1:3:5	M3	5.07	0.434	5.07	0.434		-	5.07	0.434
				-	-	-				
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-	-	-				
	Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	M3	0.09	0.011	0.09	0.011		-	0.09	0.011
	Pek. Jendela Kaca	M2	0.80	0.032	0.80	0.032		-	0.80	0.032
	Pek. Ventilasi Julasi	M2	2.89	0.101	2.89	0.101		-	2.89	0.101
	Pek. Pas. Engsel Pintu	Bh	6.00	0.008	6.00	0.008		-	6.00	0.008
	Pek. Pas. Grendel Pintu	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	Bh	1.00	0.023	1.00	0.023		-	1.00	0.023
	Pek. Pas. Engsel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kait Angin	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Grendel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Hand Vantten	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	PEKERJAAN PIPA PESAT			-	-	-				
	Pipa Pesat + Elbow Dia. 650 MM	M1	3.60	1.232	3.60	1.232		-	3.60	1.232
					-	-				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG				-	-				
	PEKERJAAN PONDASI				-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	5.20	0.016	5.20	0.016		-	5.20	0.016
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
	Aanstanpang Batu Kali	M3	3.30	0.096	3.30	0.096		-	3.30	0.096
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6.02	0.703	6.02	0.703		-	6.02	0.703
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	7.20	0.054	7.20	0.054		-	7.20	0.054
	Pek. Balok 25/30	M3	0.45	0.267	0.45	0.267		-	0.45	0.267
				-	-	-				
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	0.85	0.074	0.85	0.074		-	0.85	0.074
				-	-	-				
	INTEK			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	21.60	0.069	21.60	0.069		-	21.60	0.069
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	1.20	0.023	1.20	0.023		-	1.20	0.023
	Aanstanpang Batu Kali	M3	2.40	0.070	2.40	0.070		-	2.40	0.070
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	7.58	0.885	7.85	0.916		-	7.85	0.916
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	5.85	0.009	5.85	0.009		-	5.85	0.009
	Coran Lantai	M3	0.96	0.082	0.96	0.082		-	0.96	0.082
	Pintu Air dan Pintu Bendung	M2	2.00	2.488	2.00	2.488		-	2.00	2.488
	Plesteran	M2	22.40	0.168	22.40	0.168		-	22.40	0.168
				-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	TALI BANDAR			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	90.00	0.285	90.00	0.285		-	90.00	0.285
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	2.50	0.047	2.50	0.047		-	2.50	0.047
	Aanstanpang Batu Kali	M3	15.00	0.439	15.00	0.439		-	15.00	0.439
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	19.88	2.319	19.88	2.320		-	19.88	2.320
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
	Coran Lantai	M3	4.00	0.342	4.00	0.342		-	4.00	0.342
	Urugan Tanah	M3	22.88	0.035	22.88	-			22.88	-
	Plesteran	M2	80.00	0.601	80.00	0.601		-	80.00	0.601
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	REHAB SALURAN IRIGASI				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	663.30	2.104	663.30	2.104		-	663.30	2.104
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	-	-						
	Aanstanpang Batu Kali	M3	28.56	0.835	28.56	0.835		-	28.56	0.835
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M3	176.14	20.556	176.14	20.556		-	176.14	20.556
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	41.28	0.062	41.28	0.062		-	41.28	0.062
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	559.20	4.200	559.20	4.200		-	559.20	4.200
	Pek. Saluran Gantung	M3	10.40	6.014	10.40	6.014		-	10.40	6.014
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	-	-	-	-			-	-
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	55.53	4.864	55.53	4.864		-	55.53	4.864
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	BAK PENENANG				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	-	-	-	-			-	-
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	11.71	0.222	11.71	0.222		-	11.71	0.222
	Aanstanpang Batu Kali	M3	13.63	0.398	13.63	0.398		-	13.63	0.398
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	36.84	4.299	36.84	4.299		-	36.84	4.299
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3		-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	96.20	0.722	96.20	0.722		-	96.20	0.722
	Pek. Balok 25/30	M3	7.96	4.604	7.96	4.604		-	7.96	4.604
	Pek. Plat	M3	0.32	0.210	0.32	0.210		-	0.32	0.210
	Pek. Pas. Saringan	Ls	2.00	0.768	2.00	0.768		-	2.00	0.768
	Pintu Air	Ls	1.00	0.233	1.00	0.233		-	1.00	0.233
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.81	0.034	1.81	0.034		-	1.81	0.034
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	3.89	0.340	3.89	0.340		-	3.89	0.340
				-	-	-			-	-

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN PELIMPAH			-	-	-			-	-
	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.91	0.025	1.91	0.025		-	1.91	0.025
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.28	0.024	1.28	0.024		-	1.28	0.024
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	M3	17.68	1.658	17.68	1.658		-	17.68	1.658
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	1.85	0.162	1.85	0.162		-	1.85	0.162
					-	-				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK				-	-				
	Turbin Propolar	Unit	1.00	13.217	-	-		-	-	-
	GeneratorAC Phasa 35 Kva + Balast Load	Ls	1.00	5.726	-	-	1.00	5.726	1.00	5.726
	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00	4.665	-	-		-	-	-
	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	1.00	1.166	-	-		-	-	-
	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	1,000.00	6.220	-	-		-	-	-
				-	-	-				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING			-	-	-				
	Pelatihan Operator	Org	2.00	0.311	-	-	2.00	0.311	2.00	0.311
	Tool Kit	Ls	1.00	0.155	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			100.00		68.536	-	6.04		74.57

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH,
PPTK

YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd.
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

AFRIK SALIM
Kuasa Direktur

LAPORAN MINGGUAN MATERIAL

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak : 520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke : **XV (LIMA BELAS)**
Tanggal : 29 Nopember 2010
s/d Tanggal : 05 Desember 2010

No.	JENIS BAHAN	STN	JUMLAH MATERIAL								
			S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
			DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI
1	Pasir	M3	258.83	-	258.83	-	-	-	258.83	-	258.83
2	Semen	M3	1,868.60	-	1,868.60	-	-	-	1,868.60	-	1,868.60
3	Batu	M3	399.77	-	399.77	-	-	-	399.77	-	399.77
4	Kerikil	M3	87.45	-	87.45	-	-	-	87.45	-	87.45
5	Besi	Kg	1,475.37	-	1,475.37	-	-	-	1,475.37	-	1,475.37
6	Batu Bata	Bh	3,035.00	-	3,035.00	-	-	-	3,035.00	-	3,035.00
7	Kayu Banio	M3	0.31	-	0.31	-	-	-	0.31	-	0.31
8	Meni	Kg	9.94	-	9.94	-	-	-	9.94	-	9.94
9	Kayu Marsawa	M3	0.42	-	0.42	-	-	-	0.42	-	0.42
10	Atap	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Paku	Kg	0.63	-	0.63	-	-	-	0.63	-	0.63
12	Residu	Ltr	10.71	-	10.71	-	-	-	10.71	-	10.71
13	Seng Plat	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Papan Banio	M3	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0.56	-	0.56	-	-	-	0.56	-	0.56
16	Turbin Propolar	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Generator	Ls	-	-	-	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
18	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-	-	-		-	-	-	-	-
19	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-	-	-		-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-

Pengawas

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Material Minggu XV OK!

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN PERALATAN

KEGIATAN	*PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA*
PEKERJAAN	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak	520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak	: 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke	: **XV (LIMA BELAS)**
Tanggal	: *29 Nopember 2010*
s/d Tanggal	: 05 Desember 2010

I **TENAGA**

No.	JENIS TENAGA	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	*Pelaksana*	60	1	1	1	1	1	1	-	66
2	Kepala Tukang	60	1	1	1	1	1	1	-	66
3	Tukang	120	2	-	-	-	-	-	-	122
4	Mandor	60	1	-	-	-	-	-	-	61
5	Pekerja	1,220	25	-	-	-	-	-	-	1,245
6	Logistig	60	1	-	-	-	-	-	-	61
		-								

II **PERALATAN**

No.	JENIS ALAT	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Cangkul	300	-	-	-	-	-	5		305
2	Sekop	180	-	-	-	-	-	3		183
3	Sendok Semen	300	-	-	-	-	-	5		305
4	Parang	120	-	-	-	-	-	2		122
5	Gergaji	120	-	-	-	-	-	2		122
6	Palu	180	-	-	-	-	-	3		183
7	Waterpass	60	-	-	-	-	-	1		61
8	Pahat	60	-	-	-	-	-	1		61
9	Bor Tangan	60	-	-	-	-	-	1		61
10	*Ketam*	60	-	-	-	-	-	1		*61*
11	Gerobak Dorong	450	-	-	-	-	-	8		488
12	Keranjang	300	-	-	-	-	-	5		305

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

KONTRAKTOR :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Tenaga Kerja Dan Perlatan Minggu XV Ok

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Senin
Tanggal : 29 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	2	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	25	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	Ls	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	Ls	1.0
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	2.0
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	Ls	1.0
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Selasa
Tanggal : 30 Nopember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol El	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	Ls	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
No. Kontrak	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak	26 AGUSTUS 2010
Hari	: Rabu
Tanggal	: 01 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	Ls	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Kamis
Tanggal : 02 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	Ls	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	Ls	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Sabtu
Tanggal : 04 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	Ls	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	1.00
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XV OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : *PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK*
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Minggu
Tanggal : 05 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		
2	Kepala Tukang	Oh		
3	Tukang	Oh		
4	Mandor	Oh		
5	Pekerja	Oh		
6	*Logistig*	*Oh*		

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	*Sendok Semen*	*Unit*	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	
		Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
	LIBUR		

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA HASRI
Pelaksana

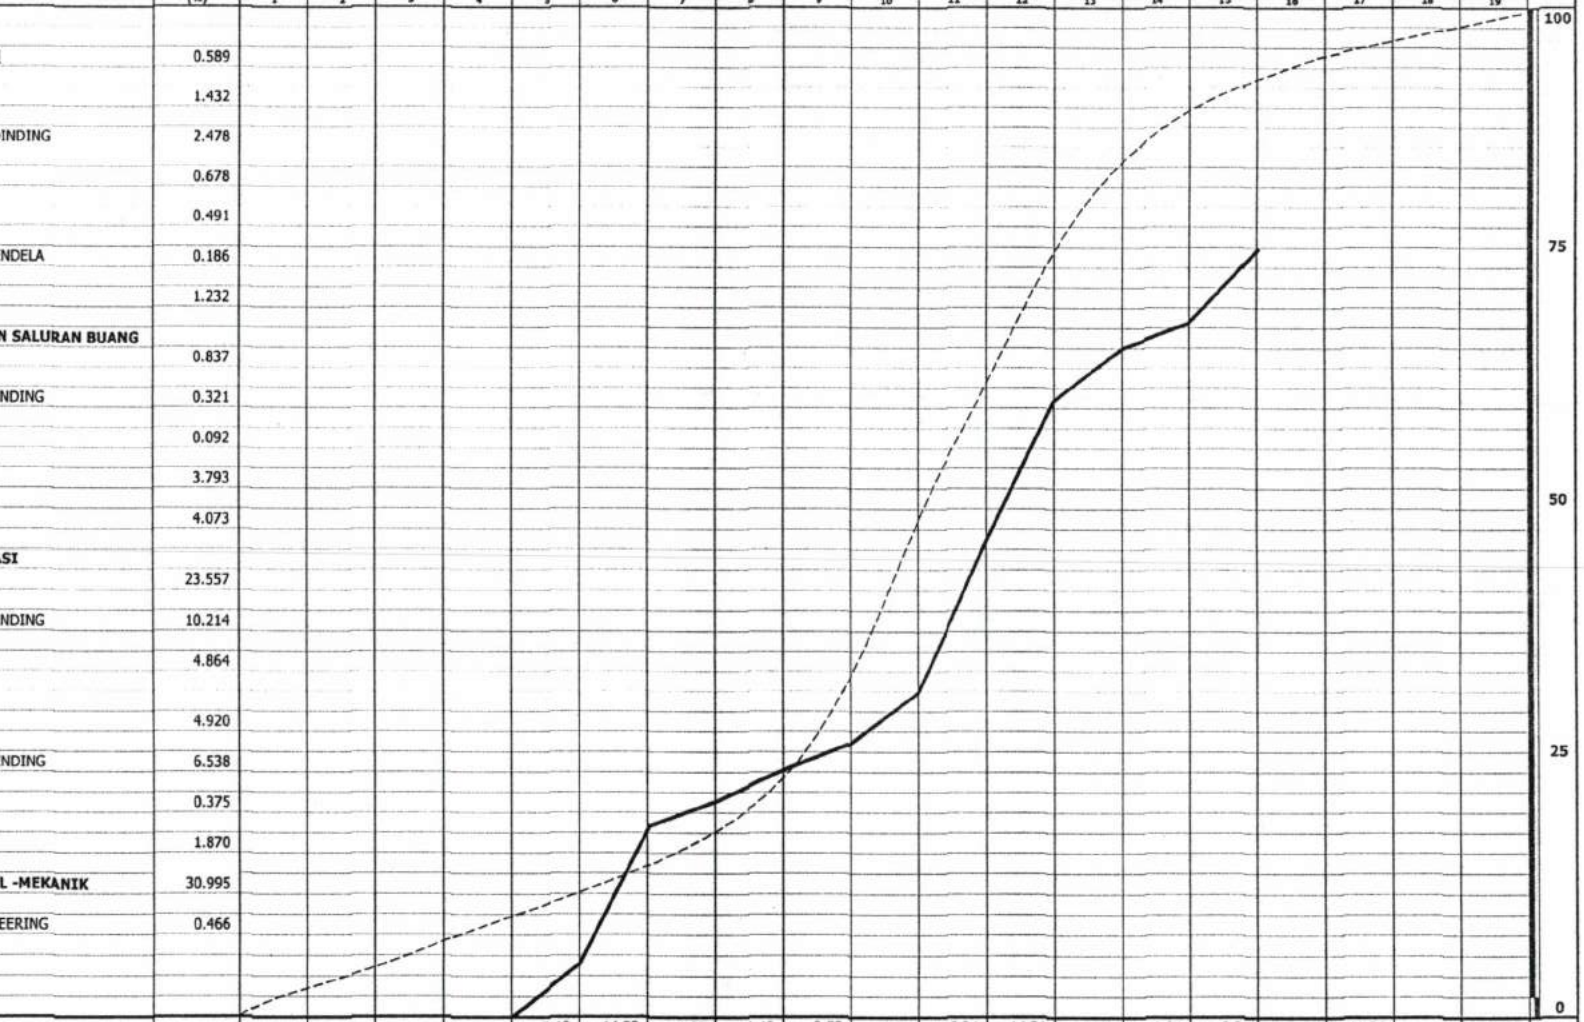
Minggu XV OK!

" JADWAL PELAKSANAAN "

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
LOKASI : **KECAMATAN SUNGAI AUR**
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PELAKSANA : CV. ASIS ENGINERIA

KONTRAK No. : **540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010**
TANGGAL : 18 September 2008
KONTRAK No. : **540/166/ADD.I/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010**
TANGGAL : 24 Desember 2010
Minggu Ke : XV (LIMA BELAS)
Dari Tanggal : 29 Nopember 2010
s/d Tanggal : 05 Desember 2010

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PADA MINGGU KE																	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RUMAH																					
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.589																				
	PEKERJAAN PONDASI	1.432																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	2.478																				
	PEKERJAAN ATAP	0.678																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.491																				
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	0.186																				
	PEKERJAAN PIPA PESAT	1.232																				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG																					
	PEKERJAAN PONDASI	0.837																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	0.321																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.092																				
	INTEK	3.793																				
	TALI BANDAR	4.073																				
	REHAB SALURAN IRIGASI																					
	PEKERJAAN PONDASI	23.557																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	10.214																				
	PEKERJAAN LANTAI	4.864																				
	BAK PENENANG																					
	PEKERJAAN PONDASI	4.920																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	6.538																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.375																				
	PEKERJAAN PELIMPAH	1.870																				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK	30.995																				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING	0.466																				
	RENCANA PER MINGGU		-	-	-	-	5.18	14.58	1.87	1.49	3.52	4.61	16.24	14.21	5.00	1.84	6.04	1.17	11.04	-	13.22	
	KOMULATIF RENCANA		-	-	-	-	5.18	19.75	21.62	23.11	26.63	31.25	47.49	61.70	66.69	68.54	74.57	75.74	86.78	86.78	100.00	
	REALISASI PER MINGGU		-																			
	KOMULATIF REALISASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							



Realisasi ——
Rencana – – –

PPTK
YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

PENGAWAS LAPANGAN
MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

PENGAWAS LAPANGAN
DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA
AZRI K. SALIM
Kuasa Direktur

ASIS ENGINERIA

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke XVI

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL	:	26 AGUSTUS 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.400.000,00**

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

Contraktor - Leveransir - Jasa & Teknik

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	No. Kontrak	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK	Tanggal Kontrak	:	26 AGUSTUS 2010
LOKASI	:	KECAMATAN SUNGAI AUR	Minggu Ke	:	XVI (ENAM BELAS)
KONTRAKTOR	:	CV. ASIS ENGINERIA	Dari Tanggal	:	06 Desember 2010
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT	s/d Tanggal	:	12 Desember 2010

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
a	b	c	d	e	h	i	j	k	l	m
	RUMAH									
	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	Pembersihan Lapangan	m2	24.00	0.028	24.00	0.028		-	24.00	0.028
	Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.389	1.00	0.389		-	1.00	0.389
	Pek. Papan Bowplank & Pengukuran	Ls	20.00	0.126	20.00	0.126		-	20.00	0.126
	Plank Proyek	Ls	1.00	0.047	1.00	0.047		-	1.00	0.047
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI			-	-	-			-	-
	Galian Tanah Biasa	M3	8.64	0.027	8.64	0.027		-	8.64	0.027
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.96	0.018	0.96	0.018		-	0.96	0.018
	Aanstanpang Batu Kali	M3	1.82	0.053	1.82	0.053		-	1.82	0.053
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	14.17	1.329	14.17	1.329		-	14.17	1.329
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.56	0.004	2.56	0.004		-	2.56	0.004
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-				
	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	0.80	0.516	0.80	0.516		-	0.80	0.516
	Pek. Kolom 13/13	M3	0.19	0.149	0.19	0.149		-	0.19	0.149
	Pek. Reng Balok 20/25	M3	0.80	0.463	0.80	0.463		-	0.80	0.463
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	M3	0.44	0.071	0.44	0.071		-	0.44	0.071
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:4	M3	5.63	0.779	5.63	0.779		-	5.63	0.779
	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	M3	0.08	0.051	0.08	0.051		-	0.08	0.051
	Pek. Memeni Kozen	M2	4.14	0.007	4.14	0.007		-	4.14	0.007
	Plesteran	M2	81.40	0.443	81.40	0.443		-	81.40	0.443
				-	-	-				
	PEKERJAAN ATAP			-	-	-				
	Pek. Pas. Kuda-kuda	M3	0.25	0.103	0.25	0.103		-	0.25	0.103
	Pek. Pas. Gording	M3	0.31	0.001	0.31	0.001		-	0.31	0.001
	Pek. Atap Seng BJLS 20 K	M2	42.00	0.372	42.00	0.372		-	42.00	0.372
	Pek. Pas. Lisplank Papan	M2	6.00	0.112	6.00	0.112		-	6.00	0.112
	Pek. Residu	M1	30.61	0.058	30.61	0.058		-	30.61	0.058
	Pek. Pas. Perabung	M1	7.00	0.012	7.00	0.012		-	7.00	0.012
	Pek. Baut kuda-kuda	Bh	12.00	0.015	12.00	0.015		-	12.00	0.015
	Pek. Pas. Besi Angker Kuda-kuda	Bh	6.00	0.005	6.00	0.005		-	6.00	0.005
				-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	2.98	0.057	2.98	0.057		-	2.98	0.057
	Pek. Cor Lantai Beton 1:3:5	M3	5.07	0.434	5.07	0.434		-	5.07	0.434
				-	-	-				
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-	-	-				
	Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	M3	0.09	0.011	0.09	0.011		-	0.09	0.011
	Pek. Jendela Kaca	M2	0.80	0.032	0.80	0.032		-	0.80	0.032
	Pek. Ventilasi Julasi	M2	2.89	0.101	2.89	0.101		-	2.89	0.101
	Pek. Pas. Engsel Pintu	Bh	6.00	0.008	6.00	0.008		-	6.00	0.008
	Pek. Pas. Grendel Pintu	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	Bh	1.00	0.023	1.00	0.023		-	1.00	0.023
	Pek. Pas. Engsel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kait Angin	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Grendel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Hand Vantten	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	PEKERJAAN PIPA PESAT			-	-	-				
	Pipa Pesat + Elbow Dia. 650 MM	M1	3.60	1.232	3.60	1.232		-	3.60	1.232
					-	-				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG				-	-				
	PEKERJAAN PONDASI				-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	5.20	0.016	5.20	0.016		-	5.20	0.016
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
	Aanstanpang Batu Kali	M3	3.30	0.096	3.30	0.096		-	3.30	0.096
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6.02	0.703	6.02	0.703		-	6.02	0.703
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	7.20	0.054	7.20	0.054		-	7.20	0.054
	Pek. Balok 25/30	M3	0.45	0.267	0.45	0.267		-	0.45	0.267
				-	-	-				
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	0.85	0.074	0.85	0.074		-	0.85	0.074
				-	-	-				
	INTEK			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	21.60	0.069	21.60	0.069		-	21.60	0.069
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	1.20	0.023	1.20	0.023		-	1.20	0.023
	Aanstanpang Batu Kali	M3	2.40	0.070	2.40	0.070		-	2.40	0.070
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	7.58	0.885	7.85	0.916		-	7.85	0.916
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	5.85	0.009	5.85	0.009		-	5.85	0.009
	Coran Lantai	M3	0.96	0.082	0.96	0.082		-	0.96	0.082
	Pintu Air dan Pintu Bendung	M2	2.00	2.488	2.00	2.488		-	2.00	2.488
	Plesteran	M2	22.40	0.168	22.40	0.168		-	22.40	0.168
				-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	TALI BANDAR			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	90.00	0.285	90.00	0.285		-	90.00	0.285
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	2.50	0.047	2.50	0.047		-	2.50	0.047
	Aanstanpang Batu Kali	M3	15.00	0.439	15.00	0.439		-	15.00	0.439
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	19.88	2.319	19.88	2.320		-	19.88	2.320
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
	Coran Lantai	M3	4.00	0.342	4.00	0.342		-	4.00	0.342
	Urugan Tanah	M3	22.88	0.035	22.88	-			22.88	-
	Plesteran	M2	80.00	0.601	80.00	0.601		-	80.00	0.601
					-	-			-	-
	REHAB SALURAN IRIGASI				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	663.30	2.104	663.30	2.104		-	663.30	2.104
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	-	-						
	Aanstanpang Batu Kali	M3	28.56	0.835	28.56	0.835		-	28.56	0.835
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M3	176.14	20.556	176.14	20.556		-	176.14	20.556
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	41.28	0.062	41.28	0.062		-	41.28	0.062
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	559.20	4.200	559.20	4.200		-	559.20	4.200
	Pek. Saluran Gantung	M3	10.40	6.014	10.40	6.014		-	10.40	6.014
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	-	-	-	-			-	-
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	55.53	4.864	55.53	4.864		-	55.53	4.864
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	BAK PENENANG				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	-	-	-	-			-	-
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	11.71	0.222	11.71	0.222		-	11.71	0.222
	Aanstanpang Batu Kali	M3	13.63	0.398	13.63	0.398		-	13.63	0.398
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	36.84	4.299	36.84	4.299		-	36.84	4.299
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3		-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	96.20	0.722	96.20	0.722		-	96.20	0.722
	Pek. Balok 25/30	M3	7.96	4.604	7.96	4.604		-	7.96	4.604
	Pek. Plat	M3	0.32	0.210	0.32	0.210		-	0.32	0.210
	Pek. Pas. Saringan	Ls	2.00	0.768	2.00	0.768		-	2.00	0.768
	Pintu Air	Ls	1.00	0.233	1.00	0.233		-	1.00	0.233
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.81	0.034	1.81	0.034		-	1.81	0.034
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	3.89	0.340	3.89	0.340		-	3.89	0.340
				-	-	-			-	-

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN PELIMPAH			-	-	-			-	-
	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.91	0.025	1.91	0.025		-	1.91	0.025
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.28	0.024	1.28	0.024		-	1.28	0.024
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	M3	17.68	1.658	17.68	1.658		-	17.68	1.658
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	1.85	0.162	1.85	0.162		-	1.85	0.162
					-	-				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK				-	-				
	Turbin Propolar	Unit	1.00	13.217	-	-		-	-	-
	GeneratorAC Phasa 35 Kva + Balast Load	Ls	1.00	5.726	1.00	5.726		-	1.00	5.726
	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00	4.665	-	-		-	-	-
	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	1.00	1.166	-	-	1.00	1.166	1.00	1.166
	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	1,000.00	6.220	-	-		-	-	-
					-	-				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING			-	-	-				
	Pelatihan Operator	Org	2.00	0.311	2.00	0.311	-	-	2.00	0.311
	Tool Kit	Ls	1.00	0.155	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			100.00		74.57	-	1.17		75.74

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH,
PPTK

YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

LAPORAN MINGGUAN MATERIAL

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak : 520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke : **XVI (ENAM BELAS)**
Tanggal : 06 Desember 2010
s/d Tanggal : 12 Desember 2010

No.	JENIS BAHAN	STN	JUMLAH MATERIAL								
			S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
			DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI
1	Pasir	M3	258.83	-	258.83	-	-	-	258.83	-	258.83
2	Semen	M3	1,868.60	-	1,868.60	-	-	-	1,868.60	-	1,868.60
3	Batu	M3	399.77	-	399.77	6.00	-	6.00	405.77	-	405.77
4	Kerikil	M3	87.45	-	87.45	-	-	-	87.45	-	87.45
5	Besi	Kg	1,475.37	-	1,475.37	-	-	-	1,475.37	-	1,475.37
6	Batu Bata	Bh	3,035.00	-	3,035.00	-	-	-	3,035.00	-	3,035.00
7	Kayu Banio	M3	0.31	-	0.31	-	-	-	0.31	-	0.31
8	Meni	Kg	9.94	-	9.94	-	-	-	9.94	-	9.94
9	Kayu Marsawa	M3	0.42	-	0.42	-	-	-	0.42	-	0.42
10	Atap	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Paku	Kg	0.63	-	0.63	-	-	-	0.63	-	0.63
12	Residu	Ltr	10.71	-	10.71	-	-	-	10.71	-	10.71
13	Seng Plat	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Papan Banio	M3	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0.56	-	0.56	-	-	-	0.56	-	0.56
16	Turbin Propolar	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Generator	Ls	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00
18	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengawas

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA YASRI
Pelaksana

Material Minggu XVI OK!

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN PERALATAN

KEGIATAN	*PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA*
PEKERJAAN	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak	520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak	: 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke	: **XVI (ENAM BELAS)**
Tanggal	: *06 Desember 2010*
s/d Tanggal	: 12 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	*Pelaksana*	*66*	1	1	1	1	1	1	-	72
2	Kepala Tukang	66	1	1	1	1	1	1	-	72
3	Tukang	122	2	-	-	-	-	-	-	124
4	Mandor	61	1	-	-	-	-	-	-	62
5	Pekerja	1,245	25	-	-	-	-	-	-	1,270
6	Logistig	61	1	-	-	-	-	-	-	62
		-								

II PERALATAN

No.	JENIS ALAT	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Cangkul	305	-	-	-	-	-	5		310
2	Sekop	183	-	-	-	-	-	3		186
3	Sendok Semen	305	-	-	-	-	-	5		310
4	Parang	122	-	-	-	-	-	2		124
5	Gergaji	122	-	-	-	-	-	2		124
6	Palu	183	-	-	-	-	-	3		186
7	Waterpass	61	-	-	-	-	-	1		62
8	Pahat	61	-	-	-	-	-	1		62
9	Bor Tangan	61	-	-	-	-	-	1		62
10	*Ketam*	*61*	-	-	-	-	-	*1*		*62*
11	Gerobak Dorong	488	-	-	-	-	-	8		496
12	Keranjang	305	-	-	-	-	-	5		310

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

KONTRAKTOR :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA YASRI
Pelaksana

Tenaga Kerja Dan Perlatan Minggu XVI OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Senin
Tanggal : 06 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	2	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	25	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	0.17
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVI OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Selasa
Tanggal : 07 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol El	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	0.17
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVI OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Rabu
Tanggal : 08 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	0.17
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA PASRI
Pelaksana

Minggu XVI OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
No. Kontrak	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak	26 AGUSTUS 2010
Hari	: Kamis
Tanggal	: 09 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	0.17
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

Minggu XVI OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Jumat
Tanggal : 10 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	0.17
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVI OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Sabtu
Tanggal : 11 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol El	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	5
2	Sekop	Unit	3
3	Sendok Semen	Unit	5
4	Parang	Unit	2
5	Gergaji	Unit	2
6	Palu	Unit	3
7	Waterpass	Unit	1
8	Pahat	Unit	1
9	Bor Tangan	Unit	1
10	Ketam	Unit	1
11	Grobak Dorong	Unit	8
12	Keranjang	Unit	5

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	0.17
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVI OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : *PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK*
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Minggu
Tanggal : 12 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		
2	Kepala Tukang	Oh		
3	Tukang	Oh		
4	Mandor	Oh		
5	Pekerja	Oh		
6	*Logistig*	*Oh*		

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	*Sendok Semen*	*Unit*	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	
		Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
	LIBUR		

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVI OK!

" JADWAL PELAKSANAAN "

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
LOKASI : **KECAMATAN SUNGAI AUR**
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PELAKSANA : CV. ASIS ENGINERIA

KONTRAK No. : **540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010**
TANGGAL : 18 September 2008
KONTRAK No. : **540/166/ADD.1/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010**
TANGGAL : 24 Desember 2010
Minggu Ke : XVI (ENAM BELAS)
Dari Tanggal : 06 Desember 2010
s/d Tanggal : 12 Desember 2010

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PADA MINGGU KE																		KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RUMAH																				
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.589																			
	PEKERJAAN PONDASI	1.432																			
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	2.478																			
	PEKERJAAN ATAP	0.678																			
	PEKERJAAN LANTAI	0.491																			
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	0.186																			
	PEKERJAAN PIPA PESAT	1.232																			
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG																				
	PEKERJAAN PONDASI	0.837																			
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	0.321																			
	PEKERJAAN LANTAI	0.092																			
	INTEK	3.793																			
	TALI BANDAR	4.073																			
	REHAB SALURAN IRIGASI																				
	PEKERJAAN PONDASI	23.557																			
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	10.214																			
	PEKERJAAN LANTAI	4.864																			
	BAK PENENANG																				
	PEKERJAAN PONDASI	4.920																			
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	6.538																			
	PEKERJAAN LANTAI	0.375																			
	PEKERJAAN PELIMPAH	1.870																			
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK	30.995																			
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING	0.466																			
	RENCANA PER MINGGU		-	-	-	-	5.18	14.58	1.87	1.49	3.52	4.61	16.24	14.21	5.00	1.84	6.04	1.17	11.04	-	13.22	
	KOMULATIF RENCANA		-	-	-	-	5.18	19.75	21.62	23.11	26.63	31.25	47.49	61.70	66.69	68.54	74.57	75.74	86.78	86.78	100.00	
	REALISASI PER MINGGU		-																		
	KOMULATIF REALISASI		-																		

100
75
50
25
0

Realisasi ——
Rencana - - -

PPTK
YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

PENGAWAS LAPANGAN
MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19710327 2008 01 1 002

PENGAWAS LAPANGAN
DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA
ASIS ENGINERIA
AERI K. SALIM
Kabid Direktur

JADWAL PELAKSANAAN KURVA S PLTMH

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke XVII

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL	:	26 AGUSTUS 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.459.000,00**

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

Contraktor - Leveransir - Jasa & Teknik

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	No. Kontrak	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK	Tanggal Kontrak	:	26 AGUSTUS 2010
LOKASI	:	KECAMATAN SUNGAI AUR	Minggu Ke	:	XVII (TUJUH BELAS)
KONTRAKTOR	:	CV. ASIS ENGINERIA	Dari Tanggal	:	13 Desember 2010
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT	s/d Tanggal	:	19 Desember 2010

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
a	b	c	d	e	h	i	j	k	l	m
	RUMAH									
	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	Pembersihan Lapangan	m2	24.00	0.028	24.00	0.028		-	24.00	0.028
	Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.389	1.00	0.389		-	1.00	0.389
	Pek. Papan Bowplank & Pengukuran	Ls	20.00	0.126	20.00	0.126		-	20.00	0.126
	Plank Proyek	Ls	1.00	0.047	1.00	0.047		-	1.00	0.047
				-	-	-				
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI			-	-	-			-	-
	Galian Tanah Biasa	M3	8.64	0.027	8.64	0.027		-	8.64	0.027
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.96	0.018	0.96	0.018		-	0.96	0.018
	Aanstanpang Batu Kali	M3	1.82	0.053	1.82	0.053		-	1.82	0.053
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	14.17	1.329	14.17	1.329		-	14.17	1.329
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.56	0.004	2.56	0.004		-	2.56	0.004
				-	-	-				
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-				
	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	0.80	0.516	0.80	0.516		-	0.80	0.516
	Pek. Kolom 13/13	M3	0.19	0.149	0.19	0.149		-	0.19	0.149
	Pek. Reng Balok 20/25	M3	0.80	0.463	0.80	0.463		-	0.80	0.463
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	M3	0.44	0.071	0.44	0.071		-	0.44	0.071
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:4	M3	5.63	0.779	5.63	0.779		-	5.63	0.779
	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	M3	0.08	0.051	0.08	0.051		-	0.08	0.051
	Pek. Memeni Kozen	M2	4.14	0.007	4.14	0.007		-	4.14	0.007
	Plesteran	M2	81.40	0.443	81.40	0.443		-	81.40	0.443
				-	-	-				
	PEKERJAAN ATAP			-	-	-				
	Pek. Pas. Kuda-kuda	M3	0.25	0.103	0.25	0.103		-	0.25	0.103
	Pek. Pas. Gording	M3	0.31	0.001	0.31	0.001		-	0.31	0.001
	Pek. Atap Seng BJLS 20 K	M2	42.00	0.372	42.00	0.372		-	42.00	0.372
	Pek. Pas. Lisplank Papan	M2	6.00	0.112	6.00	0.112		-	6.00	0.112
	Pek. Residu	M1	30.61	0.058	30.61	0.058		-	30.61	0.058
	Pek. Pas. Perabung	M1	7.00	0.012	7.00	0.012		-	7.00	0.012
	Pek. Baut kuda-kuda	Bh	12.00	0.015	12.00	0.015		-	12.00	0.015
	Pek. Pas. Besi Angker Kuda-kuda	Bh	6.00	0.005	6.00	0.005		-	6.00	0.005

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	2.98	0.057	2.98	0.057		-	2.98	0.057
	Pek. Cor Lantai Beton 1:3:5	M3	5.07	0.434	5.07	0.434		-	5.07	0.434
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-	-	-				
	Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	M3	0.09	0.011	0.09	0.011		-	0.09	0.011
	Pek. Jendela Kaca	M2	0.80	0.032	0.80	0.032		-	0.80	0.032
	Pek. Ventilasi Julasi	M2	2.89	0.101	2.89	0.101		-	2.89	0.101
	Pek. Pas. Engsel Pintu	Bh	6.00	0.008	6.00	0.008		-	6.00	0.008
	Pek. Pas. Grendel Pintu	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	Bh	1.00	0.023	1.00	0.023		-	1.00	0.023
	Pek. Pas. Engsel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kait Angin	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Grendel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Hand Vantten	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	PEKERJAAN PIPA PESAT			-	-	-				
	Pipa Pesat + Elbow Dia. 650 MM	M1	3.60	1.232	3.60	1.232		-	3.60	1.232
					-	-				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG				-	-				
	PEKERJAAN PONDASI				-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	5.20	0.016	5.20	0.016		-	5.20	0.016
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
	Aanstanpang Batu Kali	M3	3.30	0.096	3.30	0.096		-	3.30	0.096
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6.02	0.703	6.02	0.703		-	6.02	0.703
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-				
	Plesteran Dinding 1:2	M2	7.20	0.054	7.20	0.054		-	7.20	0.054
	Pek. Balok 25/30	M3	0.45	0.267	0.45	0.267		-	0.45	0.267
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	0.85	0.074	0.85	0.074		-	0.85	0.074
	INTEK			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	21.60	0.069	21.60	0.069		-	21.60	0.069
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	1.20	0.023	1.20	0.023		-	1.20	0.023
	Aanstanpang Batu Kali	M3	2.40	0.070	2.40	0.070		-	2.40	0.070
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	7.58	0.885	7.85	0.916		-	7.85	0.916
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	5.85	0.009	5.85	0.009		-	5.85	0.009
	Coran Lantai	M3	0.96	0.082	0.96	0.082		-	0.96	0.082
	Pintu Air dan Pintu Bendung	M2	2.00	2.488	2.00	2.488		-	2.00	2.488
	Plesteran	M2	22.40	0.168	22.40	0.168		-	22.40	0.168
				-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	TALI BANDAR			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	90.00	0.285	90.00	0.285		-	90.00	0.285
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	2.50	0.047	2.50	0.047		-	2.50	0.047
	Aanstanpang Batu Kali	M3	15.00	0.439	15.00	0.439		-	15.00	0.439
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	19.88	2.319	19.88	2.320		-	19.88	2.320
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
	Coran Lantai	M3	4.00	0.342	4.00	0.342		-	4.00	0.342
	Urugan Tanah	M3	22.88	0.035	22.88	-			22.88	-
	Plesteran	M2	80.00	0.601	80.00	0.601		-	80.00	0.601
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	REHAB SALURAN IRIGASI				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	663.30	2.104	663.30	2.104		-	663.30	2.104
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	-	-						
	Aanstanpang Batu Kali	M3	28.56	0.835	28.56	0.835		-	28.56	0.835
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M3	176.14	20.556	176.14	20.556		-	176.14	20.556
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	41.28	0.062	41.28	0.062		-	41.28	0.062
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	559.20	4.200	559.20	4.200		-	559.20	4.200
	Pek. Saluran Gantung	M3	10.40	6.014	10.40	6.014		-	10.40	6.014
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	-	-	-	-			-	-
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	55.53	4.864	55.53	4.864		-	55.53	4.864
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	BAK PENENANG				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	-	-	-	-			-	-
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	11.71	0.222	11.71	0.222		-	11.71	0.222
	Aanstanpang Batu Kali	M3	13.63	0.398	13.63	0.398		-	13.63	0.398
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	36.84	4.299	36.84	4.299		-	36.84	4.299
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3		-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	96.20	0.722	96.20	0.722		-	96.20	0.722
	Pek. Balok 25/30	M3	7.96	4.604	7.96	4.604		-	7.96	4.604
	Pek. Plat	M3	0.32	0.210	0.32	0.210		-	0.32	0.210
	Pek. Pas. Saringan	Ls	2.00	0.768	2.00	0.768		-	2.00	0.768
	Pintu Air	Ls	1.00	0.233	1.00	0.233		-	1.00	0.233
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.81	0.034	1.81	0.034		-	1.81	0.034
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	3.89	0.340	3.89	0.340		-	3.89	0.340

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN PELIMPAH			-	-	-			-	-
	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.91	0.025	1.91	0.025		-	1.91	0.025
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.28	0.024	1.28	0.024		-	1.28	0.024
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	M3	17.68	1.658	17.68	1.658		-	17.68	1.658
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	1.85	0.162	1.85	0.162		-	1.85	0.162
					-	-				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK				-	-				
	Turbin Propolar	Unit	1.00	13.217	-	-		-	-	-
	GeneratorAC Phasa 35 Kva + Balast Load	Ls	1.00	5.726	1.00	5.726		-	1.00	5.726
	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00	4.665	-	-	1.00	4.665	1.00	4.665
	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	1.00	1.166	1.00	1.166		-	1.00	1.166
	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	1,000.00	6.220	-	-	1,000.00	6.220	1,000.00	6.220
				-	-	-				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING			-	-	-				
	Pelatihan Operator	Org	2.00	0.311	2.00	0.311	-	-	2.00	0.311
	Tool Kit	Ls	1.00	0.155	-	-	1.00	0.155	1.00	0.155
	Jumlah			100.00		75.74	-	11.04		86.78

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH,
PPTK

YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

LAPORAN MINGGUAN MATERIAL

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak : 520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke : **XVII (TUJUH BELAS)**
Tanggal : 13 Desember 2010
s/d Tanggal : 19 Desember 2010

No.	JENIS BAHAN	STN	JUMLAH MATERIAL								
			S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
			DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI
1	Pasir	M3	258.83	-	258.83	-	-	-	258.83	-	258.83
2	Semen	M3	1,868.60	-	1,868.60	-	-	-	1,868.60	-	1,868.60
3	Batu	M3	405.77	-	405.77	-	-	-	405.77	-	405.77
4	Kerikil	M3	87.45	-	87.45	-	-	-	87.45	-	87.45
5	Besi	Kg	1,475.37	-	1,475.37	-	-	-	1,475.37	-	1,475.37
6	Batu Bata	Bh	3,035.00	-	3,035.00	-	-	-	3,035.00	-	3,035.00
7	Kayu Banio	M3	0.31	-	0.31	-	-	-	0.31	-	0.31
8	Meni	Kg	9.94	-	9.94	-	-	-	9.94	-	9.94
9	Kayu Marsawa	M3	0.42	-	0.42	-	-	-	0.42	-	0.42
10	Atap	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Paku	Kg	0.63	-	0.63	-	-	-	0.63	-	0.63
12	Residu	Ltr	10.71	-	10.71	-	-	-	10.71	-	10.71
13	Seng Plat	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Papan Banio	M3	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0.56	-	0.56	-	-	-	0.56	-	0.56
16	Turbin Propolar	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Generator	kVA	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00
18	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	-	-	-	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
19	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35;	M1	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
	1x25 mm										

Pengawas

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Material Minggu XVII OK!

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN PERALATAN

KEGIATAN	*PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA*
PEKERJAAN	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak	520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak	: 26 AGUSTUS 2010
Minggu Ke	: **XVII (TUJUH BELAS)**
Tanggal	: *13 Desember 2010*
s/d Tanggal	: 19 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	*Pelaksana*	72	1	1	1	1	1	1	-	78
2	Kepala Tukang	72	1	1	1	1	1	1	-	78
3	Tukang	122	-	-	-	-	-	-	-	122
4	Mandor	62	1	-	-	-	-	-	-	63
5	Pekerja	1,247	1	-	-	-	-	-	-	1,248
6	Logistig	62	1	-	-	-	-	-	-	63
		-								

II PERALATAN

No.	JENIS ALAT	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Cangkul	305	-	-	-	-	-	-		305
2	Sekop	183	-	-	-	-	-	-		183
3	Sendok Semen	305	-	-	-	-	-	-		305
4	Parang	122	-	-	-	-	-	-		122
5	Gergaji	122	-	-	-	-	-	-		122
6	Palu	183	-	-	-	-	-	-		183
7	Waterpass	61	-	-	-	-	-	-		61
8	Pahat	61	-	-	-	-	-	-		61
9	Bor Tangan	61	-	-	-	-	-	-		61
10	*Ketam*	*61*	-	-	-	-	-	-		*61*
11	Gerobak Dorong	488	-	-	-	-	-	-		488
12	Keranjang	305	-	-	-	-	-	-		305

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

KONTRAKTOR :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Tenaga Kerja Dan Perlatan Minggu XVII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Senin
Tanggal : 13 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	-	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	1	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWIS MASRI
Pelaksana

Minggu XVII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Selasa
Tanggal : 14 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x	M1	500.00

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	500.00
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	500.00

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x	M1	500.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	500.00
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	0.50

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	500.00

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Kamis
Tanggal : 16 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	0.50

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

Minggu XVII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Jumat
Tanggal : 17 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Sabtu
Tanggal : 18 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	0.17
4	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : *PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK*
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 AGUSTUS 2010
Hari : Minggu
Tanggal : 19 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		
2	Kepala Tukang	Oh		
3	Tukang	Oh		
4	Mandor	Oh		
5	Pekerja	Oh		
6	*Logistig*	*Oh*		

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	
		Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
	LIBUR		

	Hujan																						
Malam	Baik																						
	Gerimis																						
	Hujan																						

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

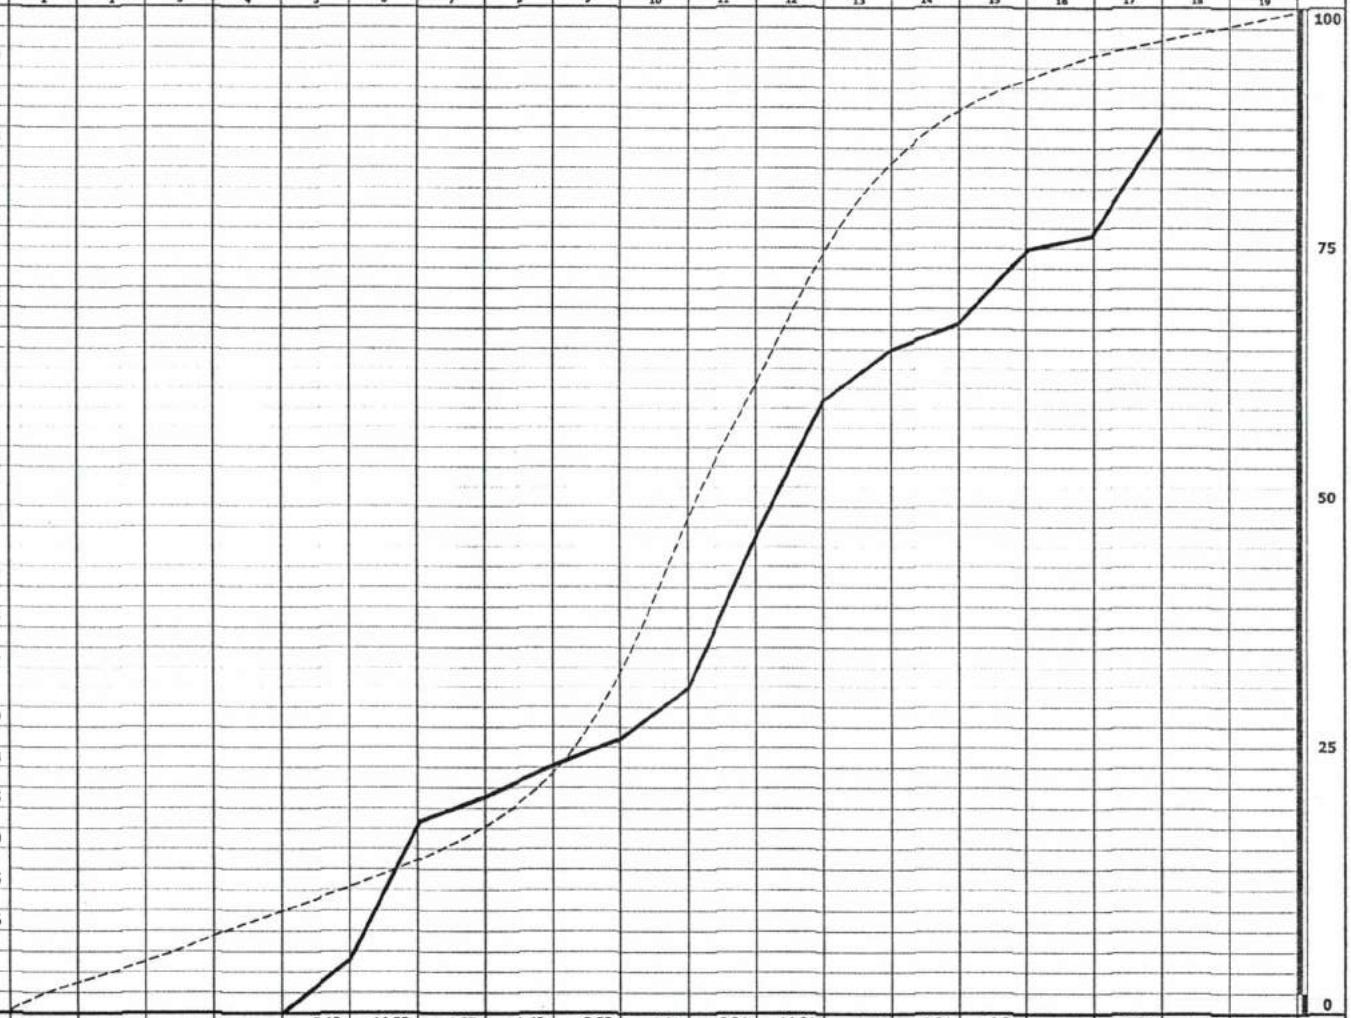
ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVII OK!

" JADWAL PELAKSANAAN "

NAMA KEGIATAN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	KONTRAK No.	: 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR	TANGGAL	: 18 September 2008
		KONTRAK No.	: 540/166/ADD.I/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
KABUPATEN	PASAMAN BARAT	TANGGAL	: 24 Desember 2010
PELAKSANA	CV. ASIS ENGINERIA	Minggu Ke	: XVII (TUJUH BELAS)
		Dari Tanggal	: 13 Desember 2010
		s/d Tanggal	: 19 Desember 2010

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PADA MINGGU KE																		KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RUMAH																				
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.589																			
	PEKERJAAN PONDASI	1.432																			
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	2.478																			
	PEKERJAAN ATAP	0.678																			
	PEKERJAAN LANTAI	0.491																			
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	0.186																			
	PEKERJAAN PIPA PESAT	1.232																			
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG																				
	PEKERJAAN PONDASI	0.837																			
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	0.321																			
	PEKERJAAN LANTAI	0.092																			
	INTEK	3.793																			
	TALI BANDAR	4.073																			
	REHAB SALURAN IRIGASI																				
	PEKERJAAN PONDASI	23.557																			
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	10.214																			
	PEKERJAAN LANTAI	4.864																			
	BAK PENENANG																				
	PEKERJAAN PONDASI	4.920																			
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	6.538																			
	PEKERJAAN LANTAI	0.375																			
	PEKERJAAN PELIMPAH	1.870																			
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK	30.995																			
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING	0.466																			
	RENCANA PER MINGGU		-	-	-	-	5.18	14.58	1.87	1.49	3.52	4.61	16.24	14.21	5.00	1.84	6.04	1.17	11.04	-	13.22	
	KOMULATIF RENCANA		-	-	-	-	5.18	19.75	21.62	23.11	26.63	31.25	47.49	61.70	66.69	68.54	74.57	75.74	86.78	86.78	100.00	
	REALISASI PER MINGGU		-																		
	KOMULATIF REALISASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						



Realisasi ——
Rencana – – –

PPTK	PENGAWAS LAPANGAN	PENGAWAS LAPANGAN	Kontraktor : CV. ASIS ENGINERIA
YEFRISON, ST	MARSUPRIADI, Amd	DIARI FADLI	AFRI K. SALIM
NIP. 19740913 2005 01 1 007	NIP. 19720327 2008 01 1 002	NIP. 19810517 2010 01 1 018	Kuasa Direktur

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke XVIII

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL	:	26 Agustus 2010
NOMOR KONTRAK	:	540/166/ADD.I/KONTRAK/PLTMH/ IX./DPE-2010
TANGGAL	:	24 September 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.400.000,00**

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

Contraktor - Leveransir - Jasa & Teknik

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	No. Kontrak	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK	Tanggal Kontrak	:	26 Agustus 2010
LOKASI	:	KECAMATAN SUNGAI AUR	Minggu Ke	:	XVIII (DELAPAN Belas)
KONTRAKTOR	:	CV. ASIS ENGINERIA	Dari Tanggal	:	20 Desember 2010
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT	s/d Tanggal	:	26 Desember 2010

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
a	b	c	d	e	h	i	j	k	l	m
	RUMAH									
	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	Pembersihan Lapangan	m2	24.00	0.028	24.00	0.028		-	24.00	0.028
	Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.389	1.00	0.389		-	1.00	0.389
	Pek. Papan Bowplank & Pengukuran	Ls	20.00	0.126	20.00	0.126		-	20.00	0.126
	Plank Proyek	Ls	1.00	0.047	1.00	0.047		-	1.00	0.047
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI			-	-	-			-	-
	Galian Tanah Biasa	M3	8.64	0.027	8.64	0.027		-	8.64	0.027
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.96	0.018	0.96	0.018		-	0.96	0.018
	Aanstanpang Batu Kali	M3	1.82	0.053	1.82	0.053		-	1.82	0.053
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	14.17	1.329	14.17	1.329		-	14.17	1.329
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.56	0.004	2.56	0.004		-	2.56	0.004
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-				
	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	0.80	0.516	0.80	0.516		-	0.80	0.516
	Pek. Kolom 13/13	M3	0.19	0.149	0.19	0.149		-	0.19	0.149
	Pek. Reng Balok 20/25	M3	0.80	0.463	0.80	0.463		-	0.80	0.463
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	M3	0.44	0.071	0.44	0.071		-	0.44	0.071
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:4	M3	5.63	0.779	5.63	0.779		-	5.63	0.779
	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	M3	0.08	0.051	0.08	0.051		-	0.08	0.051
	Pek. Memeni Kozen	M2	4.14	0.007	4.14	0.007		-	4.14	0.007
	Plesteran	M2	81.40	0.443	81.40	0.443		-	81.40	0.443
				-	-	-				
	PEKERJAAN ATAP			-	-	-				
	Pek. Pas. Kuda-kuda	M3	0.25	0.103	0.25	0.103		-	0.25	0.103
	Pek. Pas. Gording	M3	0.31	0.001	0.31	0.001		-	0.31	0.001
	Pek. Atap Seng BJLS 20 K	M2	42.00	0.372	42.00	0.372		-	42.00	0.372
	Pek. Pas. Lisplank Papan	M2	6.00	0.112	6.00	0.112		-	6.00	0.112
	Pek. Residu	M1	30.61	0.058	30.61	0.058		-	30.61	0.058
	Pek. Pas. Perabung	M1	7.00	0.012	7.00	0.012		-	7.00	0.012
	Pek. Baut kuda-kuda	Bh	12.00	0.015	12.00	0.015		-	12.00	0.015
	Pek. Pas. Besi Angker Kuda-kuda	Bh	6.00	0.005	6.00	0.005		-	6.00	0.005
				-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	2.98	0.057	2.98	0.057		-	2.98	0.057
	Pek. Cor Lantai Beton 1:3:5	M3	5.07	0.434	5.07	0.434		-	5.07	0.434
				-	-	-				
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-	-	-				
	Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	M3	0.09	0.011	0.09	0.011		-	0.09	0.011
	Pek. Jendela Kaca	M2	0.80	0.032	0.80	0.032		-	0.80	0.032
	Pek. Ventilasi Julasi	M2	2.89	0.101	2.89	0.101		-	2.89	0.101
	Pek. Pas. Engsel Pintu	Bh	6.00	0.008	6.00	0.008		-	6.00	0.008
	Pek. Pas. Grendel Pintu	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	Bh	1.00	0.023	1.00	0.023		-	1.00	0.023
	Pek. Pas. Engsel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kait Angin	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Grendel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	Pek. Hand Vantten	Bh	2.00	0.002	2.00	0.002		-	2.00	0.002
	PEKERJAAN PIPA PESAT			-	-	-				
	Pipa Pesat + Elbow Dia. 650 MM	M1	3.60	1.232	3.60	1.232		-	3.60	1.232
					-	-				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG				-	-				
	PEKERJAAN PONDASI				-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	5.20	0.016	5.20	0.016		-	5.20	0.016
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
	Aanstanpang Batu Kali	M3	3.30	0.096	3.30	0.096		-	3.30	0.096
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6.02	0.703	6.02	0.703		-	6.02	0.703
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	7.20	0.054	7.20	0.054		-	7.20	0.054
	Pek. Balok 25/30	M3	0.45	0.267	0.45	0.267		-	0.45	0.267
				-	-	-				
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	0.90	0.017	0.90	0.017		-	0.90	0.017
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	0.85	0.074	0.85	0.074		-	0.85	0.074
				-	-	-				
	INTEK			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	21.60	0.069	21.60	0.069		-	21.60	0.069
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	1.20	0.023	1.20	0.023		-	1.20	0.023
	Aanstanpang Batu Kali	M3	2.40	0.070	2.40	0.070		-	2.40	0.070
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	7.58	0.885	7.85	0.916		-	7.85	0.916
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	5.85	0.009	5.85	0.009		-	5.85	0.009
	Coran Lantai	M3	0.96	0.082	0.96	0.082		-	0.96	0.082
	Pintu Air dan Pintu Bendung	M2	2.00	2.488	2.00	2.488		-	2.00	2.488
	Plesteran	M2	22.40	0.168	22.40	0.168		-	22.40	0.168
				-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	TALI BANDAR			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	90.00	0.285	90.00	0.285		-	90.00	0.285
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	2.50	0.047	2.50	0.047		-	2.50	0.047
	Aanstanpang Batu Kali	M3	15.00	0.439	15.00	0.439		-	15.00	0.439
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	19.88	2.319	19.88	2.320		-	19.88	2.320
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.004		-	2.70	0.004
	Coran Lantai	M3	4.00	0.342	4.00	0.342		-	4.00	0.342
	Urugan Tanah	M3	22.88	0.035	22.88	-			22.88	-
	Plesteran	M2	80.00	0.601	80.00	0.601		-	80.00	0.601
					-	-			-	-
	REHAB SALURAN IRIGASI				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	663.30	2.104	663.30	2.104		-	663.30	2.104
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	-	-						
	Aanstanpang Batu Kali	M3	28.56	0.835	28.56	0.835		-	28.56	0.835
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M3	176.14	20.556	176.14	20.556		-	176.14	20.556
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	41.28	0.062	41.28	0.062		-	41.28	0.062
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	559.20	4.200	559.20	4.200		-	559.20	4.200
	Pek. Saluran Gantung	M3	10.40	6.014	10.40	6.014		-	10.40	6.014
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	-	-	-	-			-	-
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	55.53	4.864	55.53	4.864		-	55.53	4.864
					-	-			-	-
	BAK PENENANG				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	-	-	-	-			-	-
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	11.71	0.222	11.71	0.222		-	11.71	0.222
	Aanstanpang Batu Kali	M3	13.63	0.398	13.63	0.398		-	13.63	0.398
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	36.84	4.299	36.84	4.299		-	36.84	4.299
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3		-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	96.20	0.722	96.20	0.722		-	96.20	0.722
	Pek. Balok 25/30	M3	7.96	4.604	7.96	4.604		-	7.96	4.604
	Pek. Plat	M3	0.32	0.210	0.32	0.210		-	0.32	0.210
	Pek. Pas. Saringan	Ls	2.00	0.768	2.00	0.768		-	2.00	0.768
	Pintu Air	Ls	1.00	0.233	1.00	0.233		-	1.00	0.233
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.81	0.034	1.81	0.034		-	1.81	0.034
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	3.89	0.340	3.89	0.340		-	3.89	0.340
				-	-	-			-	-

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut MC.0			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN PELIMPAH			-	-	-			-	-
	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.91	0.025	1.91	0.025		-	1.91	0.025
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.28	0.024	1.28	0.024		-	1.28	0.024
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	M3	17.68	1.658	17.68	1.658		-	17.68	1.658
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	1.85	0.162	1.85	0.162		-	1.85	0.162
					-	-				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK				-	-				
	Turbin Propolar	Unit	1.00	13.217	-	-	-	-	-	-
	GeneratorAC Phasa 35 Kva + Balast Load	Ls	1.00	5.726	1.00	5.726		-	1.00	5.726
	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00	4.665	1.00	4.665		-	1.00	4.665
	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	1.00	1.166	1.00	1.166		-	1.00	1.166
	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	1,000.00	6.220	1,000.00	6.220	-	-	1,000.00	6.220
				-	-	-				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING			-	-	-				
	Pelatihan Operator	Org	2.00	0.311	2.00	0.311	-	-	2.00	0.311
	Tool Kit	Ls	1.00	0.155	1.00	0.155	-	-	1.00	0.155
	Jumlah			100.00		86.78	-	-		86.78

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH,
PPTK

YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

LAPORAN MINGGUAN MATERIAL

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak : 520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Minggu Ke : **XVIII (DELAPAN Belas)**
Tanggal : 20 Desember 2010
s/d Tanggal : 26 Desember 2010

No.	JENIS BAHAN	STN	JUMLAH MATERIAL								
			S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
			DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI
1	Pasir	M3	258.83	-	258.83	-	-	-	258.83	-	258.83
2	Semen	M3	1,868.60	-	1,868.60	-	-	-	1,868.60	-	1,868.60
3	Batu	M3	405.77	-	405.77	-	-	-	405.77	-	405.77
4	Kerikil	M3	87.45	-	87.45	-	-	-	87.45	-	87.45
5	Besi	Kg	1,475.37	-	1,475.37	-	-	-	1,475.37	-	1,475.37
6	Batu Bata	Bh	3,035.00	-	3,035.00	-	-	-	3,035.00	-	3,035.00
7	Kayu Banio	M3	0.31	-	0.31	-	-	-	0.31	-	0.31
8	Meni	Kg	9.94	-	9.94	-	-	-	9.94	-	9.94
9	Kayu Marsawa	M3	0.42	-	0.42	-	-	-	0.42	-	0.42
10	Atap	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Paku	Kg	0.63	-	0.63	-	-	-	0.63	-	0.63
12	Residu	Ltr	10.71	-	10.71	-	-	-	10.71	-	10.71
13	Seng Plat	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Papan Banio	M3	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0.56	-	0.56	-	-	-	0.56	-	0.56
16	Turbin Propolar	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Generator	Ls	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00
18	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	1.00	-	1.00		-	-	1.00	-	1.00
19	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35; 1x25 mm	M1	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

Pengawas	Pengawas	Kontraktor : CV. ASIS ENGINERIA
MARSUPRIADI, Amd	DIARI FADLI	ELWA MASRI
NIP. 19720327 2008 01 1 002	NIP. 19810517 2010 01 1 018	Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN PERALATAN

KEGIATAN	*PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA*
PEKERJAAN	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak	520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak	: 26 Agustus 2010
Minggu Ke	: **XVIII (DELAPAN Belas)**
Tanggal	: *20 Desember 2010*
s/d Tanggal	: 26 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	*Pelaksana*	*78*	-	-	-	-	-	-	-	*78*
2	Kepala Tukang	78	-	-	-	-	-	-	-	78
3	Tukang	124	-	-	-	-	-	-	-	124
4	Mandor	63	-	-	-	-	-	-	-	63
5	Pekerja	1,252	-	-	-	-	-	-	-	1,252
6	Logistig	63	-	-	-	-	-	-	-	63
		-								

II PERALATAN

No.	JENIS ALAT	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Cangkul	311	-	-	-	-	-	-		311
2	Sekop	186	-	-	-	-	-	-		186
3	Sendok Semen	312	-	-	-	-	-	-		312
4	Parang	124	-	-	-	-	-	-		124
5	Gergaji	126	-	-	-	-	-	-		126
6	Palu	189	-	-	-	-	-	-		189
7	Waterpass	63	-	-	-	-	-	-		63
8	Pahat	63	-	-	-	-	-	-		63
9	Bor Tangan	62	-	-	-	-	-	-		62
10	*Ketam*	*62*	-	-	-	-	-	-		*62*
11	Gerobak Dorong	496	-	-	-	-	-	-		496
12	Keranjang	315	-	-	-	-	-	-		315

Pengawas,	Pengawas,	KONTRAKTOR :
		CV. ASIS ENGINERIA
MARSUPRIADI, Amd	**DIARI FADLI**	**ELWA YASRI**
NIP. 19720327 2008 01 1 002	NIP. 19810517 2010 01 1 018	Pelaksana

Tenaga Kerja Dan Perlatan Minggu XVIII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		-
2	Kepala Tukang	Oh		-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA HASRI
Pelaksana

Minggu XVIII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Selasa
Tanggal : 21 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		-
2	Kepala Tukang	Oh		-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol El	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVIII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Rabu
Tanggal : 22 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		-
2	Kepala Tukang	Oh		-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	
13	Alat Bantu	Ls	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

Minggu XVIII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		-
2	Kepala Tukang	Oh		-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVIII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		-
2	Kepala Tukang	Oh		-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XVIII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Sabtu
Tanggal : 25 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		-
2	Kepala Tukang	Oh		-
3	Tukang	Oh		-
4	Mandor	Oh		-
5	Pekerja	Oh		-
6	Logistig	Oh		-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol El	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	-
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

Minggu XVIII OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : *PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK*
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Minggu
Tanggal : 26 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh		
2	Kepala Tukang	Oh		
3	Tukang	Oh		
4	Mandor	Oh		
5	Pekerja	Oh		
6	*Logistig*	*Oh*		

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	*Sendok Semen*	*Unit*	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	
		Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
	LIBUR		

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

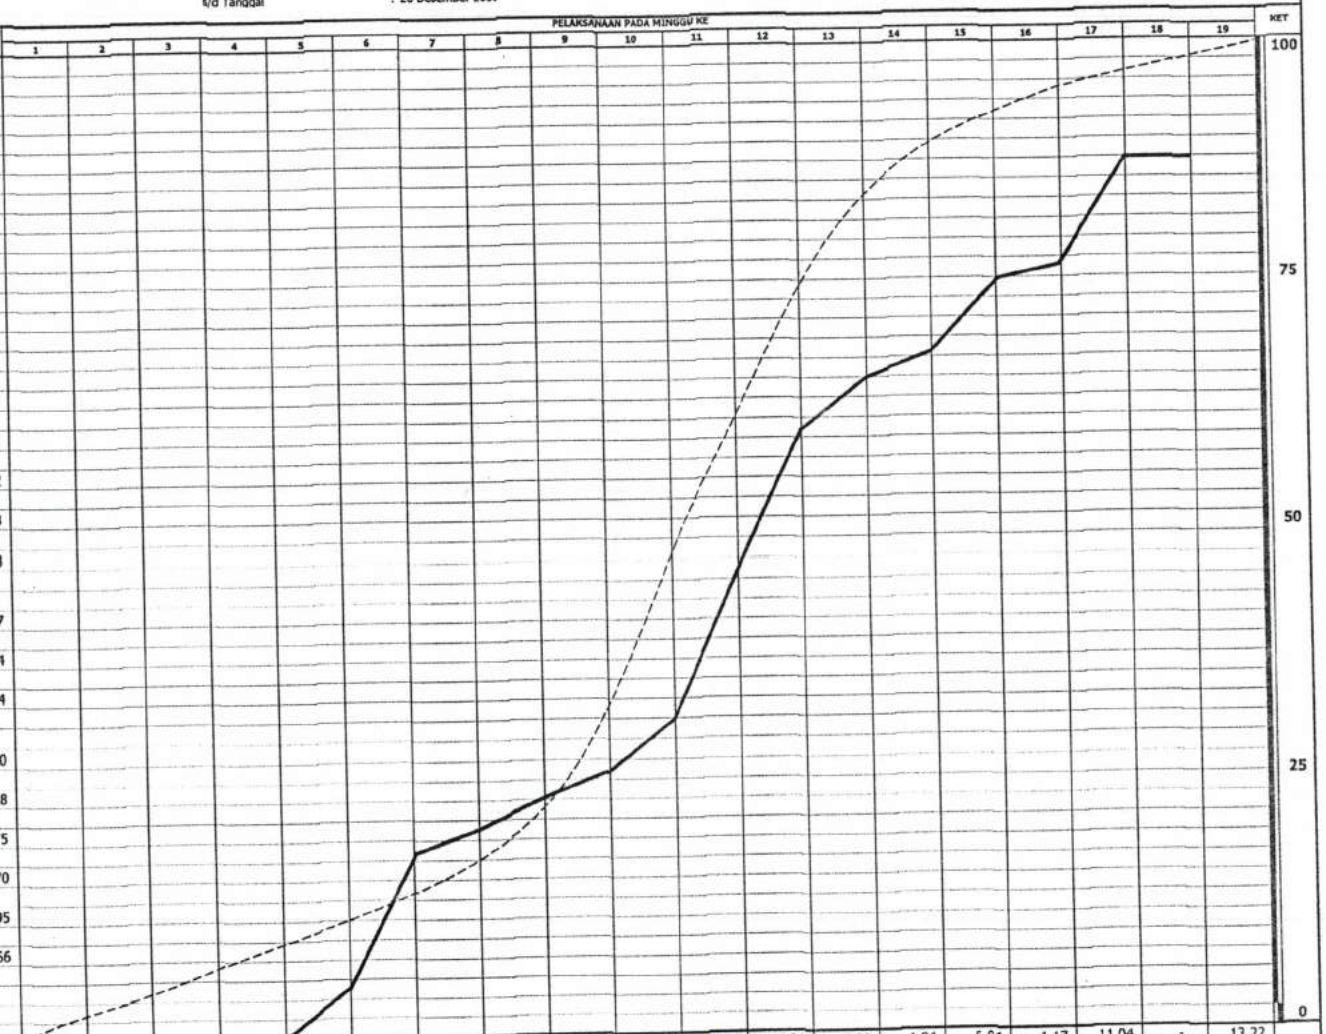
" JADWAL PELAKSANAAN "

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR

KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PELAKSANA : CV. ASIS ENGINERIA

KONTRAK No. : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL : 18 September 2008
KONTRAK No. : 540/166/ADD.I/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL : 24 Desember 2010
Minggu Ke : XVIII (DELAPAN BELAS)
Dari Tanggal : 20 Desember 2010
s/d Tanggal : 26 Desember 2010

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PADA MINGGU KE																		KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RUMAH																					
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.589																				
	PEKERJAAN PONDASI	1.432																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	2.478																				
	PEKERJAAN ATAP	0.678																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.491																				
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	0.186																				
	PEKERJAAN PIPA PESAT	1.232																				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG																					
	PEKERJAAN PONDASI	0.837																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	0.321																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.092																				
	INTEK	3.793																				
	TALI BANDAR	4.073																				
	REHAB SALURAN IRIGASI																					
	PEKERJAAN PONDASI	23.557																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	10.214																				
	PEKERJAAN LANTAI	4.864																				
	BAK PENENANG																					
	PEKERJAAN PONDASI	4.920																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	6.538																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.375																				
	PEKERJAAN PELIMPAH	1.870																				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK	30.995																				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING	0.466																				
	RENCANA PER MINGGU		-	-	-	-	5.18	14.58	1.87	1.49	3.52	4.61	16.24	14.21	5.00	1.84	6.04	1.17	11.04	-	13.22	
	KOMULATIF RENCANA		-	-	-	-	5.18	19.75	21.62	23.11	26.63	31.25	47.49	61.70	66.69	68.54	74.57	75.74	86.78	86.78	100.00	
	REALISASI PER MINGGU		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KOMULATIF REALISASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Realisasi ——
Rencana – – –

PPTK

YE ON, ST

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd

PENGAWAS LAPANGAN

DIARI FADLI

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI M. SALIM
Kuasa Direktur

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke XIX

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL	:	26 Agustus 2010
NOMOR KONTRAK	:	*540/166/ADD.I/KONTRAK/PLTMH/ IX /DPE-2010*
TANGGAL	:	21 September 2010
NILAI KONTRAK	:	***707.400.000,00***

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

Contraktor - Leveransir - Jasa & Teknik

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	No. Kontrak	: 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK	Tanggal Kontrak	: 26 Agustus 2010
LOKASI	:	KECAMATAN SUNGAI AUR	Minggu Ke	: XIX (SEMBILAN BELAS)
KONTRAKTOR	:	CV. ASIS ENGINERIA	Dari Tanggal	: 27 Desember 2010
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT	s/d Tanggal	: 30 Desember 2010

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
a	b	c	d	e	h	i	j	k	l	m
	RUMAH									
	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	Pembersihan Lapangan	m2	24.00	0.028	24.00	0.03		-	24.00	0.028
	Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0.389	1.00	0.39		-	1.00	0.389
	Pek. Papan Bowplank & Pengukuran	Ls	20.00	0.126	20.00	0.13		-	20.00	0.126
	Plank Proyek	Ls	1.00	0.047	1.00	0.05		-	1.00	0.047
				-	-	-				
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI			-	-	-			-	-
	Galian Tanah Biasa	M3	8.64	0.027	8.64	0.03		-	8.64	0.027
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.96	0.018	0.96	0.02		-	0.96	0.018
	Aanstanpang Batu Kali	M3	1.82	0.053	1.82	0.05		-	1.82	0.053
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	14.17	1.329	14.17	1.33		-	14.17	1.329
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.56	0.004	2.56	0.00		-	2.56	0.004
				-	-	-				
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-				
	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M3	0.80	0.516	0.80	0.52		-	0.80	0.516
	Pek. Kolom 13/13	M3	0.19	0.149	0.19	0.15		-	0.19	0.149
	Pek. Reng Balok 20/25	M3	0.80	0.463	0.80	0.46		-	0.80	0.463
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	M3	0.44	0.071	0.44	0.07		-	0.44	0.071
	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:4	M3	5.63	0.779	5.63	0.78		-	5.63	0.779
	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	M3	0.08	0.051	0.08	0.05		-	0.08	0.051
	Pek. Memeni Kozen	M2	4.14	0.007	4.14	0.01		-	4.14	0.007
	Plesteran	M2	81.40	0.443	81.40	0.44		-	81.40	0.443
				-	-	-				
	PEKERJAAN ATAP			-	-	-				
	Pek. Pas. Kuda-kuda	M3	0.25	0.103	0.25	0.10		-	0.25	0.103
	Pek. Pas. Gording	M3	0.31	0.001	0.31	0.00		-	0.31	0.001
	Pek. Atap Seng BJLS 20 K	M2	42.00	0.372	42.00	0.37		-	42.00	0.372
	Pek. Pas. Lisplank Papan	M2	6.00	0.112	6.00	0.11		-	6.00	0.112
	Pek. Residu	M1	30.61	0.058	30.61	0.06		-	30.61	0.058
	Pek. Pas. Perabung	M1	7.00	0.012	7.00	0.01		-	7.00	0.012
	Pek. Baut kuda-kuda	Bh	12.00	0.015	12.00	0.01		-	12.00	0.015
	Pek. Pas. Besi Angker Kuda-kuda	Bh	6.00	0.005	6.00	0.00		-	6.00	0.005
				-	-	-				
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	2.98	0.057	2.98	0.06		-	2.98	0.057
	Pek. Cor Lantai Beton 1:3:5	M3	5.07	0.434	5.07	0.43		-	5.07	0.434
				-	-	-				

Nomor	Uraian Pekerjaan	Satuan	Menurut Kontrak		Prestasi Pekerjaan					
			Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			-	-	-				
	Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	M3	0.09	0.011	0.09	0.01		-	0.09	0.011
	Pek. Jendela Kaca	M2	0.80	0.032	0.80	0.03		-	0.80	0.032
	Pek. Ventilasi Julasi	M2	2.89	0.101	2.89	0.10		-	2.89	0.101
	Pek. Pas. Engsel Pintu	Bh	6.00	0.008	6.00	0.01		-	6.00	0.008
	Pek. Pas. Grendel Pintu	Bh	2.00	0.002	2.00	0.00		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	Bh	1.00	0.023	1.00	0.02		-	1.00	0.023
	Pek. Pas. Engsel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.00		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Kait Angin	Bh	2.00	0.002	2.00	0.00		-	2.00	0.002
	Pek. Pas. Grendel Jendela	Bh	2.00	0.002	2.00	0.00		-	2.00	0.002
	Pek. Hand Vantten	Bh	2.00	0.002	2.00	0.00		-	2.00	0.002
	PEKERJAAN PIPA PESAT			-	-	-				
	Pipa Pesat + Elbow Dia. 650 MM	M1	3.60	1.232	3.60	1.23		-	3.60	1.232
					-	-				
					-	-				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG				-	-				
	PEKERJAAN PONDASI				-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	5.20	0.016	5.20	0.02		-	5.20	0.016
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	0.90	0.017	0.90	0.02		-	0.90	0.017
	Aanstanpang Batu Kali	M3	3.30	0.096	3.30	0.10		-	3.30	0.096
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6.02	0.703	6.02	0.70		-	6.02	0.703
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.00		-	2.70	0.004
				-	-	-				
				-	-	-				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	7.20	0.054	7.20	0.05		-	7.20	0.054
	Pek. Balok 25/30	M3	0.45	0.267	0.45	0.27		-	0.45	0.267
				-	-	-				
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-				
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	0.90	0.017	0.90	0.02		-	0.90	0.017
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	0.85	0.074	0.85	0.07		-	0.85	0.074
				-	-	-				
	INTEK			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	21.60	0.069	21.60	0.07		-	21.60	0.069
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	1.20	0.023	1.20	0.02		-	1.20	0.023
	Aanstanpang Batu Kali	M3	2.40	0.070	2.40	0.07		-	2.40	0.070
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	7.58	0.885	7.85	0.92		-	7.85	0.916
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	5.85	0.009	5.85	0.01		-	5.85	0.009
	Coran Lantai	M3	0.96	0.082	0.96	0.08		-	0.96	0.082
	Pintu Air dan Pintu Bendung	M2	2.00	2.488	2.00	2.49		-	2.00	2.488
	Plesteran	M2	22.40	0.168	22.40	0.17		-	22.40	0.168
				-	-	-				
	TALI BANDAR			-	-	-				
	Galian Tanah Pondasi	M3	90.00	0.285	90.00	0.29		-	90.00	0.285
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	2.50	0.047	2.50	0.05		-	2.50	0.047
	Aanstanpang Batu Kali	M3	15.00	0.439	15.00	0.44		-	15.00	0.439
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	19.88	2.319	19.88	2.32		-	19.88	2.320
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	2.70	0.004	2.70	0.00		-	2.70	0.004
	Coran Lantai	M3	4.00	0.342	4.00	0.34		-	4.00	0.342
	Urugan Tanah	M3	22.88	0.035	22.88	-			22.88	-
	Plesteran	M2	80.00	0.601	80.00	0.60		-	80.00	0.601
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	REHAB SALURAN IRIGASI				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	663.30	2.104	663.30	2.10		-	663.30	2.104
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	-	-	-	-				
	Aanstanpang Batu Kali	M3	28.56	0.835	28.56	0.83		-	28.56	0.835
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M3	176.14	20.556	176.14	20.56		-	176.14	20.556
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	41.28	0.062	41.28	0.06		-	41.28	0.062
				-	-	-			-	-

Nomor	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak			Prestasi Pekerjaan					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini (komulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	559.20	4.200	559.20	4.20		-	559.20	4.200
	Pek. Saluran Gantung	M3	10.40	6.014	10.40	6.01		-	10.40	6.014
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	-	-	-	-			-	-
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	55.53	4.864	55.53	4.86		-	55.53	4.864
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	BAK PENENANG				-	-			-	-
	PEKERJAAN PONDASI				-	-			-	-
	Galian Tanah Pondasi	M3	-	-	-	-			-	-
	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	11.71	0.222	11.71	0.22		-	11.71	0.222
	Aanstanpang Batu Kali	M3	13.63	0.398	13.63	0.40		-	13.63	0.398
	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	36.84	4.299	36.84	4.30		-	36.84	4.299
	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3		-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			-	-	-			-	-
	Plesteran Dinding 1:2	M2	96.20	0.722	96.20	0.72		-	96.20	0.722
	Pek. Balok 25/30	M3	7.96	4.604	7.96	4.60		-	7.96	4.604
	Pek. Plat	M3	0.32	0.210	0.32	0.21		-	0.32	0.210
	Pek. Pas. Saringan	Ls	2.00	0.768	2.00	0.77		-	2.00	0.768
	Pintu Air	Ls	1.00	0.233	1.00	0.23		-	1.00	0.233
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN LANTAI			-	-	-			-	-
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.81	0.034	1.81	0.03		-	1.81	0.034
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	3.89	0.340	3.89	0.34		-	3.89	0.340
				-	-	-			-	-
	PEKERJAAN PELIMPAH			-	-	-			-	-
	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	1.91	0.025	1.91	0.03		-	1.91	0.025
	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	1.28	0.024	1.28	0.02		-	1.28	0.024
	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	M3	17.68	1.658	17.68	1.66		-	17.68	1.658
	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	1.85	0.162	1.85	0.16		-	1.85	0.162
					-	-				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK				-	-				
	Turbin Propolar	Unit	1.00	13.217	-	-	1.00	13.217	1.00	13.217
	Generator	kVA	1.00	5.726	1.00	5.73	-	-	1.00	5.726
	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	1.00	4.665	1.00	4.66	-	-	1.00	4.665
	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	1.00	1.166	1.00	1.17	-	-	1.00	1.166
	Pengadaan Kabel Tulstad 4x35	M1	1,000.00	6.220	1,000.00	6.22		-	1,000.00	6.220
				-	-	-				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING			-	-	-				
	Pelatihan Operator	Org	2.00	0.311	2.00	0.31	-	-	2.00	0.311
	Tool Kit	Ls	1.00	0.155	1.00	0.16	-	-	1.00	0.155
	Jumlah			100.00		86.78	-	13.22		100.00

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH,
PPTK

YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERA

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

LAPORAN MINGGUAN MATERIAL

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak : 520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Minggu Ke : **XIX (SEMBILAN BELAS)**
Tanggal : 27 Desember 2010
s/d Tanggal : 30 Desember 2010

No.	JENIS BAHAN	STN	JUMLAH MATERIAL								
			S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
			DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI
1	Pasir	M3	258.83	-	258.83		-	-	258.83	-	258.83
2	Semen	M3	1,868.60	-	1,868.60		-	-	1,868.60	-	1,868.60
3	Batu	M3	405.77	-	405.77		-	-	405.77	-	405.77
4	Kerikil	M3	87.45	-	87.45		-	-	87.45	-	87.45
5	Besi	Kg	1,475.37	-	1,475.37	-	-	-	1,475.37	-	1,475.37
6	Batu Bata	Bh	3,035.00	-	3,035.00	-	-	-	3,035.00	-	3,035.00
7	Kayu Banio	M3	0.31	-	0.31	-	-	-	0.31	-	0.31
8	Meni	Kg	9.94	-	9.94	-	-	-	9.94	-	9.94
9	Kayu Marsawa	M3	0.42	-	0.42	-	-	-	0.42	-	0.42
10	Atap	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Paku	Kg	0.63	-	0.63	-	-	-	0.63	-	0.63
12	Residu	Ltr	10.71	-	10.71	-	-	-	10.71	-	10.71
13	Seng Plat	Lbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Papan Banio	M3	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
15	Kaca Tebal 5 mm	M2	0.56	-	0.56	-	-	-	0.56	-	0.56
16	Turbin Propolar	Unit	-	-	-	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
17	Generator	Ls	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00
18	Switchgear/ Panel Kontrol	Unit	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00
19	Pengadaan Kabel Tuisted 3x35;	M1	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
	1x25 mm										

Pengawas

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA NASRI
Pelaksana

Material Minggu XIX OK!

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN PERALATAN

KEGIATAN	*PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA*
PEKERJAAN	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI	KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN	PASAMAN BARAT
Nomor Kontrak	520/178/SPK/FISIK-KONS/ 2008
Tanggal Kontrak	: 26 Agustus 2010
Minggu Ke	: **XIX (SEMBILAN BELAS)**
Tanggal	: *27 Desember 2010*
s/d Tanggal	: 30 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	*Pelaksana*	*78*	*1*	*1*	*1*	*1*				*82*
2	Kepala Tukang	78	1	1	1	1				82
3	Tukang	122	-	-	-	-				122
4	Mandor	63	1	1	1	1				67
5	Pekerja	1,248	2	2	2	2				1,256
6	Logistig	63	1	1	1	1				67
		-								

II PERALATAN

No.	JENIS ALAT	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Cangkul	305	-	-	-	-				305
2	Sekop	183	-	-	-	-				183
3	Sendok Semen	305	-	-	-	-				305
4	Parang	122	-	-	-	-				122
5	Gergaji	122	-	-	-	-				122
6	Palu	183	-	-	-	-				183
7	Waterpass	61	-	-	-	-				61
8	Pahat	61	-	-	-	-				61
9	Bor Tangan	61	-	-	-	-				61
10	*Ketam*	*61*	-	-	-	-				*61*
11	Gerobak Dorong	488	-	-	-	-				488
12	Keranjang	305	-	-	-	-				305

Pengawas,	Pengawas,	KONTRAKTOR : **CV. ASIS ENGINERIA**
MARSUPRIADI, Amd	**DIARI FADLI**	**ELWA MASRI**
NIP. 19720327 2008 01 1 002	NIP. 19810517 2010 01 1 018	Pelaksana

Tenaga Kerja Dan Perlatan Minggu XIX OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Senin
Tanggal : 27 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	-
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	-	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	2	-
6	Logistig	Oh	1	-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XIX OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	-	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	2	-
6	Logistig	Oh	1	-
				-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	0.16
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	
3	*Switchgear/ Panel Kontrol El*	*Unit*	
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	*Cangkul*	*Unit*	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	*Ketam*	*Unit*	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	-
3	*Switchgear/ Panel Kontrol ELC*	*Unit*	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	*Baik*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XIX OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Rabu
Tanggal : 29 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	-	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	2	-
6	Logistig	Oh	1	-
				-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	-
4	*Pengadaan Kabel Tuisted 4x*	*M1*	-
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	*Pengadaan Kabel Tuisted 4x35*	*M1*	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XIX OK!

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
No. Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
Tanggal Kontrak : 26 Agustus 2010
Hari : Kamis
Tanggal : 30 Desember 2010

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Oh	1	
2	Kepala Tukang	Oh	1	-
3	Tukang	Oh	-	-
4	Mandor	Oh	1	-
5	Pekerja	Oh	2	-
6	Logistig	Oh	1	-
				-

II BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol EL	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x	M1	-

III PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1	Cangkul	Unit	
2	Sekop	Unit	
3	Sendok Semen	Unit	
4	Parang	Unit	
5	Gergaji	Unit	
6	Palu	Unit	
7	Waterpass	Unit	
8	Pahat	Unit	
9	Bor Tangan	Unit	
10	Ketam	Unit	
11	Grobak Dorong	Unit	
12	Keranjang	Unit	

IV PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	
4	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	
5	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	
6	Pelatihan Operator	Org	
7	Tool Kit	Ls	

V PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	VOLUME
1	Turbin Propolar	Unit	0.25
2	Generator	kVA	-
3	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	-
4	Pengadaan Kabel Tuisted 4x35	M1	-

VI CURAH HUJAN

	JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Gerimis													
	Hujan													
Malam	Baik													
	Gerimis													
	Hujan													

B = Baik G = Gerimis H = Hujan

PENGAWAS LAPANGAN

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA

ELWA MASRI
Pelaksana

Minggu XIX OK!

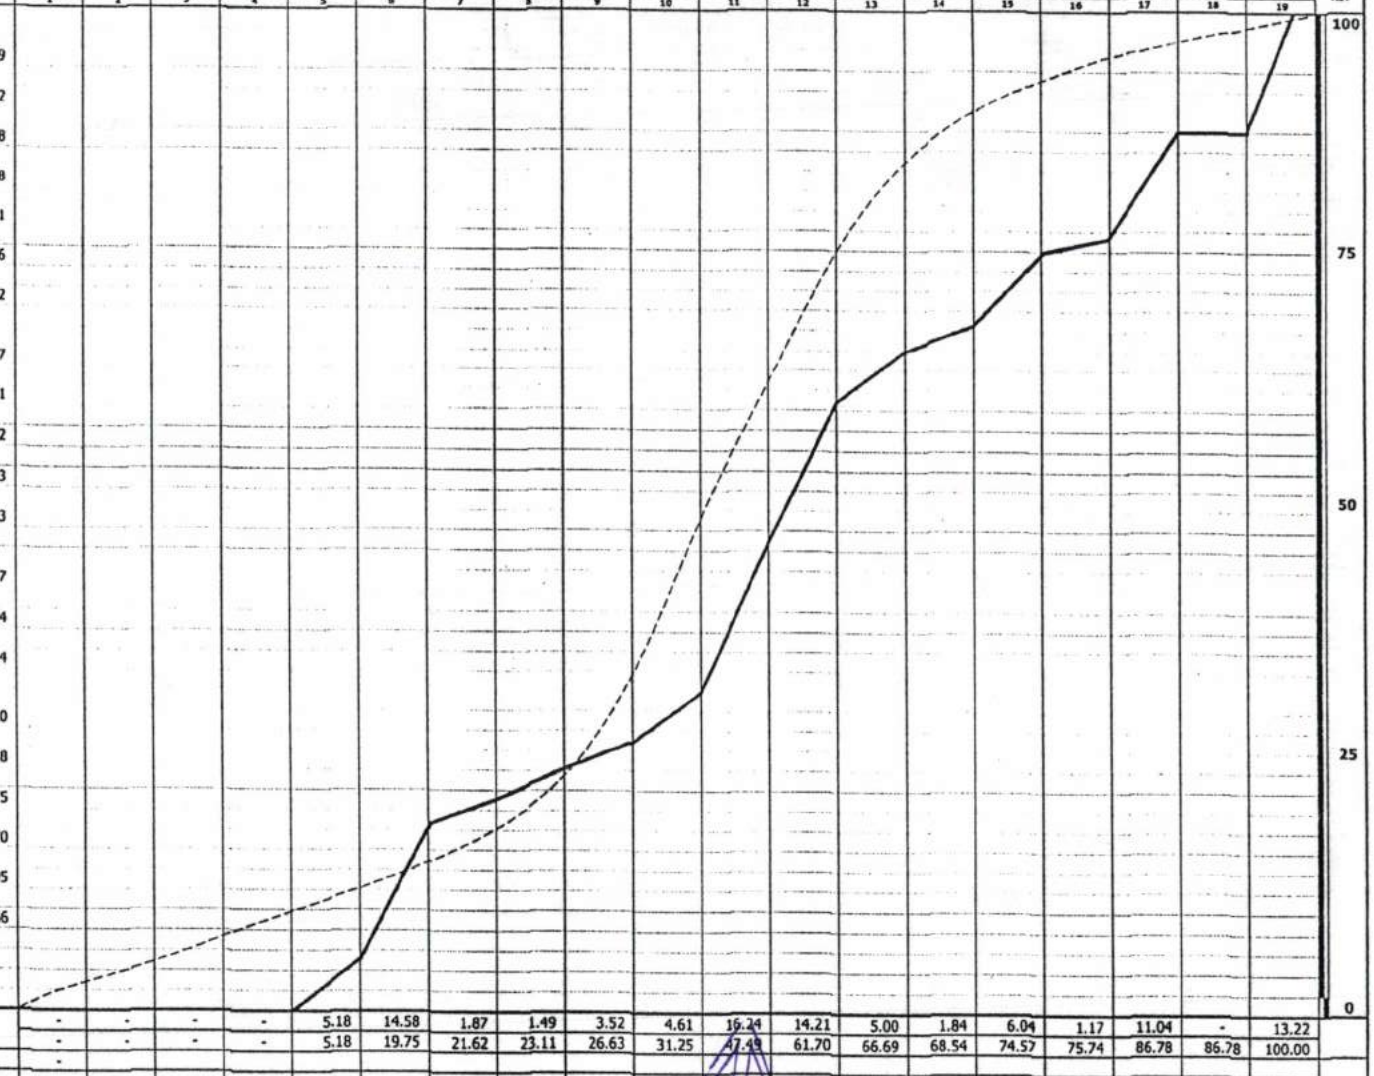
" JADWAL PELAKSANAAN "

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI AUR

KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PELAKSANA : CV. ASIS ENGINERIA

KONTRAK No. : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL : 18 September 2010
KONTRAK No. : 540/166/ADD.1/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL : 24 Desember 2010
Minggu Ke : XIX (SEMBILAN BELAS)
Dari Tanggal : 27 Desember 2010
S/d Tanggal : 30 Desember 2010

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PADA MINGGU KE																			KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RUMAH																					
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.589																				
	PEKERJAAN PONDASI	1.432																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	2.478																				
	PEKERJAAN ATAP	0.678																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.491																				
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	0.186																				
	PEKERJAAN PIPA PESAT	1.232																				
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG																					
	PEKERJAAN PONDASI	0.837																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	0.321																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.092																				
	INTEK	3.793																				
	TALI BANDAR	4.073																				
	REHAB SALURAN IRIGASI																					
	PEKERJAAN PONDASI	23.557																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	10.214																				
	PEKERJAAN LANTAI	4.864																				
	BAK PENENANG																					
	PEKERJAAN PONDASI	4.920																				
	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	6.538																				
	PEKERJAAN LANTAI	0.375																				
	PEKERJAAN PELIMPAH	1.870																				
	PERALATAN ELEKTRIKAL -MEKANIK	30.995																				
	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING	0.466																				
	RENCANA PER MINGGU		-	-	-	-	5.18	14.58	1.87	1.49	3.52	4.61	16.24	14.21	5.00	1.84	6.04	1.17	11.04	-	13.22	
	KOMULATIF RENCANA		-	-	-	-	5.18	19.75	21.62	23.11	26.63	31.25	47.49	61.70	66.69	68.54	74.57	75.74	86.78	86.78	100.00	
	REALISASI PER MINGGU		-																			
	KOMULATIF REALISASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							



Realisasi ——
Rencana – – –

PPTK
YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

PENGAWAS LAPANGAN
MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

PENGAWAS LAPANGAN
DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Kontraktor :
CV. ASIS ENGINERIA
AFRI H. SALIM
Kepala Direktur

ASIS ENGINERIA

JADWAL PELAKSANAAN KURVA S PLTMH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
TAHUN 2010
Jln. Simpang Empat – KP. Cubadak Pasaman Barat

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

TANGGAL 27 DESEMBER 2010

KONTRAK NOMOR : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010,TGL 26 AGUSTUS 2010
ADD.I NOMOR : 540/166.a/ADD-KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,TGL 17 DES 2010

KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN
PEMBANGUNAN I (SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO

NILAI KONTRAK

Rp. 707.400.000.00

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA
PADANG

TAHUN ANGGARAN 2010

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
TAHUN ANGGARAN 2010
JALAN SIMPANG EMPAT KP. CUBADAK PASAMAN BARAT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN SEMENTARA
" PHO " (PROVISIONAL HAND OVER)

KEGIATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
PEKERJAAN
Pembangunan I (Satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Nomor 540/166/132.PHO/KONTRAK/PLTMH/VII/DPE-2010

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/ : IR. M. NAZLI,M.T
   Nip : 19630320 199003 1 004
   Jabatan : Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrikan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lokasi Kec. Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang kami laksanakan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VII/DPE-2010, Tgl 26 Agustus 2010 dan ADD.I Nomor :540/166.a/ADD-KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,Tgl 17 Desember 2010.dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **PIHAK I (KESATU)**

   Alamat : Simpang Empat Pasaman Barat

2. Nama : AFRI K. SALIM
   Jabatan : Kuasa Direktur **CV. ASIS ENGINERIA** Selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**
   Alamat : **Simpang Empat**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Sementara " **PHO** " (Provisional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrikan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lokasi Kec. Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang kami laksanakan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VII/DPE-2010, Tgl 26 Agustus 2010 dan ADD.I Nomor :540/166.a/ADD-KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,Tgl 17 Desember 2010 Sesuaikan dengan Kontrak , sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrikan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lokasi Kec. Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang kami laksanakan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VII/DPE-2010, Tgl 26 Agustus 2010 dan ADD.I Nomor :540/166.a/ADD-KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,Tgl 17 Desember 2010. yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka **PIHAK I (KESATU)** menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh **PIHAK II (KEDUA)**.

Pasal 2

PIHAK II (KEDUA) melakukan penyerahan kepada PIHAK I (KESATU).dan PIHAK I (KESATU).menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK II (KEDUA) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrikan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lokasi Kec. Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang kami laksanakan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VII/DPE-2010, Tgl 26 Agustus 2010 dan ADD.I Nomor :540/166.a/ADD-KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,Tgl 17 Desember 2010.

Pasal 3

1. Semua kerusakan-kerusakan serta kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan akan diperbaiki selama waktu pemeliharaan dengan jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender
2. Masa Pemeliharaan pada Pasal 3 Ayat 1 dihitung sejak tanggal Serah teriama Pertama (PHO)
3. Masa Pemeliharaan dihitung mulai Tanggal : 27 Desember 2010 s/d 26 Juni 2011

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat Tanggal tersebut diatas

PIHAK II (KEDUA).	**PIHAK I (KESATU)**
CV.ASIS ENGINERIA	PENGGUNA ANGGRAN (PA)
ASIS ENGINERIA	
ARIF K SALIM	**Ir. M. NAZLI,M.T**
Kuasa Direktur	NIP. 19630320 199003 1 004

LAMPIRAN : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PHO

Kegiatan : PEMBANGUNAN I (SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO

Pekerjaan : PEMBANGUNAN I (SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO

No/Tgl Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010,TL 26 AGUS 2010
:ADD.NOMOR 166.a/ADD.KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,TGL 17 DES 2010

Lokasi : KEC. SUNGAI AUR

Pelaksana : CV. ASIS ENGINERIA

NO	URAIAN PEKERJAAN	KEKURANGAN PEKERJAAN	PENANGANAN	TANGGAPAN KONTRAKTOR
1	Pekerjaan saluran.	- Sempurnakan lantai saluran dan finishing bak. penenang.	Sempurnakan.	1 Segera kami laksanakan.
2				
3		- Sempurnakan galian saluran bronjong sesuai dg ukuran.	Sesuai kan.	2 Segera kami laksanakan.
4				
5				

Simpang Empat, Desember 2010

TIM PHO DAN FHO

PELAKSANA
CV. ASIS ENGINERIA

ASIS ENGINERIA

AFRI K SALIM
Kuasa Direktur

KETUA

ABUSMAR,ST
19560817 199301 1001

SEKRETARIS

ZULFAMI, SH
NIP. 110 048 100

PANITIA SERAH TERIMA PERTAMA PHO (PROVISIONAL HAND OVER)
SERAH TERIMA AKHIR " FHO " (FINAL HAND OVER)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
TIM SERAH TERIMA PERTAMA PHO (PROVISIONAL HAND OVER)

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh, Kami Tim Serah terima Sementara " PHO " (Provisional Hand Over) telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrikan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lokasi Kec. Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang kami laksanakan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VII/DPE-2010, Tgl 26 Agustus 2010 dan ADD.I Nomor :540/166.a/ADD-KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,Tgl 17 Desember 2010. yang di kerjakan oleh CV. ASIS ENGINERIA tersebut untuk dapat diselesaikan Seperti selama dalam masa pemeliharaan Seperti terlampir

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AGUSMAR,ST	Ketua	1. .....
2.	ZULFAMI, SH	Sekretaris	2. .....
3.	HIJJUL GAFSAN	Anggota	3. .....
4.	ALIMAN AFNI,SH	Anggota	4. .....
5.	YOSAFAD,ST	Anggota	5. .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. 2.	MARSUPRIADI DIARY FADLY	Pengawas lapangan	1. ..... 2. .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AFRI K. ASALIM	Kuasa Direktur	1. .....

ASIS ENGINERIA

LAMPIRAN I : HASIL PENELITIAN DATA ADMINISTRASI

Kegiatan : PEMBANGUNAN I (SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
Pekerjaan : PEMBANGUNAN I (SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
No/Tgl Kontrak : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010,TL 26 AGUS 2010
:ADD.NOMOR 166.a/ADD.KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,TGL 17 DES 2010
Lokasi : KEC. SUNGAI AUR
Pelaksana : CV. ASIS ENGINERIA

NO	URAIAN PERSYARATAN	KELENGKAPAN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
I.	KONTRAK DAN ADDENDUM.	✓		
II	SHOP DRAWING	-		
III	LAPORAN MINGGUAN.	✓		
IV	TIME SCHEDULLE	✓		
V	ASBUILT DRAWING	✓		
VI	FOTO DOKUMENTASI.	✓		
VII	ASTEK	✓		
VIII	BUKTI SETORAN GALIAN GOL. C.	✓		
IX	PLANK MEREK PROYEK	✓		
X	IMB	-		
XI	ACTUAL CHECK	✓		

Simpang Empat, Desember 2010

TIM PHO DAN FHO

PELAKSANA
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI K SALIM
Kuasa Direktur

KETUA

AGUSMAR,ST
NIP. 19560817 199301 1 001

SEKRETARIS

ZULFAMI, SH
NIP. 110 048 100

PANITIA SERAH TERIMA PERTAMA PHO (PROVISIONAL HAND OVER)
SERAH TERIMA AKHIR " FHO " (FINAL HAND OVER)

NATULEN RAPAT
PERSIAPAN SERAH TERIMA PERTAMA(PHO)
(PROVISIONAL HAND OVER)

Hari / Tanggal : Senin, 27 Desember 2010
Jam : 10.00 Wib
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

KESIMPULAN :

1. Sebelum tinjauan lapangan dilaksanakan Tim Serah Terima Pertama (PHO) akan meneliti terlebih dahulu kelengkapan administrasi
2. Pemeriksaan dilakukan secara bersama – sama Tim Serah Terima Pertama (PHO) dan Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pengawas Pekerjaan
3. Tim Serah Terima Pertama (PHO) akan mebuat Berita Acara Pemeriksaan dan ditangani secara bersama yang terkait.
4. Bila dalam hasil pemeriksaan dilapangan ternyata pekerjaan belum siap 100 %, maka Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) belum bisa diberikan kepada Penyedia yang bersangkutan

Demikianlah Natulen Rapat Ini kami buat untuk dapat dipedomanani terima kasih

Diketahui Oleh
Ketua

AGUSMAR,ST
Nip. 19560817 199301 1 001

Pencatat Natulen Rapat
Sekretaris

ZULFAMI, SH
Nip.110.048.100

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
JALAN SIMAPNG EMPAT – PADANG TUJUH KP. CUBADAK

Simpang Empat, 27 Desember 2010

Nomor : 620 / 244 /PHO.KAB /2010

Lamp :

Perihal : **Permohonan pelaksanaan Serah Terima Sementara (PHO) Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit pembangkit listrik tenaga mikro hidro**

Kepada
Yth Sdr. Ketua Tim PHO/FHO
Kabupaten Pasaman Barat

di.
SIMPANG EMPAT

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Serah Terima Sementara (PHO) Direktur CV. ASIS ENGINERIA Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrikan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lokasi Kec. Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang kami laksanakan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VII/DPE-2010, Tgl 26 Agustus 2010 dan ADD.I Nomor :540/166.a/ADD-KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,Tgl 17 Desember 2010.dengan Bobot Pekerjaan 100 % .

Berkenaan dengan hal diatas mohon kiranya Bapak untuk dapat meniinjau kelapangan guna untuk SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) dan sekaligus dengan membuat Berita Acaranya.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak atas bantuan dan kerja samanya diucapakan terima kasih.

PENGGUNA ANGGRAN (PA)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Ir. M. NAZU,M.T
NIP 19630320 199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten .Pasaman Barat.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat
4. Sdr. Direktur CV.ASIS ENGINERIA di tempat
5. Arsip

CV. ASIS ENGINERIA

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Wisma Indah III Blok C No. 5 Tabing Padang Telepon/Fax 0751 – 446071

Simpang Empat, 27 Desember 2010

Nomor : 027 / P.PHO/ CV. AE XII-2010

Lamp :

Perihal : **Permohonan pelaksanaan Serah Terima Sementara (PHO) Pekerjaan Pembangunan I (Satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro**

Kepada
Yth..Bapak Pengguna Anggran Dinas
Pertambangan Dan Energi

di.

Simpang Empat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Fisik APBN / APBD Kabupaten Pasaman Barat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenaga Listrikan Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lokasi Kec. Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang kami laksanakan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VII/DPE-2010, Tgl 26 Agustus 2010 dan ADD.I Nomor :540/166.a/ADD-KONTRAK/PLTMH/XII/DPE-2010,Tgl 17 Desember 2010, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai kami laksanakan dengan Bobot Pekerjaan 100 % .

Berkenaan dengan hal diatas mohon kiranya Bapak untuk dapat meniinjau kelapangan guna untuk SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

Demikianlah disampaikan kepada Bapak atas bantuan dan kerja samanya diucapakan terima kasih.

PEMOHON
CV. ASIS ENGINERING

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten .Pasaman Barat.
2.Arsip

FOTO DOKUMENTASI

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	*540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010*
TANGGAL	:	26 Agustus 2010
NOMOR KONTRAK	:	540/166/ADD.I/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL	:	24 Desember 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.459.000,00**

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

Contraktor - Leveransir - Jasa & Teknik

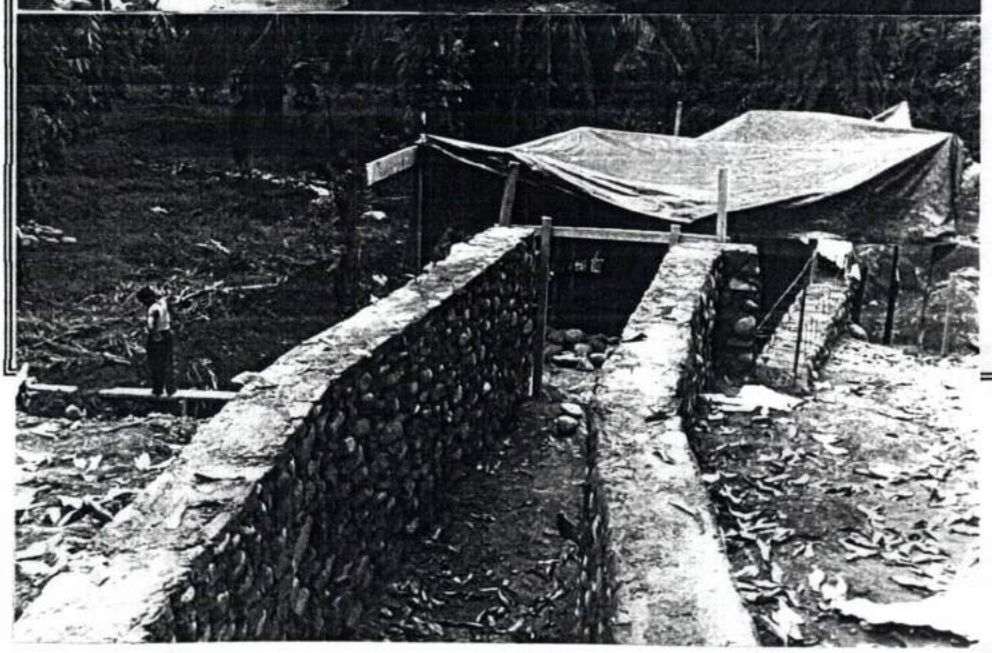
FOTO DOKUMENTASI



0%

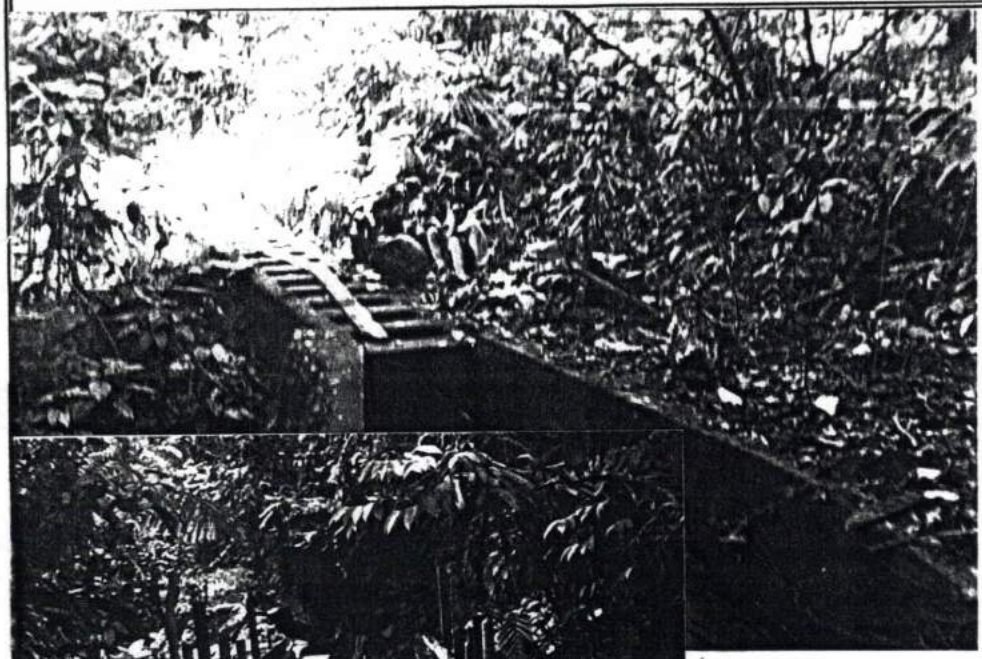


50%



100%

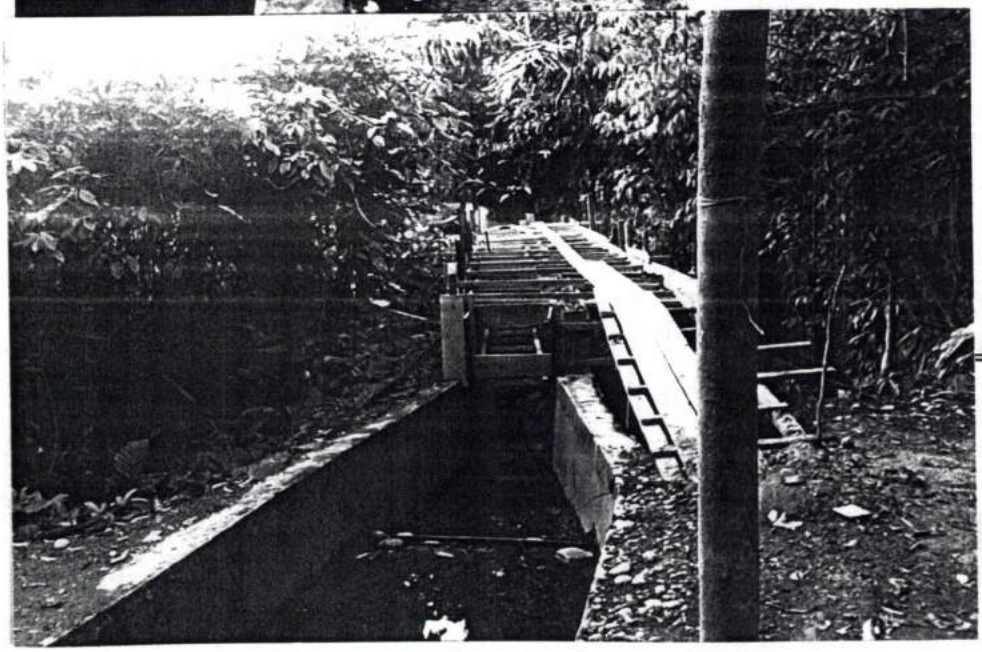
FOTO DOKUMENTASI



0%



50%



100%

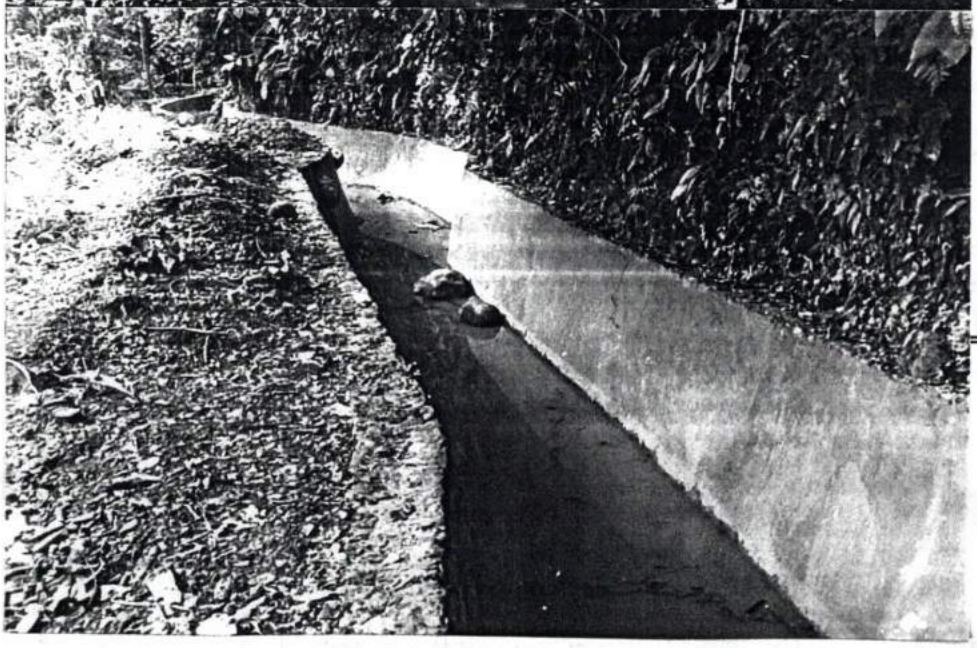
FOTO DOKUMENTASI



0%



50%



100%

FOTO DOKUMENTASI



0%



50%



100%

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

MUTUAL CHECK (MC 0)

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL KONTRAK	:	26 AGUSTUS 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.400.000,00**

PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

MUTUAL CHECK

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR
TERHADAP KONTRAK NO : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TAHUN ANGGARAN : 2010

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH	PEKERJAAN KURANG	KET
		KONTRAK	MC.0	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	7	9
I.	PEKERJAAN SIPIL	484,366,711.11	440,766,789.12	298,209,512.55	350,700,294.54	
II.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL MEKANIKAL	155,725,000.00	199,325,000.00	84,325,000.00	40,725,000.00	
III	PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	
A	JUMLAH	643,091,711.11	643,091,789.12	382,534,512.55	391,425,294.54	
B	PPN 10%	64,309,171.11	64,309,178.91			
C	TOTAL A + B	707,400,882.22	707,400,968.04			
D	DIBULATKAN	707,400,000.00	707,400,000.00			

Simpang Empat, September 2010

Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran

Ir. M. NAZLI, MT
NIP. 19630320 199003 1 004

Diperiksa oleh
Pengawas,

PPTK

YEPRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Dibuat oleh
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

MUTUAL CHECK (MC 0)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR
TERHADAP KONTRAK NO : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TAHUN ANGGARAN : 2010

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME				JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET
			HARGA SATUAN KONTRAK	KONTRAK	HARGA SATUAN MC.0	MC.0	KONTRAK	MC.0	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X5	9=6X7	10=7-5	11=6X10	12=5-7	13=6X12	14
	RUMAH PEMBANGKIT												
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**												
1	Pembersihan Lapangan	m2	7,500.00	24.00	7,500.00	24.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	
2	Pengukuran Ulang	Ls	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	
3	Pek. Papan Bowplank & Pengukuran	Ls	40,500.00	20.00	40,500.00	20.00	810,000.00	810,000.00	-	-	-	-	
4	Plank Proyek	Ls	300,000.00	-	300,000.00	1.00	-	300,000.00	1.00	300,000.00	-	-	
	Sub Total I						**3,490,000.00**	**3,790,000.00**		**300,000.00**		-	
II.	**PEKERJAAN PONDASI**												
1	Galian Tanah Biasa	M^3	20,400.00	6.00	20,400.00	8.64	122,400.00	176,256.00	2.64	53,856.00		-	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M^3	122,100.00	0.00	122,100.00	0.96	73,260.00	117,216.00	0.36	43,956.00		-	
3	Aanstanpang Batu Kali	M^3	188,000.00	2.40	188,000.00	1.82	451,200.00	342,912.00	-	-	0.58	108,288.00	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M^3	603,100.00	5.00	603,100.00	14.17	3,015,500.00	8,548,037.85	9.17	5,532,537.85		-	
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M^3	9,700.00	1.50	9,700.00	2.56	14,550.00	24,832.00	1.06	10,282.00		-	
	Sub Total II						**3,676,910.00**	**9,209,253.85**		**5,640,631.85**		**108,288.00**	
III.	**PEKERJAAN BETON DAN DINDING**												
1	Pekerjaan Cor Sloof 20/25	M^3	4,151,400.00	1.00	4,151,400.00	0.80	4,151,400.00	3,321,120.00		-	0.20	830,280.00	
2	Pek. Kolom 13/13	M^3	5,075,500.00	0.24	5,075,500.00	0.19	1,235,173.68	960,690.64		-	0.05	274,483.04	
3	Pek. Reng Balok 20/25	M^3	3,720,600.00	1.00	3,720,600.00	0.80	3,720,600.00	2,976,480.00		-	0.20	744,120.00	
4	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	M^3	1,043,000.00	0.43	1,043,000.00	0.44	450,576.00	453,705.00	0.00	3,129.00		-	
5	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:4	M^3	890,100.00	6.51	890,100.00	5.63	5,790,545.55	5,006,812.50		-	0.88	783,733.05	
6	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	M^3	3,937,500.00	0.05	3,937,500.00	0.08	204,120.00	326,025.00	0.03	121,905.00		-	
6	Pek. Memeni Kozen	M^2	10,100.00	2.30	10,100.00	4.14	23,270.40	41,814.00	1.84	18,543.60		-	
7	Plesteran	M^2	35,010.00	94.89	35,010.00	81.40	3,322,098.90	2,849,814.00		-	13.49	472,284.90	
	Sub Total III						**18,897,784.53**	**15,936,461.14**		**143,577.60**		**3,104,900.99**	

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME				JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET
			HARGA SATUAN KONTRAK	KONTRAK	HARGA SATUAN MC.0	MC.0	KONTRAK	MC.0	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X5	9=6X7	10=7-5	11=6X10	12=5-7	13=6X12	14
IV.	**PEKERJAAN ATAP**												
1	Pek. Pas. Kuda-kuda	M^3	2,680,000.00	0.20	2,680,000.00	0.25	524,851.20	659,923.20	0.05	135,072.00		-	
2	Pek. Pas. Gording	M^3	28,600.00	0.52	28,600.00	0.31	14,872.00	8,723.00		-	0.22	6,149.00	
3	Pek. Atap Seng BJLS 20 K	M^2	57,000.00	43.20	57,000.00	42.00	2,462,400.00	2,394,000.00		-	1.20	68,400.00	
4	Pek. Pas. Lisplank Papan	M^2	120,000.00	7.92	120,000.00	6.00	950,400.00	720,000.00		-	1.92	230,400.00	
5	Pek. Residu	M^1	12,200.00	40.99	12,200.00	30.61	500,102.40	373,466.40		-	10.38	126,636.00	
6	Pek. Pas. Perabung	M^1	11,100.00	6.00	11,100.00	7.00	66,600.00	77,700.00	1.00	11,100.00		-	
7	Pek. Baut kuda-kuda	Bh	8,000.00	12.00	8,000.00	12.00	96,000.00	96,000.00	-	-	-	-	
8	Pek. Pas. Besi Angker Kuda-kuda	Bh	5,000.00	6.00	5,000.00	6.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	
	Sub Total IV						**4,645,225.60**	**4,359,812.60**		**146,172.00**		**431,585.00**	
V.	**PEKERJAAN LANTAI**												
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M^3	122,100.00	3.28	122,100.00	2.98	400,488.00	364,132.73		-	0.30	36,355.28	
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:3:5	M^3	550,400.00	6.56	550,400.00	5.07	3,610,624.00	2,792,385.60		-	1.49	818,238.40	
	Sub Total V						**4,011,112.00**	**3,156,518.33**		**-**		**854,593.68**	
VI.	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**												
1	Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	M^3	778,200.00	0.01	778,200.00	0.09	4,980.48	70,131.38	0.08	65,150.90		-	
2	Pek. Jendela Kaca	M^2	256,400.00	0.80	256,400.00	0.80	205,120.00	205,120.00	-	-	-	-	
3	Pek. Ventilasi Julasi	M^2	225,600.00	3.60	225,600.00	2.89	812,160.00	651,420.00		-	0.71	160,740.00	
4	Pek. Pas. Engsel Pintu	Bh	9,000.00	6.00	9,000.00	6.00	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	
5	Pek. Pas. Grendel Pintu	Bh	5,000.00	2.00	5,000.00	2.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	
6	Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	Bh	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	
7	Pek. Pas. Engsel Jendela	Bh	6,000.00	2.00	6,000.00	2.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	
8	Pek. Pas. Kait Angin	Bh	7,000.00	2.00	7,000.00	2.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	
9	Pek. Pas. Grendel Jendela	Bh	8,000.00	2.00	8,000.00	2.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	
6	Pek. Hand Vantten	Bh	8,000.00	2.00	8,000.00	2.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	
	Sub Total VI						**1,294,260.48**	**1,198,671.38**		**65,150.90**		**160,740.00**	
VII.	**PEKERJAAN PIPA PESAT**												
1	Pipa Pesat + Elbow Dia. 650 MM	M^1	2,200,000.00	-	2,200,000.00	3.60	-	7,920,000.00	3.60	7,920,000.00	-	-	
	Sub Total VII						**-**	**7,920,000.00**		**7,920,000.00**		**-**	

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME				JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET
			HARGA SATUAN KONTRAK	KONTRAK	HARGA SATUAN MC.0	MC.0	KONTRAK	MC.0	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X5	9=6X7	10=7-5	11=6X10	12=5-7	13=6X12	14
	KEDUDUKAN MESIN & SALURAN BUANG												
I	**PEKERJAAN PONDASI**												
1	Galian Tanah Pondasi	M3	20,400.00	4.80	20,400.00	5.20	97,920.00	106,080.00	0.40	8,160.00		-	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	122,100.00	1.04	122,100.00	0.90	126,984.00	109,890.00		-	0.14	17,094.00	
3	Aanstampang Batu kali	M3	188,000.00	4.16	188,000.00	3.30	782,080.00	620,400.00		-	0.86	161,680.00	
4	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 2	M3	750,500.00	14.08	750,500.00	6.02	10,567,040.00	4,518,010.00		-	8.06	6,049,030.00	
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	M3	9,700.00	1.20	9,700.00	2.70	11,640.00	26,190.00	1.50	14,550.00		-	
	Sub Total I						**11,585,664.00**	**5,380,570.00**		**22,710.00**		**6,227,804.00**	
II	**PEKERJAAN BETON & DINDING**												
1	Pek. Plesteran Dinding 1:2	M2	48,300.00	49.60	48,300.00	7.20	2,395,680.00	347,760.00		-	42.40	2,047,920.00	
2	Pek. Balok 25/30	M3	3,819,300.00	0.38	3,819,300.00	0.45	1,432,237.50	1,718,685.00	0.08	286,447.50		-	
	Sub Total I						**3,827,917.50**	**2,066,445.00**		**286,447.50**		**2,047,920.00**	
III.	**PEKERJAAN LANTAI**												
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	122,100.00	1.60	122,100.00	0.90	195,360.00	109,890.00		-	0.70	85,470.00	
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	563,300.00	0.80	563,300.00	0.85	450,640.00	478,805.00	0.05	28,165.00		-	
	Sub Total I						**646,000.00**	**588,695.00**		**28,165.00**		**85,470.00**	
	INTEK												
1	Galian Tanah Pondasi	M3	20,400.00	4.05	20,400.00	21.60	82,620.00	440,640.00	17.55	358,020.00		-	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	122,100.00	0.81	122,100.00	1.20	98,901.00	146,520.00	0.39	47,619.00		-	
3	Aanstampang Batu kali	M3	188,000.00	1.96	188,000.00	2.40	368,480.00	451,200.00	0.44	82,720.00		-	
4	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 2	M3	750,500.00	14.30	750,500.00	7.58	10,732,900.50	5,688,790.00		-	6.72	5,044,110.50	
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	M3	9,700.00	1.13	9,700.00	5.85	10,961.00	56,745.00	4.72	45,784.00		-	
6	Coran Lantai	M3	550,400.00	0.80	550,400.00	0.96	440,320.00	528,384.00	0.16	88,064.00		-	
7	Pintu Air dan Pintu Bendung	Ls	8,000,000.00	-	8,000,000.00	2.00	-	16,000,000.00	2.00	16,000,000.00		-	
8	Plesteran	M2	48,300.00	49.60	48,300.00	22.40	2,395,680.00	1,081,920.00		-	27.20	1,313,760.00	
	Sub Total						**14,129,862.50**	**24,394,199.00**		**16,622,207.00**		**6,357,870.50**	

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME				JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET
			HARGA SATUAN KONTRAK	KONTRAK	HARGA SATUAN MC.0	MC.0	KONTRAK	MC.0	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X5	9=6X7	10=7-5	11=6X10	12=5-7	13=6X12	14
	SALURAN PEMBAWA / TALI BANDAR												
1	Galian Tanah Pondasi	M3	20,400.00	66.00	20,400.00	90.00	1,346,400.00	1,836,000.00	24.00	489,600.00	-	-	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	122,100.00	0.20	122,100.00	2.50	24,420.00	305,250.00	2.30	280,830.00	-	-	
3	Aanstampang Batu kali	M3	188,000.00	10.80	188,000.00	15.00	2,030,400.00	2,820,000.00	4.20	789,600.00	-	-	
4	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 2	M3	9,700.00	22.95	750,500.00	19.88	222,615.00	14,916,187.50	-	-	3.08	2,307,787.50	
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	M3	550,400.00	15.00	9,700.00	2.70	8,256,000.00	26,190.00	-	-	12.30	119,310.00	
6	Coran Lantai	M3	550,400.00	15.00	550,400.00	4.00	8,256,000.00	2,201,600.00	-	-	11.00	6,054,400.00	
7	Urugan Tanah	M3	9,700.00	15.00	9,700.00	22.88	145,500.00	221,887.50	7.88	76,387.50	-	-	
8	Plesteran	M2	48,300.00	216.00	48,300.00	80.00	10,432,800.00	3,864,000.00	-	-	136.00	6,568,800.00	
	Sub Total						**30,714,135.00**	**26,191,115.00**		**1,636,417.50**		**15,050,297.50**	
VI.	**PIPA PESAT**												
1	Pek. Pas. Acor Block	M2	645,000.00	4.95	645,000.00	-	3,192,750.00	-			4.95	3,192,750.00	
2	Pek. Pas. Sliding Block	M2	534,700.00	27.44	534,700.00	-	14,672,168.00	-			27.44	14,672,168.00	
3	Pek. Pas. Pipa Pesat	M1	1,160,000.00	73.00	1,160,000.00	-	84,680,000.00	-			73.00	84,680,000.00	
4	Pek. Pas. Perlengkapan Pipa	Ls	34,800.00	10.00	34,800.00	-	348,000.00	-			10.00	348,000.00	
	Sub Total						**102,892,918.00**	**-**		**-**		**102,892,918.00**	

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME				JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET
			HARGA SATUAN KONTRAK	KONTRAK	HARGA SATUAN MC.0	MC.0	KONTRAK	MC.0	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X5	9=6X7	10=7-5	11=6X10	12=5-7	13=6X12	14
	BAK PENENANG												
I.	**PEKERJAAN PONDASI**												
1	Galian Tanah Pondasi	M3	20,400.00	-	20,400.00		-	-	-	-	-	-	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	122,100.00	27.00	122,100.00	11.71	3,296,700.00	1,429,943.63		-	15.29	1,866,756.38	
3	Aanstanpang Batu Kali	M3	188,000.00	20.88	188,000.00	13.63	3,925,440.00	2,561,970.00		-	7.25	1,363,470.00	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	750,500.00	48.51	750,500.00	36.84	36,406,755.00	27,645,042.75		-	11.67	8,761,712.25	
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	9,700.00		9,700.00		-	-	-	-	-	-	
	Sub Total						**43,628,895.00**	**31,636,956.38**		**-**		**11,991,938.63**	
II	**PEKERJAAN BETON & DINDING**												
1	Pek. Plesteran Dinding 1:2	M2	48,300.00	135.60	48,300.00	96.20	6,549,480.00	4,646,218.50		-	39.41	1,903,261.50	
2	Pek. Balok 25/30	M3	3,720,600.00	6.98	3,720,600.00	7.96	25,951,185.00	29,606,674.50	0.98	3,655,489.50		-	
3	Pek. Plat	M3	4,292,400.00	0.88	4,292,400.00	0.32	3,755,850.00	1,352,106.00		-	0.56	2,403,744.00	
4	Pek. Pas. Saringan	Ls	2,470,000.00	1.00	2,470,000.00	2.00	2,470,000.00	4,940,000.00	1.00	2,470,000.00		-	
5	Pintu Air	Ls	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	
	Sub Total						**40,226,515.00**	**42,044,999.00**		**6,125,489.50**		**4,307,005.50**	
III	**PEKERJAAN LANTAI**												
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	122,100.00	13.50	122,100.00	1.81	1,648,350.00	220,695.75		-	11.69	1,427,654.25	
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	563,300.00	5.63	563,300.00	3.89	3,168,562.50	2,188,420.50		-	1.74	980,142.00	
	Sub Total						**4,816,912.50**	**2,409,116.25**		**-**		**2,407,796.25**	
IV	**PEKERJAAN PELIMPAH**												
1	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M3	84,700.00	0.14	84,700.00	1.91	11,858.00	162,115.80	1.77	150,257.80		-	
2	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	122,100.00	0.07	122,100.00	1.28	8,547.00	155,799.60	1.21	147,252.60		-	
3	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	M3	603,100.00	1.92	603,100.00	17.68	1,155,539.60	10,662,808.00	15.76	9,507,268.40		-	
4	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	563,300.00	0.06	563,300.00	1.85	35,487.90	1,042,668.30	1.79	1,007,180.40		-	
	Sub Total						**1,211,432.50**	**12,023,391.70**		**10,811,959.20**		**-**	

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME				JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET
			HARGA SATUAN KONTRAK	KONTRAK	HARGA SATUAN MC.0	MC.0	KONTRAK	MC.0	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X5	9=6X7	10=7-5	11=6X10	12=5-7	13=6X12	14
	BENDUNGAN, SIKOCI DAN SAYAP												
I.	**PEKERJAAN PONDASI**												
1	Galian Tanah Pondasi	M3	20,400.00	39.78	20,400.00	-	811,512.00	-			39.78	811,512.00	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	122,100.00	3.57	122,100.00	-	435,897.00	-			3.57	435,897.00	
3	Aanstanpang Batu Kali	M3	188,000.00	28.56	188,000.00	-	5,369,280.00	-			28.56	5,369,280.00	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M3	750,500.00	222.62	750,500.00	-	167,076,310.00	-			222.62	167,076,310.00	
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	9,700.00	9.95	9,700.00	-	96,466.50	-			9.95	96,466.50	
	Sub Total						**173,789,465.50**	-		-		**173,789,465.50**	
II.	**PEKERJAAN BETON DAN DINDING**												
1	Plesteran Dinding 1:2	M2	48,300.00	303.72	48,300.00	-	14,669,676.00	-			303.72	14,669,676.00	
2	Pek. Balok 20/25	M3	3,720,600.00	0.50	3,720,600.00	-	1,860,300.00	-			0.50	1,860,300.00	
	Sub Total						**16,529,976.00**	-		-		**16,529,976.00**	
III.	**PEKERJAAN LANTAI**												
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	122,100.00	4.50	122,100.00	-	549,450.00	-			4.50	549,450.00	
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	563,300.00	6.75	563,300.00	-	3,802,275.00	-			6.75	3,802,275.00	
	Sub Total						**4,351,725.00**	-		-		**4,351,725.00**	
	REHAB SALURAN IRIGASI												
I.	**PEKERJAAN PONDASI**												
1	Galian Tanah Pondasi	M3	20,400.00	-	20,400.00	663.30	-	13,531,320.00	663.30	13,531,320.00	-		
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M3	122,100.00	-	122,100.00		-	-	-	-	-		
3	Aanstanpang Batu Kali	M3	188,000.00	-	188,000.00	28.56	-	5,369,280.00	28.56	5,369,280.00	-		
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M3	750,500.00	-	750,500.00	176.14	-	132,194,571.00	176.14	132,194,571.00	-		
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M3	9,700.00	-	9,700.00	41.28	-	400,367.50	41.28	400,367.50	-		
	Sub Total						-	**151,495,538.50**		**151,495,538.50**		-	

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME				JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET
			HARGA SATUAN KONTRAK	KONTRAK	HARGA SATUAN MC.0	MC.0	KONTRAK	MC.0	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8=4X5	9=6X7	10=7-5	11=6X10	12=5-7	13=6X12	14
II.	**PEKERJAAN BETON DAN DINDING**												
1	Plesteran Dinding 1:2	M2	48,300.00		48,300.00	559.20		27,009,360.00	559.20	27,009,360.00			
2	Pek. Saluran Gantung	M3	3,720,600.00		3,720,600.00	10.40		38,675,637.00	10.40	38,675,637.00			
3	Pek. Balok 15/20	M3	3,720,600.00		3,720,600.00	-	-	-	-	-		-	
	Sub Total						-	**65,684,997.00**		**65,684,997.00**		-	
III.	**PEKERJAAN LANTAI**												
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M3	122,100.00		122,100.00	-		-	-	-			
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M3	563,300.00		563,300.00	55.53		31,280,049.00	55.53	31,280,049.00			
	Sub Total						-	**31,280,049.00**		**31,280,049.00**		-	
	Total Jumlah						**484,366,711.11**	**440,766,789.12**		**298,209,512.55**		**350,700,294.54**	

Simpang Empat, September 2010

Pengguna Anggaran

Ir. M. NAZLI, MT
NIP. 19630320 199003 1 004

Disetujui oleh :
PPTK

YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

Diperiksa oleh :
Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Dibuat oleh :
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

MUTUAL CHECK

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR
TERHADAP KONTRAK NO : 540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TAHUN ANGGARAN : 2010

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	HARGA SATUAN	VOLUME		JUMLAH HARGA		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET
				KONTRAK	MC.0	KONTRAK	MC.0	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7=4X5	8=4X6	9=6+5	10=4X9	11=6-5	12=4X11	13
I.	**PERALATAN ELEKTRIKAL & MEKANIKAL**											
1	Turbin	Unit	85,000,000.00	1.00	1.00	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	-	-	
3	Generator	kVA	750,000.00	45.00	-	33,750,000.00	-	-	-	45.00	33,750,000.00	
3	Generator AC 3 Phasa 35 kVA + ballast Load	Ls	36,825,000.00	-	1.00	-	36,825,000.00	1.00	36,825,000.00	-	-	
4	Switchgear/ Panel Kontrol ELC	Unit	30,000,000.00	1.00	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	
5	Ballast Load; air heater	kVA	225,000.00	31.00	-	6,975,000.00	-	-	-	31.00	6,975,000.00	
6	Biaya Instalasi + Set Up	Ls	7,500,000.00	-	1.00	-	7,500,000.00	1.00	7,500,000.00	-	-	
7	Pengadaan Kabel Twisted 3x35 mm;1x25 mm	M1	40,000.00	-	1,000.00	-	40,000,000.00	1,000.00	40,000,000.00	-	-	
	Sub Total I					**155,725,000.00**	**199,325,000.00**		**84,325,000.00**		**40,725,000.00**	
II.	**PEKERJAAN SOSIAL ENGINEERING**											
1	Pelatihan Operator	org	1,000,000.00	2.00	2.00	2,000,000.00	2,000,000.00		-		-	
2	Tool Set	ls	1,000,000.00	1.00	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-		-	
	Sub Total II					**3,000,000.00**	**3,000,000.00**		**-**		**-**	
	Total Jumlah					**158,725,000.00**	**202,325,000.00**		**84,325,000.00**		**40,725,000.00**	

Simpang Empat, September 2010

Diperiksa oleh :
Pengawas,

DARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

Dibuat oleh :
CV. ASIS ENGINERIA

AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

BACK UP DATA

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGA LISTRIKAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KECAMATAN	:	SUNGAI AUR
NOMOR KONTRAK	:	540/166/KONTRAK/PLTMH/VIII/DPE-2010
TANGGAL KONTRAK	:	26 AGUSTUS 2010
NILAI KONTRAK	:	**707.400.000,00**

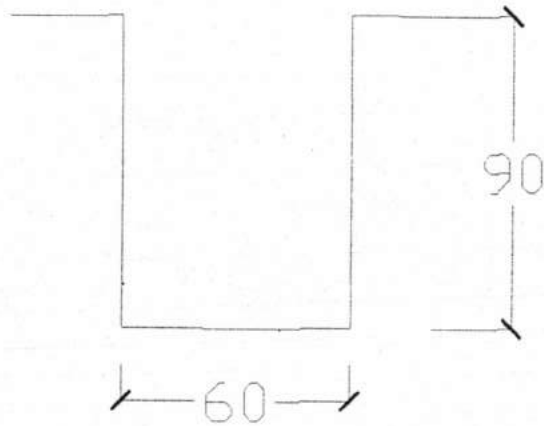
PELAKSANA

CV. ASIS ENGINERIA

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Galian Tanah Biasa**
Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	16.00	0.90	0.60	8.64	
	JUMLAH			**8.64**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

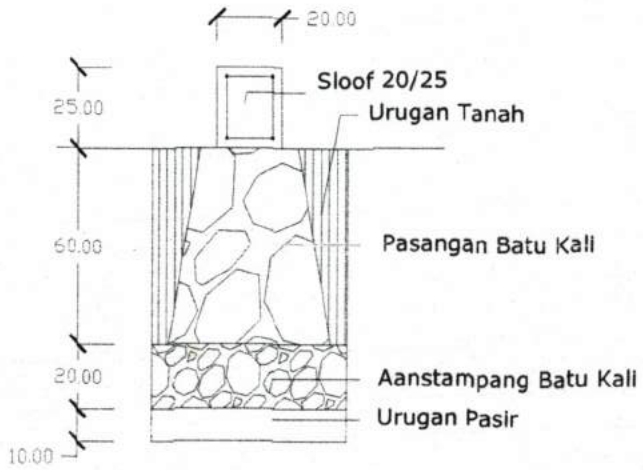
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Urugan Pasir Lantai Kerja**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	16.00	0.10	0.60	0.96	
	JUMLAH			**0.96**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

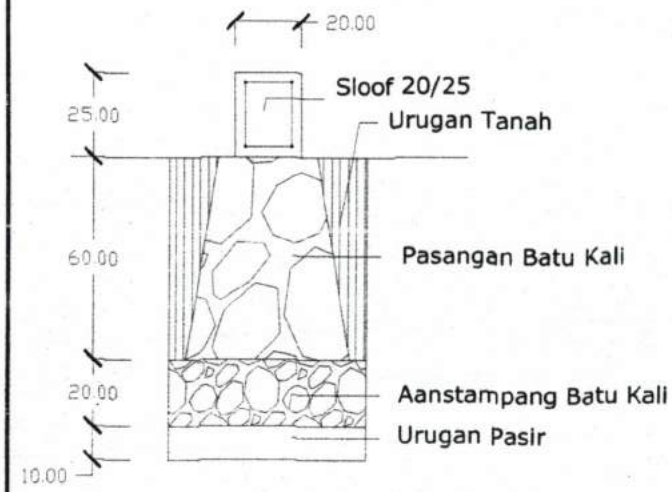
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Aanstampang Batu Kali**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	15.20	0.20	0.60	1.82	
	JUMLAH			**1.82**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

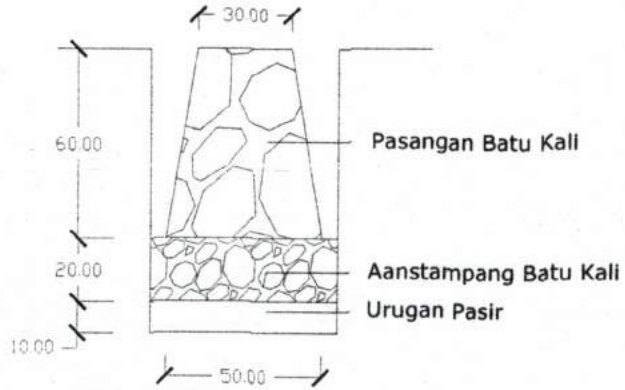
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **; PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Pasangan Pondasi Batu Kali**

SKETSA / GAMBAR



Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Jml	**Volume (M3)**	KETERANGAN
15.20	0.60	0.30	0.50	1	3.65	Pas. Batu Pondasi
4.70	1.20	0.45	0.45	2	5.08	Pasangan Batu Saluran Buang
0.80	1.20	0.45	0.45	1	0.43	Pasangan Batu Saluran Buang
3.00	0.30	0.80	0.80	1	0.72	Lantai Saluran Dalam
6.00	1.00	0.35	0.45	1	2.40	*Saluran di* luar bangunan
3.00	0.50	0.80	0.80	1	1.20	Lantai Saluran luar bangunan
1.55	0.30	1.50	1.50	1	0.70	Pas. Batu Keddkn Mesin
			JUMLAH		**14.17**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : Timbunan Tanah Kembali

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	16.00	0.80	0.60	2.56	
	JUMLAH			**2.56**	

CV. ASIS ENGINERIA

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010/01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

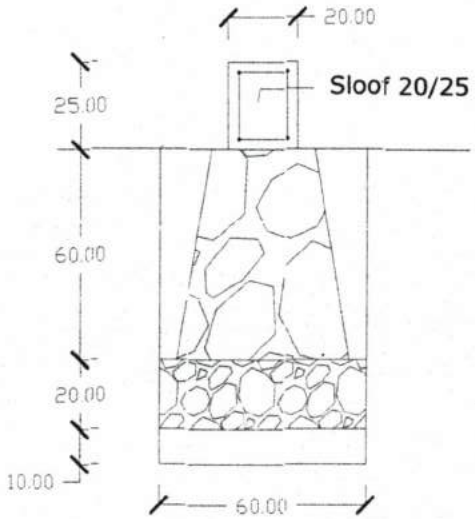
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Sloof 20/25**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	16.00	0.20	0.25	0.80	
		JUMLAH		**0.80**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 : 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

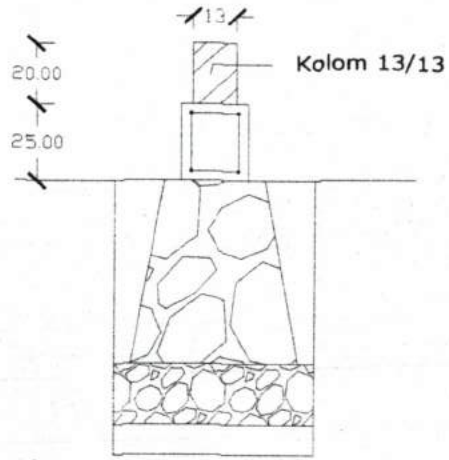
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Kolom 13/13**

SKETSA / GAMBAR



Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	Jml	**Volume (M3)**	KETERANGAN
2.80	0.13	0.13	4	0.19	
JUMLAH				**0.19**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

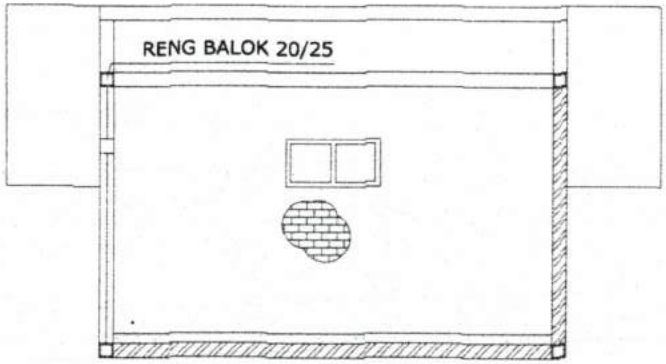
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Reng Balok 20/25**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	16.00	0.20	0.25	0.80	
	JUMLAH			**0.80**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

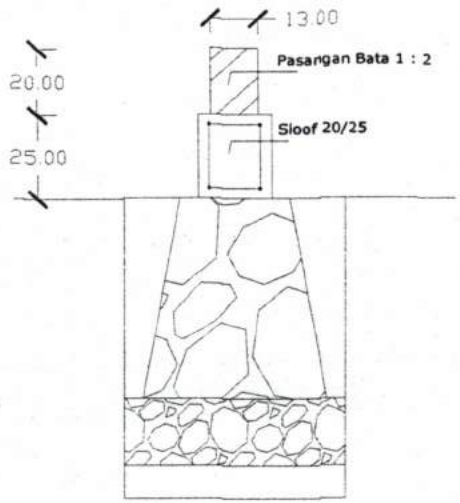
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Pasangan Dinding Bata 1 : 2**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Tebal (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	14.50	0.20	0.15	0.44	
	JUMLAH			0.44	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

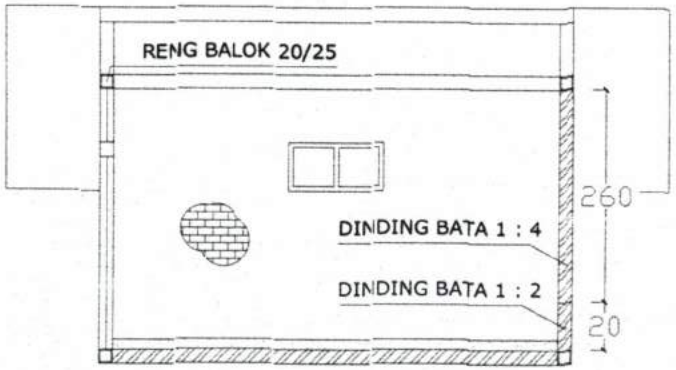
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Pasangan Diding Batu Bata 1 : 4**

SKETSA / GAMBAR



Panjang (M')	Tinggi (M')	Tebal	Jumlah	**Volume (M3)**	KETERANGAN
16.00	2.60	0.15		6.24	Luas Dinding Keseluruahan
1.00	0.50	0.15		0.08	Luas Pintu dan Jendela
1.50	2.00	0.15		0.45	
0.40	1.50	0.15		0.09	
				0.62	
JUMLAH				**5.63**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

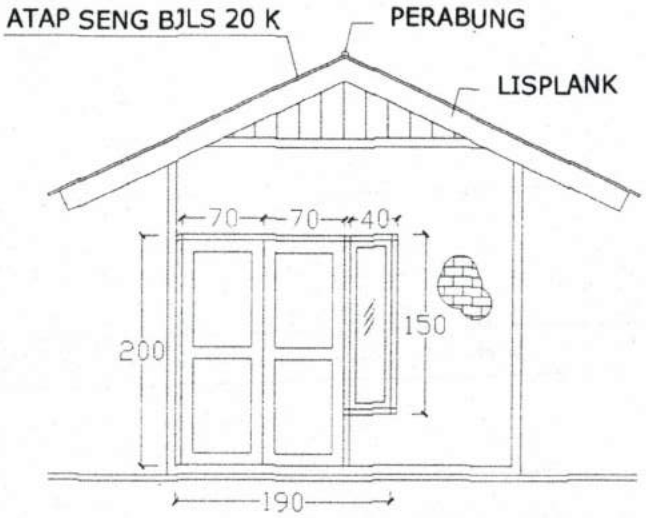
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Pasangan Kusen Pintu dan Jendela**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	11.50	0.12	0.06	0.08	
	JUMLAH			**0.08**	

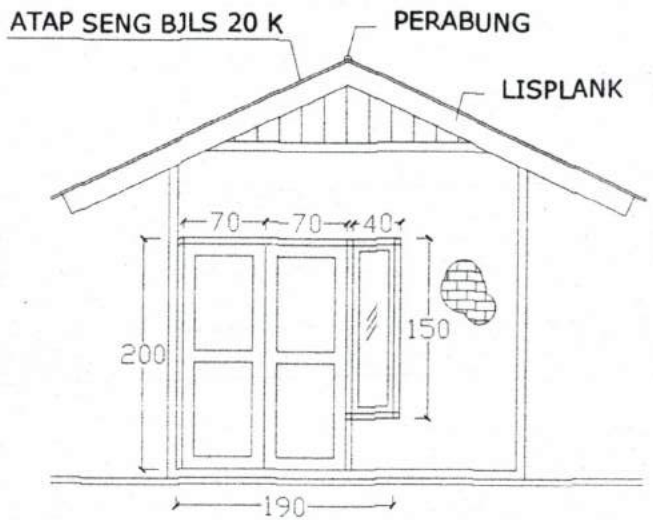
Pengawas,	Pengawas,	CV. ASIS ENGINERIA
DIARI FADLI	MARSUPRIADI, Amd	**ELWAMASRI**
NIP. 19810517 2010 01 1 018	NIP. 19720327 2008 01 1 002	Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Meni Kusen**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Jumlah	**Volume (M3)**	KETERANGAN
					
	11.50	0.06	2.00	1.38	
	11.50	0.12	2.00	2.76	
			JUMLAH	**4.14**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

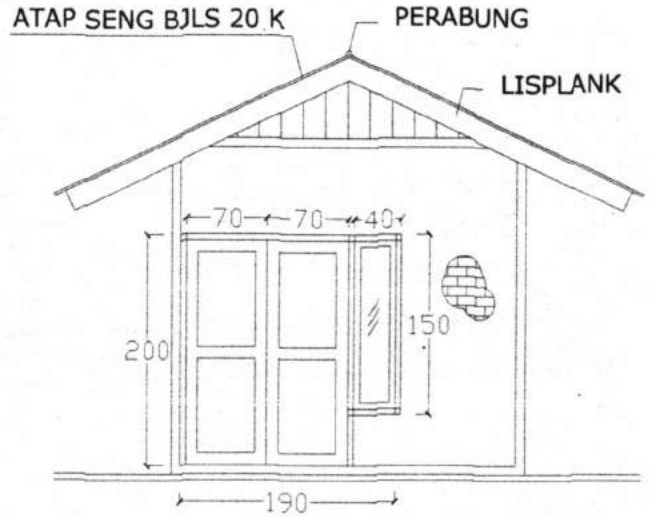
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Plesteran**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Jumlah	Jumlah	**Volume (M3)**	KETERANGAN
						
	16.00	2.80			44.80	Luas Dinding Keseluruahan
	1.00	0.50			0.50	Luas Pintu dan Jendela
	1.50	2.00			3.00	
	0.40	1.50			0.60	
					4.10	
			JUMLAH		**81.40**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

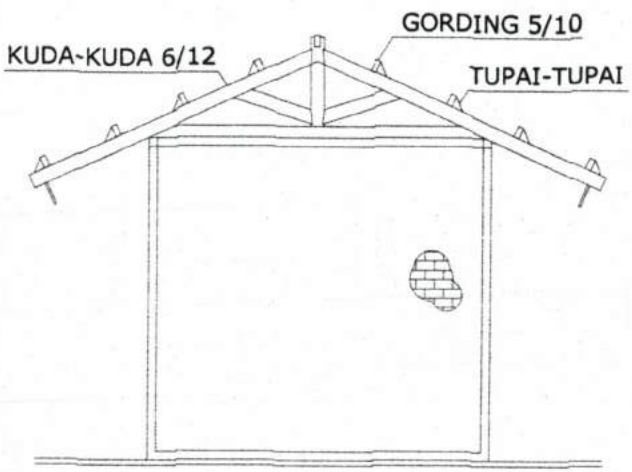
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Pasangan Kuda - Kuda**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	34.20	0.06	0.12	0.25	
	JUMLAH			**0.25**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

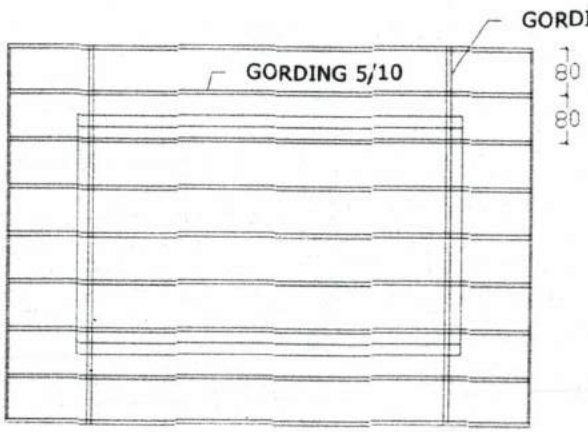
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Pasangan Gording**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	61.00	0.05	0.10	0.31	
	JUMLAH			**0.31**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

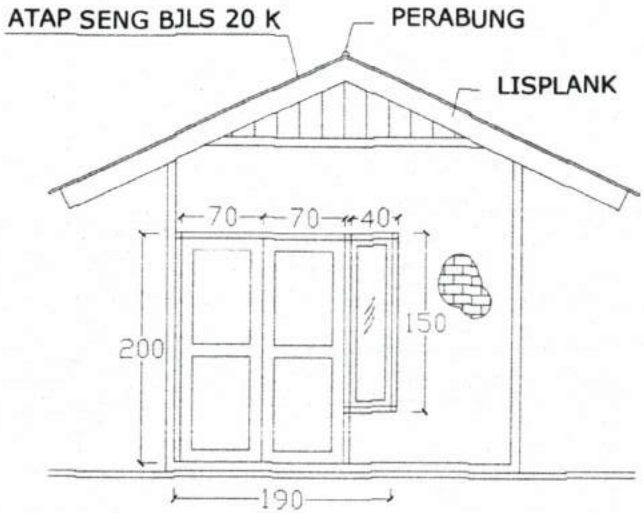
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Atap Seng BJLS 20 K**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	3.00	7.00	2.00	42.00	
	JUMLAH			**42.00**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

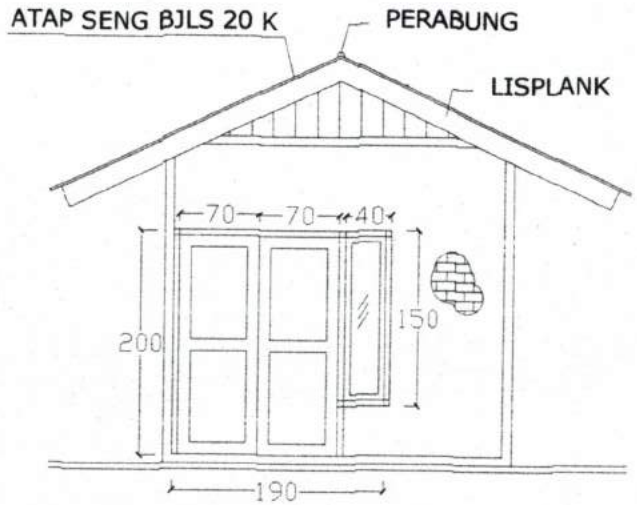
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Pasangan Lisplank Papan**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Lebar (M')	Jumlah	**Volume (M3)**	KETERANGAN
					
	30.00		4.00	**7.50**	
	4.00	0.20		**0.80**	
JUMLAH				**6.00**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

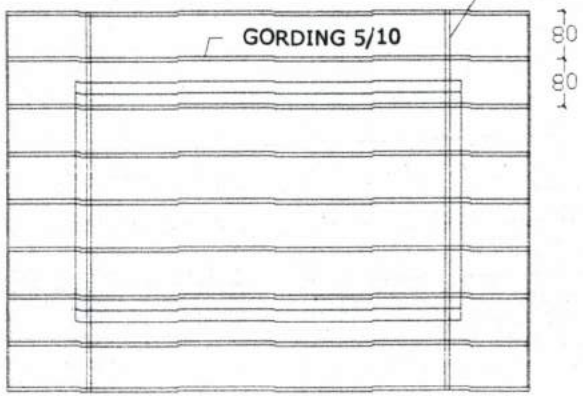
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Residu**

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Lebar (M')	Jumlah	**Volume (M3)**	KETERANGAN
					
	34.20	0.06	2.00	4.10	
	34.20	0.12	2.00	8.21	
				12.31	
	61.00	0.05	2.00	6.10	
	61.00	0.10	2.00	12.20	
				18.30	
			JUMLAH	**30.61**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

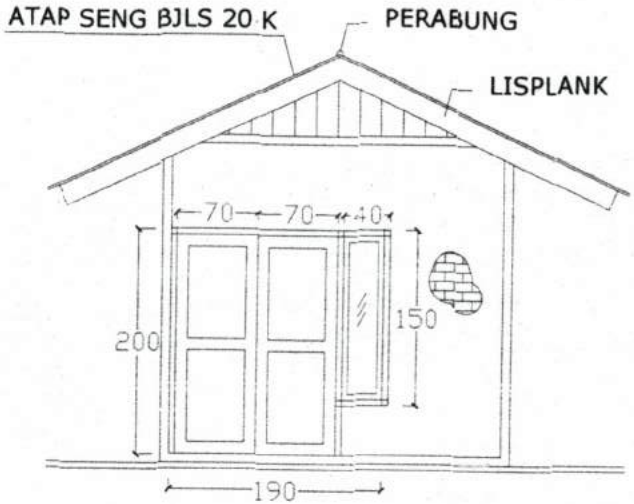
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Perabung** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')		Volume (M3)	KETERANGAN
	7.00		7.00	
	JUMLAH		**7.00**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

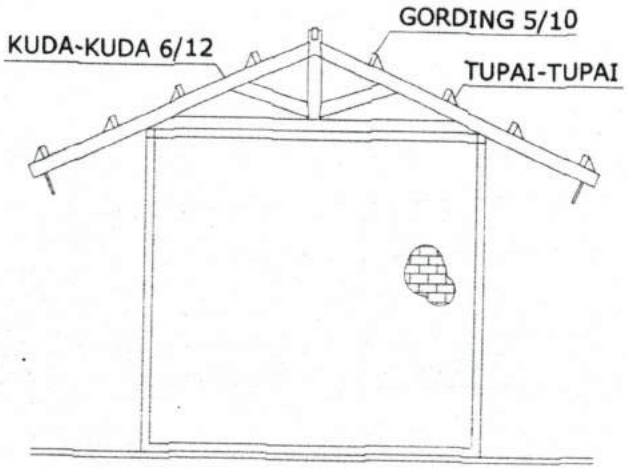
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Baut Kuda - Kuda** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Banyak			Volume (Buah)	KETERANGAN
	12.00			12.00	
	JUMLAH			**12.00**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010/01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

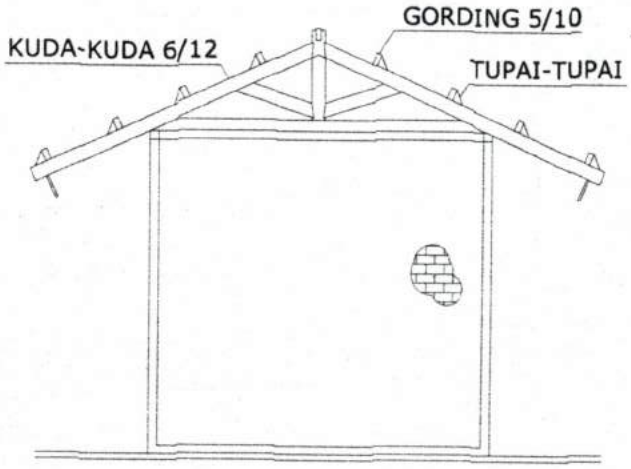
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIK #REF! **: Galian Tanah Berbatu**
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan **: Pasangan Besi Angker**

SKETSA / GAMBAR	Banyak			Volume (Buah)	KETERANGAN
	6.00			6.00	
	J U M L A H			**6.00**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

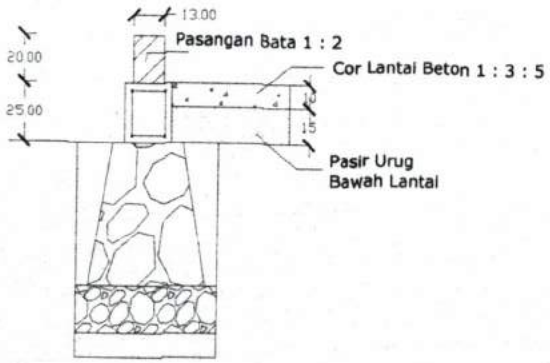
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : Urugan Pasir Bawah Lantai — Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
					
	4.85	2.85	0.1	1.38	
	20.00	0.80	0.1	1.60	
			JUMLAH	**2.98**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

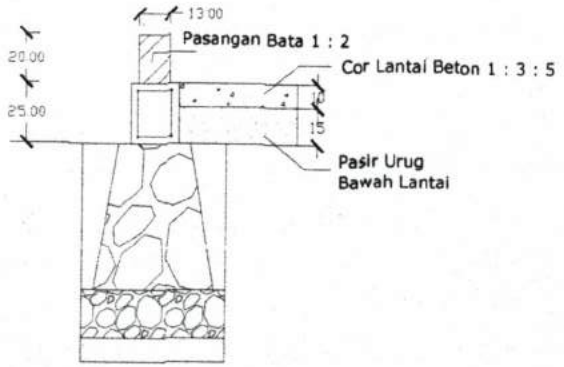
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Cor Lantai Beton 1 : 3 : 5** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	Luas (M^2)	**Volume (M3)**	KETERANGAN
						
	4.85	2.85	0.15		2.07	
	20.00	1.00	0.15		3.00	
JUMLAH					**5.07**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

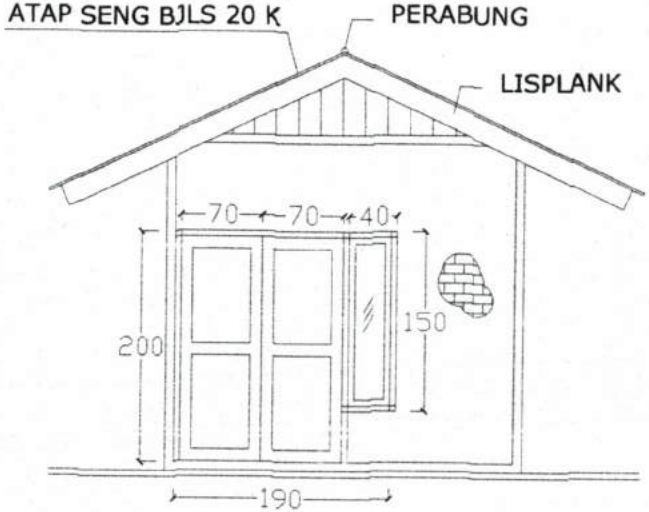
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR
Rumah Turbin
Pekerjaan : **Pasangan Pintu Panel dan Jendela**

SKETSA / GAMBAR



Panjang (M')	Lebar (M')	Tebal (M')	Luas (M^2)	**Volume (M3)**	KETERANGAN
1.40	2.00	0.03		0.08	
3.40	0.06	0.03		0.01	
		JUMLAH		**0.09**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

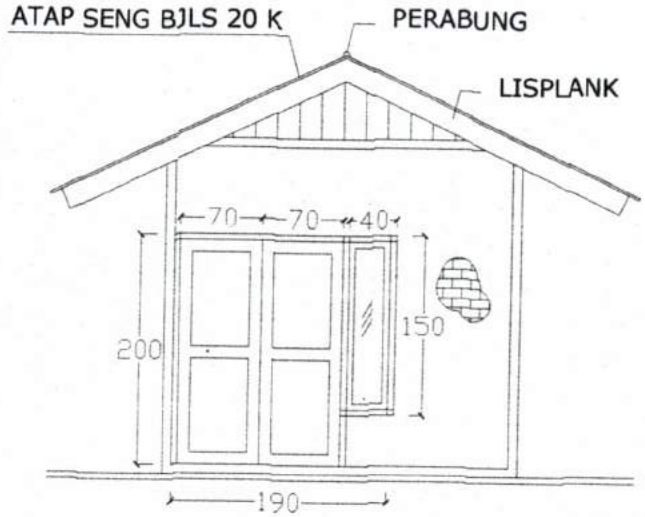
MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN Pekerjaan : **Jendela Kaca**
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
				
	0.40	1.5	0.60	
	0.50	0.40	0.20	
		JUMLAH	**0.80**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

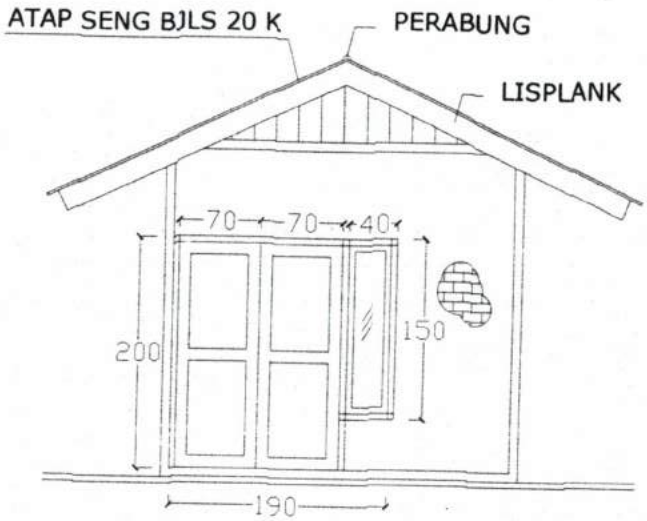
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Ventilasi Jalusi**
Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M')	Tebal (M')	Jumlah	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	1.75	0.15	3	0.79	Jalusi
	1.05	0.02	2	2.10	Singok
	JUMLAH			**2.89**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

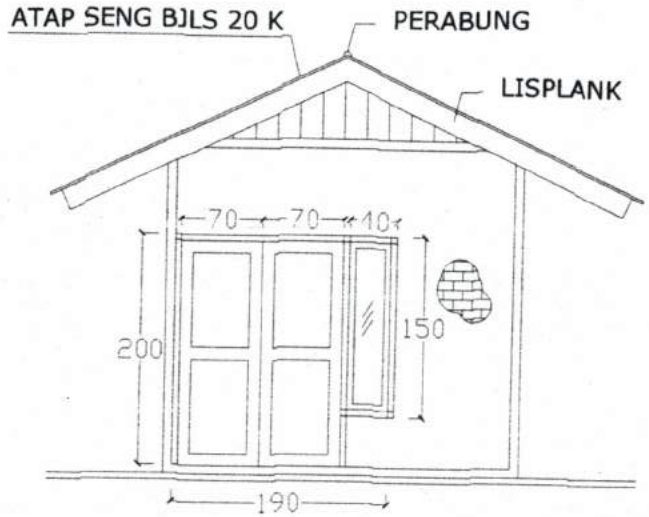
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALIS #REF! **: Galian Tanah Berbatu**
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Engsel Pintu** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Jumlah	Volume (Buah)	KETERANGAN
	6	6.00	
		6.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

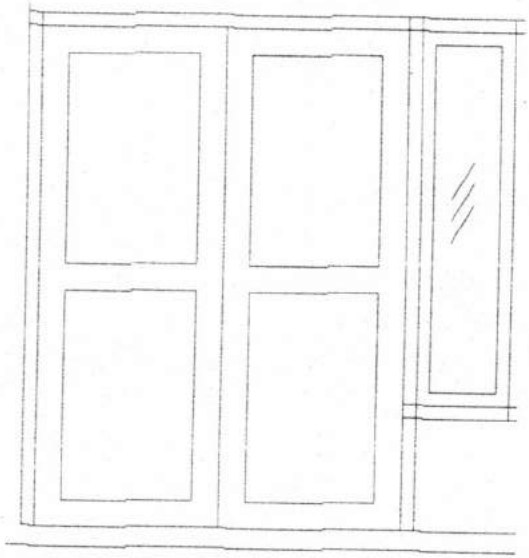
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Grendel Pintu** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Jumlah	Volume (Buah)	KETERANGAN
	2	2.00	
		2.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

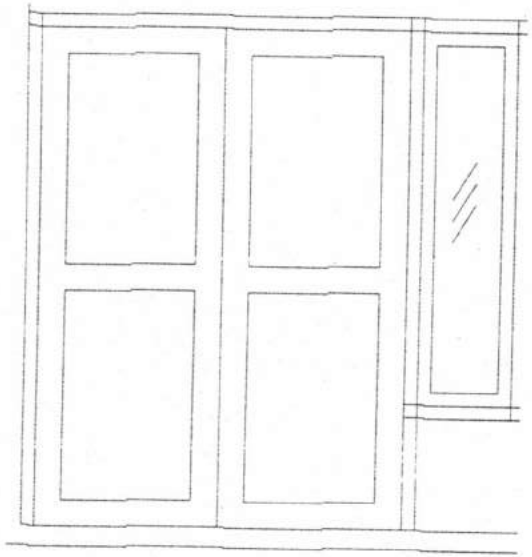
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Kunci Tanam 2 Slaag** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Jumlah	Volume (Buah)	KETERANGAN
	1	1.00	
		1.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

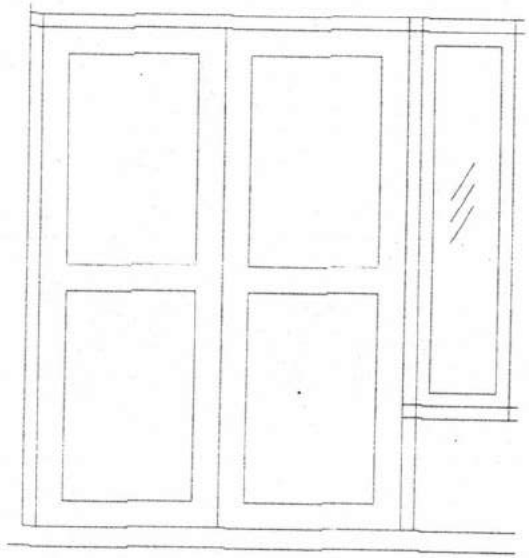
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Engsel Jendela** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Jumlah	Volume (Buah)	KETERANGAN
	2	2.00	
		2.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

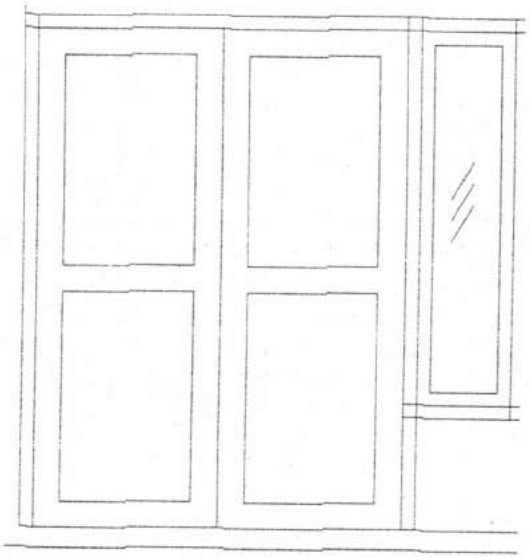
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Kait Angin** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Jumlah	Volume (Buah)	KETERANGAN
	2	2.00	
		2.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

CV. ASIS ENGINERIA

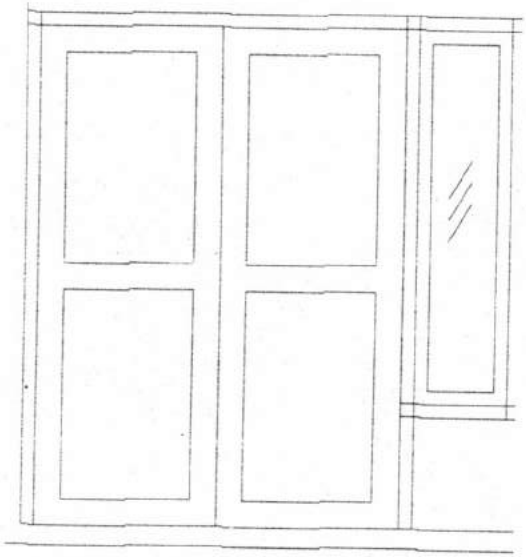
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Rumah Turbin

Pekerjaan : **Grendel Jendela**

SKETSA / GAMBAR	Jumlah	Volume (Buah)	KETERANGAN
	2	2.00	
		2.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

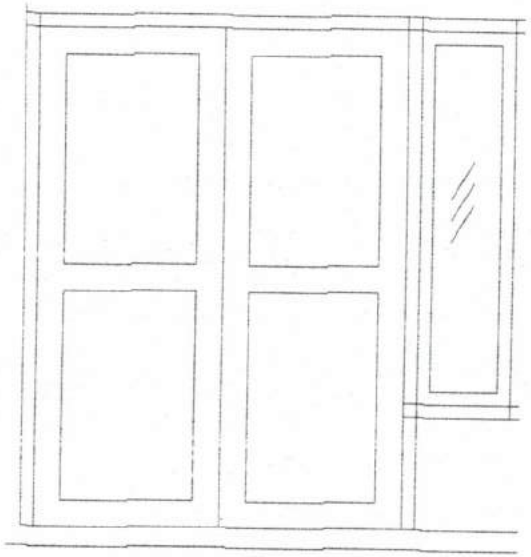
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Hand Vantten** Rumah Turbin

SKETSA / GAMBAR	Jumlah	Volume (Buah)	KETERANGAN
	2	2.00	
		2.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN (AKTUAL CHECK)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA PEKERJAAN	VOLUME	BIAYA SATUAN	BIAYA PEKERJAAN
	KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG								
I.	**PEKERJAAN PONDASI**								
1	Galian Tanah Pondasi	M^3	4.80	20,400.00	97,920.00		5.20	106,080.00	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M^3	1.04	122,100.00	126,984.00		0.90	109,890.00	
3	Aanstanpang Batu Kali	M^3	4.16	188,000.00	782,080.00		3.30	620,400.00	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M^3	14.08	750,500.00	10,567,040.00		6.02	4,518,010.00	
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M^3	1.20	9,700.00	11,640.00		2.70	26,190.00	
	Sub Total I					**11,585,664.00**			**5,380,570.00**
II.	**PEKERJAAN BETON DAN DINDING**								
1	Plesteran Dinding 1:2	M^2	49.60	48,300.00	2,395,680.00		7.20	347,760.00	
2	Pek. Balok 25/30	M^3	0.38	3,819,300.00	1,432,237.50		0.45	1,718,685.00	
	Sub Total II					**3,827,917.50**			**2,066,445.00**
III.	**PEKERJAAN LANTAI**								
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M^3	1.60	122,100.00	195,360.00		0.90	109,890.00	
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M^3	0.80	563,300.00	450,640.00		0.85	478,805.00	
	Sub Total III					**646.000.00**			**588.695.00**
IV.	**INTEK**								
1	Galian Tanah Pondasi	M^3	4.05	20,400.00	82,620.00		21.60	440,640.00	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M^3	0.81	122,100.00	98,901.00		1.20	146,520.00	
3	Aanstanpang Batu Kali	M^3	1.96	188,000.00	368,480.00		2.40	451,200.00	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M^3	14.30	750,500.00	10,732,900.50		7.58	5,688,790.00	
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M^3	1.13	9,700.00	10,961.00		5.85	56,745.00	
6	Coran Lantai	M^3	0.80	550,400.00	440,320.00		0.96	528,384.00	
7	Pintu Air dan Pintu Bendung	M^3	-	8,000,000.00	-		2.00	16,000,000.00	
8	Plesteran	M^2	49.60	48,300.00	2,395,680.00		22.40	1,081,920.00	
	Sub Total IV					**14,129,862.50**			**24,394,199.00**
V.	**TALI BANDAR**								
1	Galian Tanah Pondasi	M^3	66.00	20,400.00	1,346,400.00		90.00	1,836,000.00	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M^3	0.20	122,100.00	24,420.00		2.50	305,250.00	
3	Aanstanpang Batu Kali	M^3	10.80	188,000.00	2,030,400.00		15.00	2,820,000.00	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M^3	22.95	750,500.00	17,223,975.00		19.88	14,916,187.50	
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M^3	15.00	9,700.00	145,500.00		2.70	26,190.00	
6	Coran Lantai	M^3	15.00	550,400.00	8,256,000.00		4.00	2,201,600.00	
7	*Urugan Tanah*	M^3	*15.00*	*9,700.00*	*145,500.00*		*22.88*	*221,887.50*	
8	Plesteran	M^2	216.00	48,300.00	10,432,800.00		80.00	3,864,000.00	
	Sub Total V					**39,604,995.00**			**26,191,115.00**
VI.	**PIPA PESAT**								
1	Pek. Pas. Acor Block	M^2	4.95	645,000.00	3,192,750.00		-	-	
2	Pek. Pas. Sliding Block	M^2	27.44	534,700.00	14,672,168.00		-	-	
3	Pek. Pas. Pipa Pesat	M^1	73.00	1,160,000.00	84,680,000.00		-	-	
4	*Pek. Pas. Perlengkapan Pipa*	*Ls*	*10.00*	*34,800.00*	*348,000.00*		-	-	
	Sub Total VI					**102,892,918.00**			-
	Total					**172,687,357.00**			**58,621,024.00**


Padang, September 2010

PPTK	Pengawas,	Pengawas,	CV. ASIS ENGINERIA
YEFRISON, ST	DIARI FADLI	MARSUPRIADI, Amd	AFRI K. SALIM
NIP. 19740913 2005 01 1 007	NIP. 19810517 2010 01 1 018	NIP. 19720327 2008 01 1 002	Kuasa Direktur

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Galian Tanah Pondasi Kedudukan Mesin**

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi Pondasi (M')	Tinggi Aanstampang (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	2.00	1	0.3	2	5.20	
	JUMLAH				**5.20**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002


CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Urugan Pasir Lantai Kerja**
Kedudukan Mesin

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	2.00	0.10	4.5	0.9	
	JUMLAH			**0.9**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002


CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Aanstampang Batu Kali**
Kedudukan Mesin

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
					
	2.00	0.2	4.5	1.80	
	1.50	0.5	2	1.50	Kedudukan Turbin
		JUMLAH		**3.30**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010/01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 : 002

CV. ASIS ENGINERIA

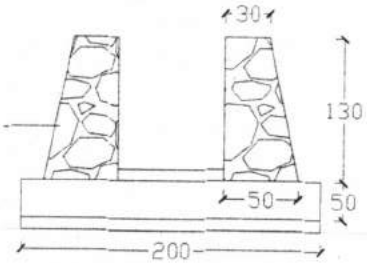
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN Pekerjaan : **Galian Tanah Berbatu** Pekerjaan : **Pasangan Batu Kali**

PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**

LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR Kedudukan Mesin

SKETSA / GAMBAR	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Lebar Koperan (M)	Tinggi (M)	Panjang (M')	Jumlah	**Volume (Buah)**	KETERANGAN
Pasangan Batu Kali 	0.3	0.5	1.0	0.5	0.5	0 8	1	0.62	
	0.3	0.5	1.0	0.5	0.5	4 5	2	3.90	
	1.5	1.5	0.5			2	1	1.50	Kedudukan Turbin
					JUMLAH			**6.02**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

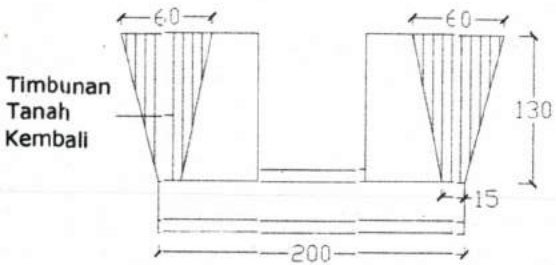
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Timbunan Tanah Kembali**

Kedudukan Mesin

SKETSA / GAMBAR



Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	Jumlah	**Volume (Buah)**	KETERANGAN
0.60	0.15	0.8	4.5	2	2.70	
			JUMLAH		**2.70**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

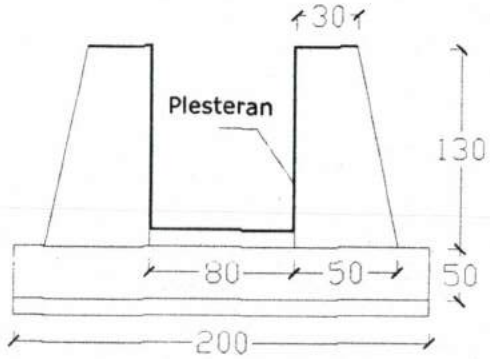
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Plesteran**

Kedudukan Mesin

SKETSA / GAMBAR	Tinggi (M')	Jumlah (Buah)	Lebar Saluran (M')	Lebar Atas (M')	Jumlah (Buah)	Panjang Saluran (M')	**Volume (M^2)**	KETERANGAN
	0.80	2.00	-	-	1	4.5	7.20	
						JUMLAH	**7.20**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

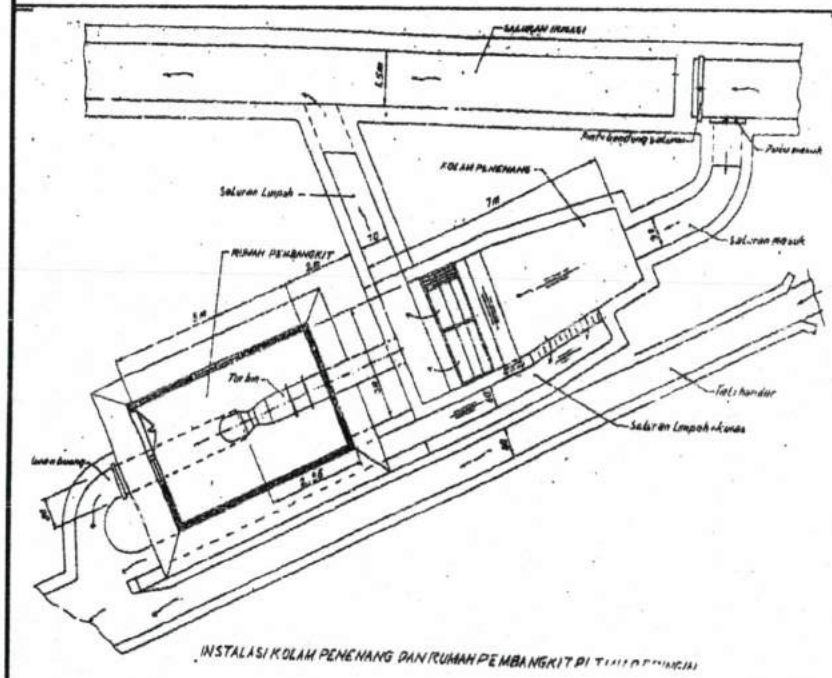
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Pek. Balok 25/30**

Kedudukan Mesin

SKETSA / GAMBAR



INSTALASI KOLAM PENENANG DAN RUMAH PEMBANGKIT PLTMH DESA SUNGAI AUR

Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	Jumlah	**Volume (M3)**	KETERANGAN
3.00	0.25	0.3	2	0.45	
		JUMLAH		**0.45**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002


CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Urugan Pasir Lantai Kerja**
Kedudukan Mesin

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
Urugan Pasir 	2.00	0.10	4.5	0.9	
	JUMLAH			**0.9**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

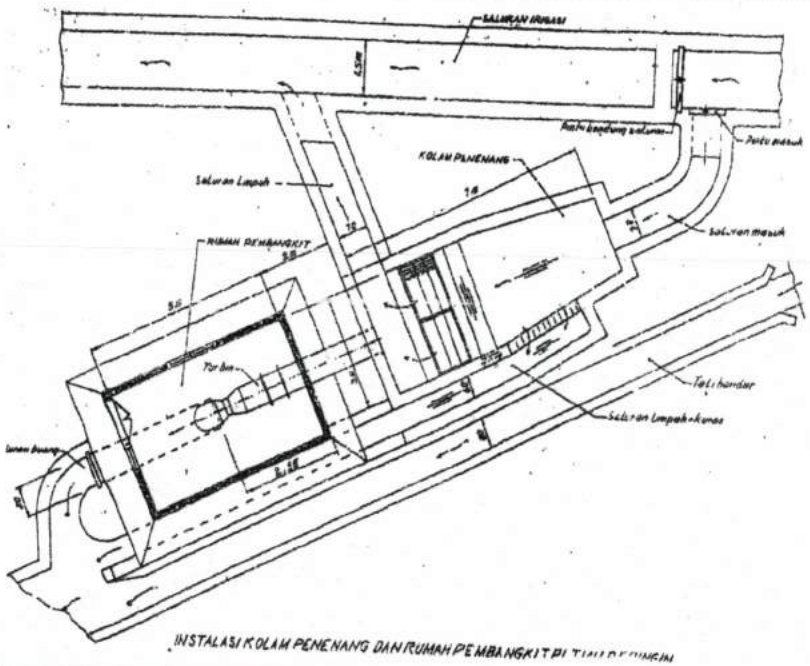
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Cor Lantai 1:2:3**

Kedudukan Mesin

SKETSA / GAMBAR



INSTALASI KOLAM PENENANG DAN RUMAH PEMBANGKIT PLTMH

Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
1.50	0.10	1	0.15	
2.00	0.10	2	0.4	
1.50	0.10	2	0.3	
		JUMLAH	**0.85**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Galian Tanah Pondasi**

INTEK

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi Pondasi (M')	Tinggi Aanstampang (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	2.00	1.3	0.5	6	21.60	
	JUMLAH				**21.60**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002


CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Urugan Pasir Lantai Kerja**
INTEK

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	2.00	0.10	6	1.2	
	JUMLAH			**1.2**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,


MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN Pekerjaan : **Aanstampang Batu Kali**
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR INTEK

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
Aanstampang 	2.00	0.2	6	2.40	
		JUMLAH		**2.40**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

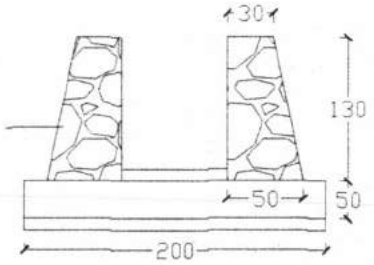
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN Pekerjaan : **Galian Tanah Berbatu** Pekerjaan : **Pasangan Batu Kali**

PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**

LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR INTEK

SKETSA / GAMBAR	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Lebar Koporan (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	Jumlah	**Volume (Buah)**	KETERANGAN
Pasangan Batu Kali 	0.3	0.5	1.3	0.6	0.5	7	2	7.58	
						JUMLAH		**7.58**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

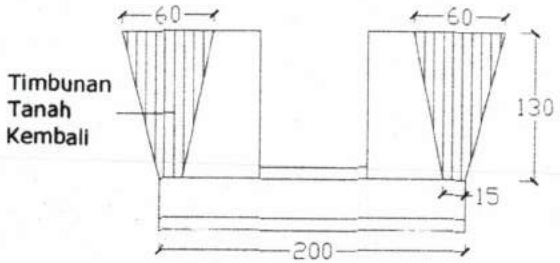
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Timbunan Tanah Kembali**

INTEK

SKETSA / GAMBAR	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	Jumlah	**Volume (Buah)**	KETERANGAN
	0.60	0.15	1.3	6	2	5.85	
				JUMLAH		**5.85**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

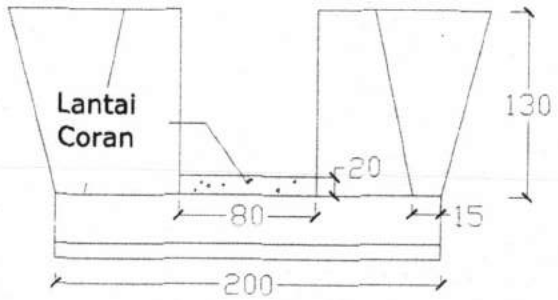
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Coran Lantai**
INTEK

SKETSA / GAMBAR



Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (Buah)**	KETERANGAN
0.80	0.2	6	0.96	
JUMLAH			**0.96**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

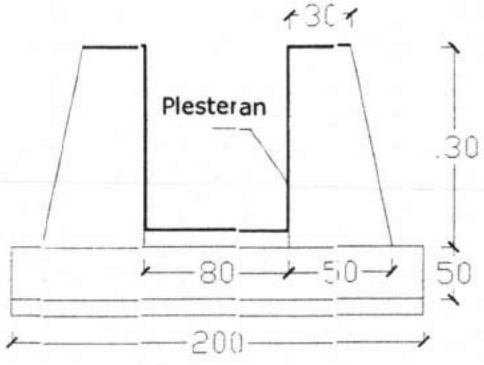
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Plesteran**

INTEK

SKETSA / GAMBAR



Tinggi (M')	Jumlah (Buah)	Lebar Saluran (M')	Lebar Atas (M')	Jumlah (Buah)	Panjang Saluran (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
1.30	2.00	-	0.30	2	7	22.4	
					JUMLAH	**22.40**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 200 1 011 018

Pengawas,

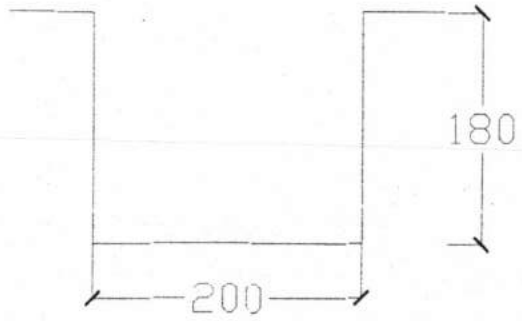
MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN Pekerjaan : **Galian Tanah Pondasi**
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR Sal. Pembawa

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (Buah)**	KETERANGAN
	2.00	1.8	25	90.00	
				90.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

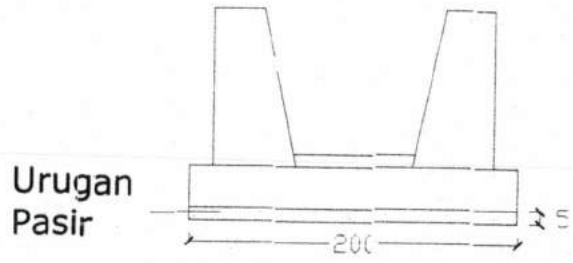
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Urugan Pasir Lantai Kerja**

Sal. Pembawa

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M)	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	2.00	0.05	25.00	2.50	
		JUMLAH		**2.50**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002


CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Aanstampang Batu Kali**
Sal. Pembawa

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
Aanstampang 	1.20	0.50	25.00	15.00	
		JUMLAH		**15.00**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

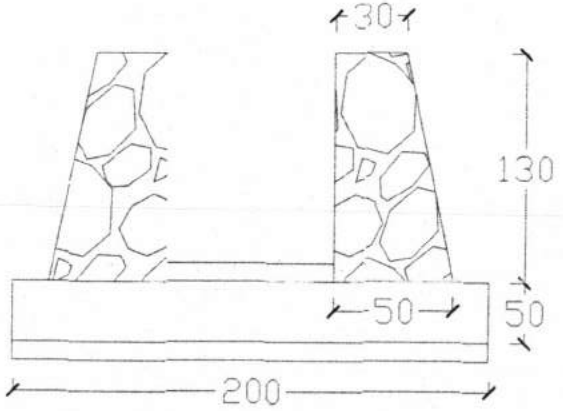
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Pasangan Batu Kali**

Sal. Pembawa

SKETSA / GAMBAR



Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	Jumlah	Volume (M^3)	KETERANGAN
0.30	0.50	1.30	0.60	0.50	25.00	2	19.88	
						JUMLAH	19.88	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

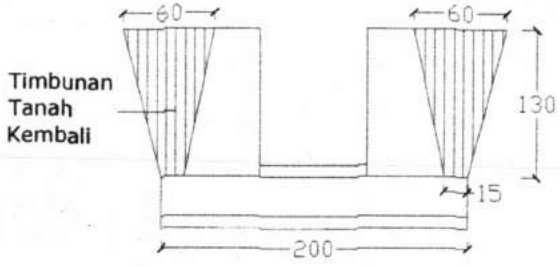
ELWAN ASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Timbunan Tanah Kembali**
Sal. Pembawa

SKETSA / GAMBAR



Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	Jumlah	**Volume (Buah)**	KETERANGAN
0.60	0.15	0.8	4.5	2	2.70	
			JUMLAH		**2.70**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

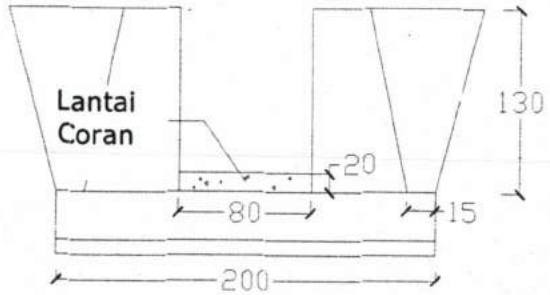
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Coran Lantai**

Sal. Pembawa

SKETSA / GAMBAR	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	Volume (M^3)	KETERANGAN
	0.80	0.20	25.00	4.00	
		JUMLAH		4.00	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

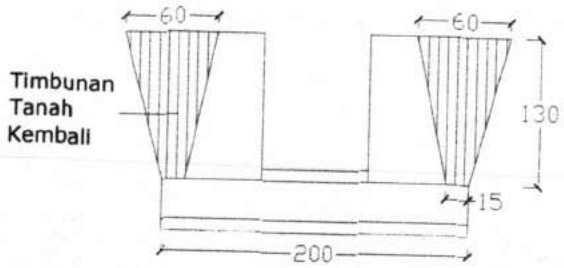
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Timbunan Tanah Kembali**

Sal. Pembawa

SKETSA / GAMBAR	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	Jumlah	Volume (Buah)	KETERANGAN
	0.60	0.15	1.3	25	2	22.88	
				JUMLAH		**22.88**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 : 002

CV. ASIS ENGINERIA

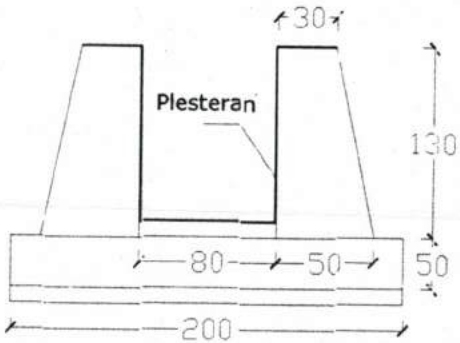
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SEPASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Plesteran**

Sal. Pembawa

SKETSA / GAMBAR	Tinggi (M')	Jumlah (Buah)	Lebar Saluran (M')	Lebar Atas (M')	Jumlah (Buah)	Panjang Saluran (M')	Volume (M^3)	KETERANGAN
	1.30	2.00	-	0.3	2.00	25	80.00	
						JUMLAH		80.00

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VO LUME	HARGA SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA PEKERJAAN	VO LUME	BIAYA SATUAN	BIAYA PEKERJAAN
	BAK PENENANG								
I.	**PEKERJAAN PONDASI**								
1	Galian Tanah Pondasi	M^3	-	20,400.00	-			-	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M^3	27.00	122,100.00	3,296,700.00		11.71	1,429,943.63	
3	Aanstanpang Batu Kali	M^3	20.88	188,000.00	3,925,440.00		13.63	2,561,970.00	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M^3	48.51	750,500.00	36,406,755.00		36.84	27,645,042.75	
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M^3		9,700.00	-			-	
	Sub Total I					**43,628,895.00**			**31,636,956.38**
II.	**PEKERJAAN BETON DAN DINDING**								
1	Plesteran Dinding 1:2	M^2	135.60	48,300.00	6,549,480.00		96.20	4,646,218.50	
2	Pek. Balok 25/30	M^3	6.98	3,720,600.00	25,951,185.00		7.96	29,606,674.50	
3	Pek. Plat	M^3	0.88	4,292,400.00	3,755,850.00		0.32	1,352,106.00	
4	Pek. Pas. Saringan	Ls	1.00	2,470,000.00	2,470,000.00		2.00	4,940,000.00	
5	Pintu Air	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1.00	1,500,000.00	
	Sub Total II					**40,226,515.00**			**42,044,999.00**
III.	**PEKERJAAN LANTAI**								
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M^3	13.50	122,100.00	1,648,350.00		1.81	220,695.75	
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M^3	5.63	563,300.00	3,168,562.50		3.89	2,188,420.50	
	Sub Total III					**4,816,912.50**			**2,409,116.25**
IV.	**PEKERJAAN PELIMPAH**								
1	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M^3	0.14	84,700.00	11,858.00		1.91	162,115.80	
2	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	M^3	0.07	122,100.00	8,547.00		1.28	155,799.60	
3	Pas. Pondasi Batu Kali 1:4	M^3	1.92	603,100.00	1,155,539.60		17.68	10,662,808.00	
4	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M^3	0.06	563,300.00	35,487.90		1.85	1,042,668.30	
	Sub Total IV					**1,211,432.50**			**12,023,391.70**
	Total					**89,883,755.00**			**88,114,463.33**

Padang, September 2010

PPTK	Pengawas,	Pengawas,	CV. ASIS ENGINERIA
YEFRISON, ST	DIARI FADLI	MARSUPRIADI, Amd	AFRI K. SALIM
NIP. 19740913 2005 01 1 007	NIP. 19810517 2010 01 1 018	NIP. 19720327 2008 01 1 002	Kuasa Direktur

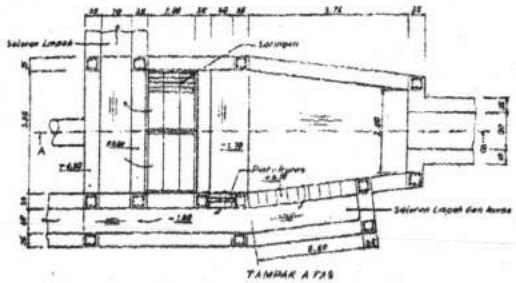
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

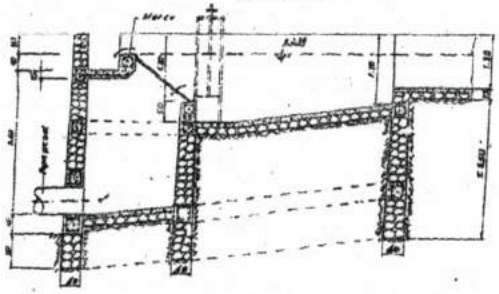
KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Galian Pondasi**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR





KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Nomor	Panjang (M')	Lebar Bawah (M')	Lebar Atas (M')	Tinggi (M')	Jumlah	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
I	2.00	0.45	0.45	0.5	1	0.45	
II	3.75	0.45	0.45	0.5	2	1.69	
III	3.00	0.45	0.45	0.5	1	0.68	
IV	3.00	0.45	0.45	0.5	1	0.68	
V	1.85	0.45	0.45	0.5	1	0.42	
VI	0.50	0.45	0.45	0.5	1	0.11	
VII	1.00	0.45	0.45	0.5	1	0.23	
VIII	0.70	0.45	0.45	0.5	1	0.16	
IX	0.60	0.45	0.45	0.5	1	0.14	
X	2.50	0.45	0.45	0.5	1	0.56	
XI	2.90	0.45	0.45	0.5	1	0.65	
XII	3.75	2.00	3.00	0.5	1	4.69	
XIII	0.85	3.00	3.00	0.5	1	1.28	
	JUMLAH					**11.71**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

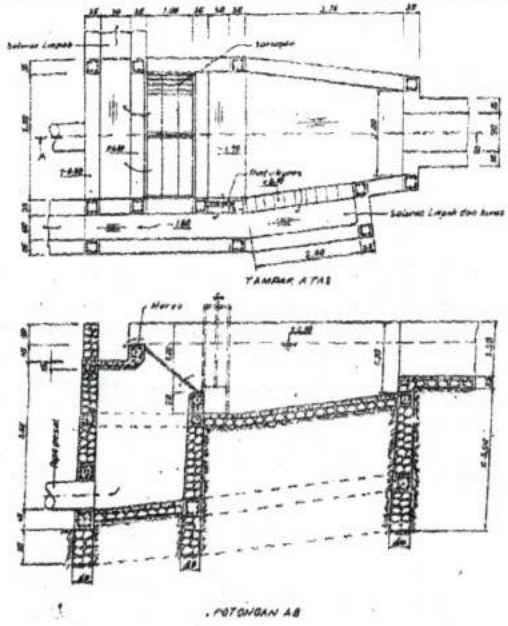
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Aanstanpang**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN PASAMAN

Nomor	Panjang (M')	Lebar Bawah (M')	Lebar Atas (M')	Tinggi (M')	Jumlah	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
I	2.00	0.60	0.60	0.5	1	0.60	
II	3.75	0.60	0.60	0.5	2	2.25	
III	3.00	0.60	0.60	0.5	1	0.90	
IV	3.00	0.60	0.60	0.5	1	0.90	
V	1.85	0.60	0.60	0.5	1	0.56	
VI	0.50	0.60	0.60	0.5	1	0.15	
VII	1.00	0.60	0.60	0.5	1	0.30	
VIII	0.70	0.60	0.60	0.5	1	0.21	
IX	0.60	0.60	0.60	0.5	1	0.18	
X	2.50	0.60	0.60	0.5	1	0.75	
XI	2.90	0.60	0.60	0.5	1	0.87	
XII	3.75	2.00	3.00	0.5	1	4.69	
XIII	0.85	3.00	3.00	0.5	1	1.28	
	JUMLAH					**13.63**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

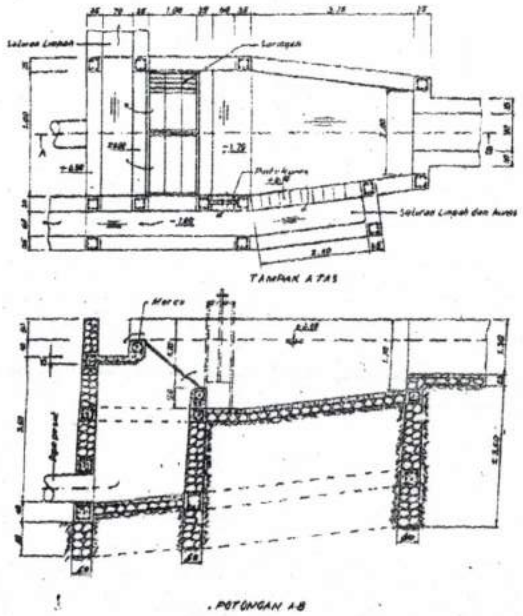
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Pasangan Batu Kali**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Nomor	Panjang (M')	Lebar Bawah (M')	Lebar Atas (M')	Tinggi (M')	Jumlah	Volume (M^3)	KETERANGAN
I	2.00	0.45	0.35	2.75	1	2.20	
II	3.75	0.45	0.35	5.20	2	15.60	
III	3.00	0.45	0.35	2.25	1	1.50	
IV	3.00	0.45	0.35	3.75	1	4.50	
V	1.85	0.45	0.35	5.10	1	3.03	
VI	0.50	0.45	0.35	2.75	1	0.55	
VII	1.00	0.45	0.35	5.05	1	1.62	
VIII	0.70	0.45	0.35	5.05	1	1.13	
IX	0.60	0.45	0.35	1.30	1	0.31	
X	2.50	0.45	0.35	1.30	1	1.30	
XI	2.90	0.45	0.35	1.30	1	1.51	
XII	3.75	2.00	3.00	0.30		2.81	
XIII	0.85	3.00	3.00	0.30		0.77	
	JUMLAH					**36.84**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

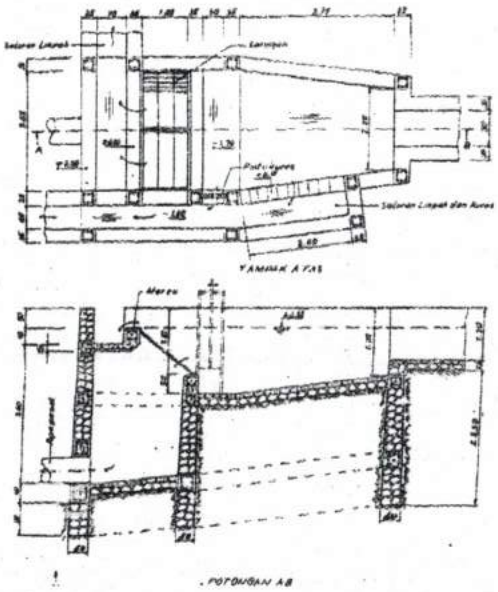
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Plesteran**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Nomor	Panjang (M')	Lebar Bawah (M')	Lebar Atas (M')	Tinggi (M')	Jumlah	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	0.60			1.30	1	0.78	
	2.50			1.30	1	3.25	
	2.90			1.30	1	3.77	
	7.00			1.30	2	9.10	
	7.00			1.30	2	9.10	
	JUMLAH					**26.00**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

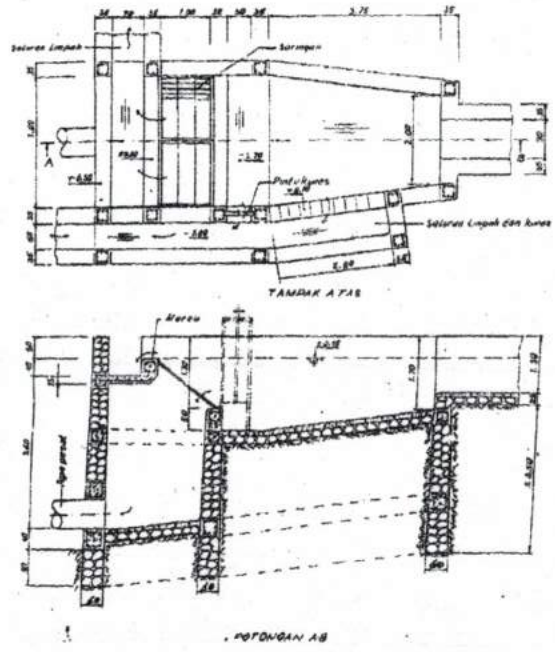
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Plesteran**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Nomor	Panjang (M')	Lebar Bawah (M')	Lebar Atas (M')	Tinggi (M')	Jumlah	**Volume (M^2)**	KETERANGAN
I	2.00			2.75	1	5.50	
II	3.75			5.20	2	19.50	
III	3.00			2.25	1	6.75	
IV	3.00			3.75	1	11.25	
V	1.85			5.10	1	9.44	
VI	0.50			2.75	1	1.38	
VII	1.00			5.05	1	5.05	
VIII	0.70			5.05	1	3.54	
IX	0.60			1.30	1	0.78	
X	2.50			1.30	1	3.25	
XI	2.90			1.30	1	3.77	
	JUMLAH					**70.20**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

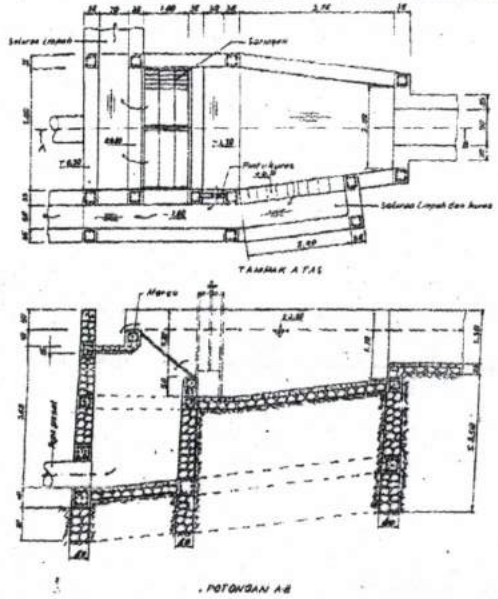
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Coran Kolom**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Kolom	Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	Banyak	Volume (M^3)	KETERANGAN
I	0.25	0.30	3.50	2	0.53	
II	0.25	0.30	3.50	1	0.26	
III	0.25	0.30	3.50	2	0.53	
IV	0.25	0.30	3.80	2	0.57	
V	0.25	0.30	5.30	2	0.80	
VI	0.25	0.30	5.80	2	0.87	
VII	0.25	0.30	1.30	3	0.29	
	JUMLAH				**3.84**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

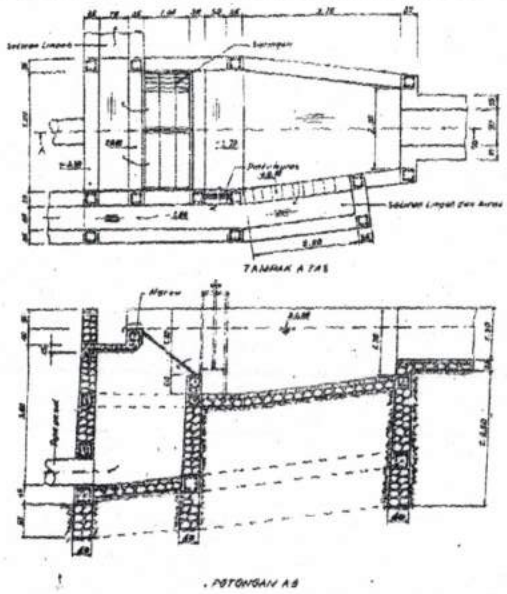
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Coran Balok**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Balok/ Sloff	Lebar (M')	Tinggi (M')	Panjang (M')	Banyak		Volume (M^3)	KETERANGAN
I	0.25	0.30	2.00			0.15	
II	0.25	0.30	2.00			0.15	
III	0.25	0.30	3.00			0.23	
IV	0.25	0.30	3.00			0.23	
V	0.25	0.30	3.00			0.23	
VI	0.25	0.30	3.00	3		0.23	
VII	0.25	0.30	3.00			0.23	
VIII	0.55	0.55	3.00			0.91	
	JUMLAH					**2.33**	
	JUMLAH PINDAHAN					**3.84**	
	JUMLAH					**6.17**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

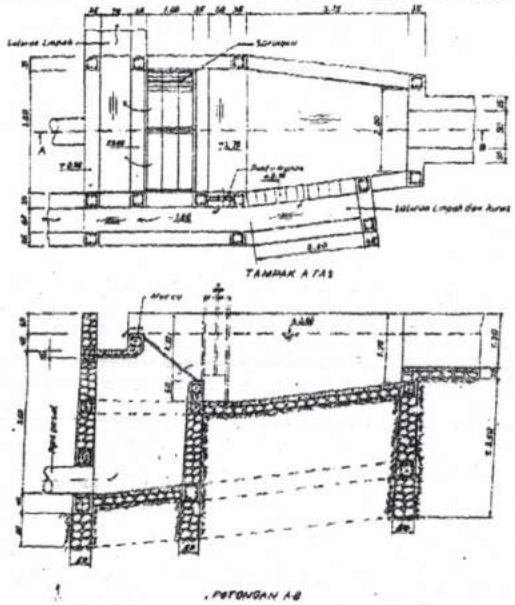
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Coran balok**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIH-PASAMAN

Balok	Panjang (M1)	Lebar (M1)	Tinggi (M1)	Jumlah	Volume (M^3)	KETERANGAN
I	0.25	0.30	3.75	2	0.56	
II	0.25	0.30	0.50	2	0.08	
III	0.25	0.30	1.00	2	0.15	
IV	0.25	0.30	0.70	2	0.11	
V	0.25	0.30	3.75	2	0.56	
VI	0.25	0.30	0.50	2	0.08	
VII	0.25	0.30	1.00	2	0.15	
VIII	0.25	0.30	0.70	2	0.11	
	JUMLAH				**1.79**	
	JUMLAH PINDAHAN				**6.17**	
	JUMLAH				**7.96**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

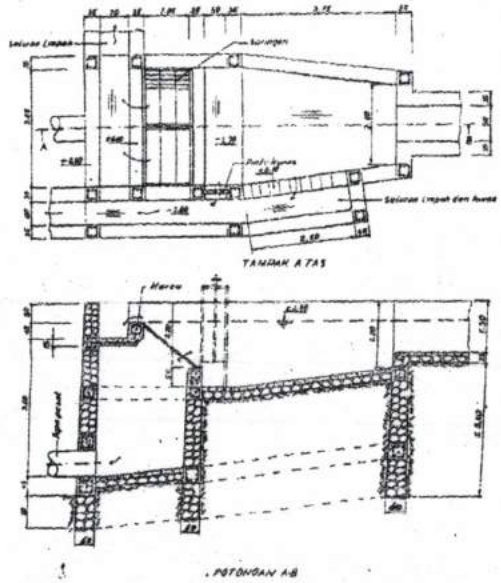
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Coran Plat Saluran**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

plat	Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	Banyak		Volume (M^3)	KETERANGAN
	0.70	0.15	3.00			0.32	Plat Saluran
	JUMLAH					0.32	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

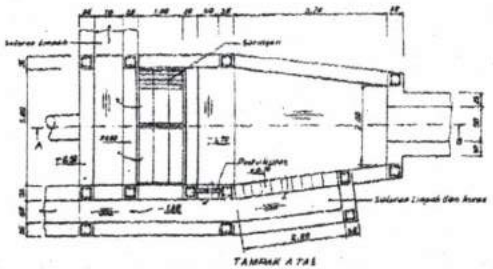
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

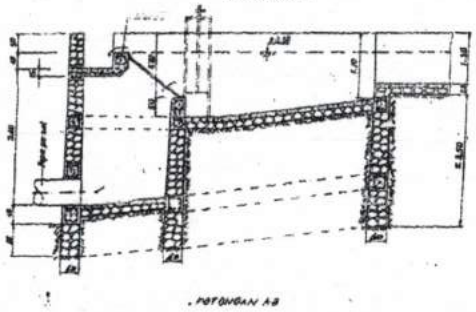
KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Urugan Bawah Lantai**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR





KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Lantai	Panjang (M')	Lebar (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
I	3.75	2.00	3.00	0.1	0.94	
II	0.85	3.00	3.00	0.1	0.26	
II	2.05	3.00	3.00	0.1	0.62	
	JUMLAH				**1.81**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

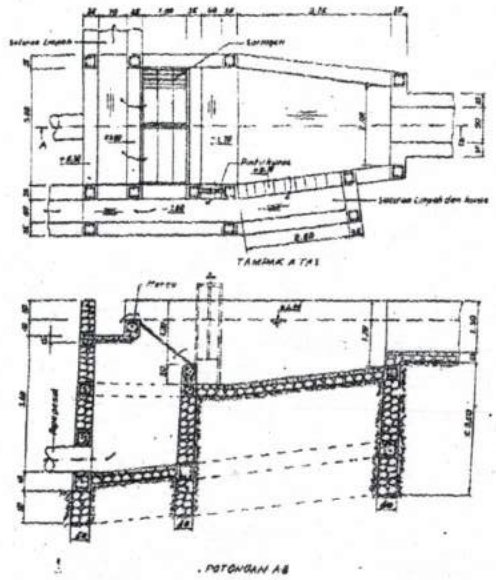
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Cor 1:2:3**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Lantai	Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	Banyak	Volume (M^3)	KETERANGAN
I	3.75	2.50	0.20	1	1.88	
II	0.85	3.00	0.20	1	0.51	
III	2.50	3.00	0.20	1	1.50	
			JUMLAH		3.89	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

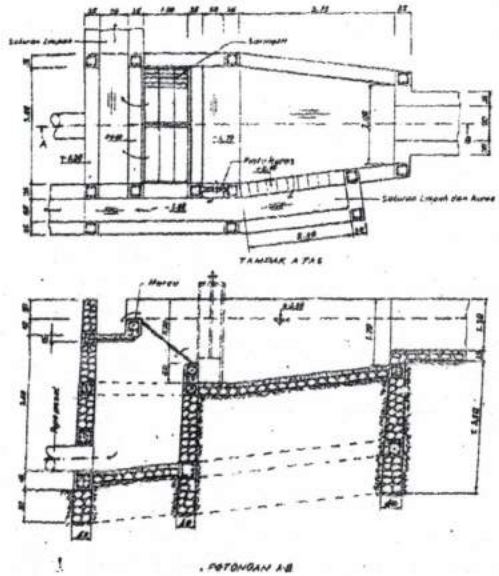
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Urugan Tanah**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH SERINGIN-PASAHAN

Lantai	Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	Banyak	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	2.50	0.60	0.15	1	0.23	Saluran Limpah
	7.00	0.60	0.15	1	0.63	Saluran Limpah
	3.60	0.60	0.15	1	0.32	Saluran Limpah
	7.00	0.70	0.15	1	0.74	Saluran Limpah
	JUMLAH				**1.91**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

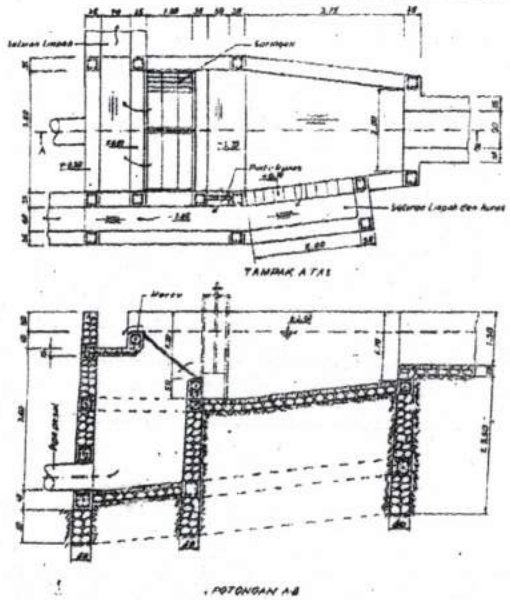
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Urugan Pasir**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Lantai	Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')	Banyak	**Volume (M^3)**	KETERANGAN
	2.50	0.60	0.10	1	0.15	Saluran Limpah
	7.00	0.60	0.10	1	0.42	Saluran Limpah
	3.60	0.60	0.10	1	0.22	Saluran Limpah
	7.00	0.70	0.10	1	0.49	Saluran Limpah
	JUMLAH				**1.28**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

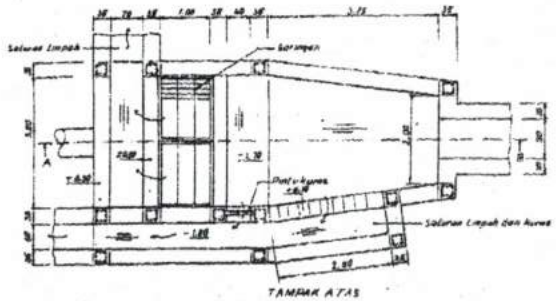
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

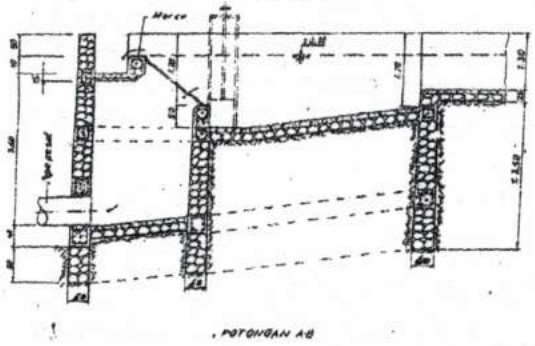
KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Pasangan Batu Kali**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR





Nomor	Panjang (M')	Lebar Bawah (M')	Lebar Atas (M')	Tinggi (M')	Jumlah	Volume (M^3)	KETERANGAN
	0.60	0.45	0.35	1.30	1	0.31	
	2.50	0.45	0.35	1.30	1	1.30	
	2.90	0.45	0.35	1.30	1	1.51	
	7.00	0.45	0.35	1.30	2	7.28	
	7.00	0.45	0.35	1.30	2	7.28	
	JUMLAH					**17.68**	

KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

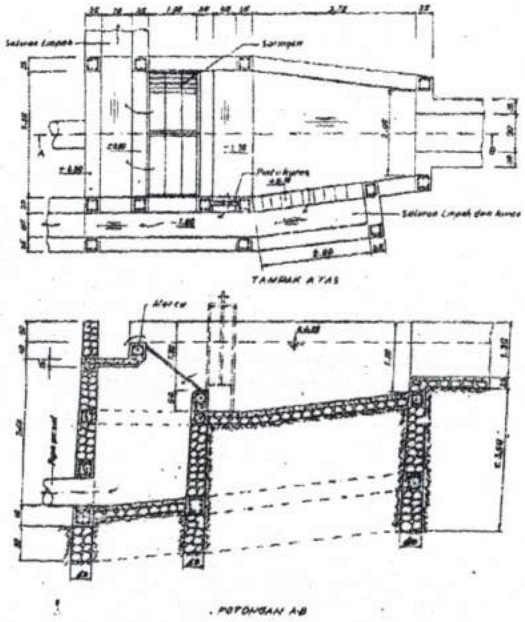
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Lantai Cor 1 : 2 : 3**

Bak Penenang

SKETSA / GAMBAR



KOLAM PENENANG PLTMH BERINGIN-PASAMAN

Lantai	Panjang (M')	Lebar (M')	Tinggi (M')			Volume (M^3)	KETERANGAN
	2.50	0.60	0.15			0.23	Lantai Saluran Limpah Kuras
	2.90	0.60	0.15			0.26	
	7.00	0.60	0.15			0.63	
	7.00	0.70	0.15			0.74	Lantai Saluran Limpah Kuras
			JUMLAH			1.85	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA PEKERJAAN
	REHAB SALURAN IRIGASI					
I.	**PEKERJAAN PONDASI**					
1	Galian Tanah Pondasi	M^3	663.30	20,400.00	13,531,320.00	
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	M^3	-	122,100.00	-	
3	Aanstanpang Batu Kali	M^3	28.56	188,000.00	5,369,280.00	
4	Pasangan Pondasi Batu Kali 1:2	M^3	184.75	750,500.00	138,654,875.00	
5	Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	M^3	41.28	9,700.00	400,367.50	
	Sub Total I					**157,955,842.50**
II.	**PEKERJAAN BETON DAN DINDING**					
1	Plesteran Dinding 1:2	M^2	559.20	48,300.00	27,009,360.00	
2	Pek. Saluran Gantung	M^3	10.40	3,720,600.00	38,675,637.00	
3	Pek. Balok 15/20	M^3	0.3791	3,720,600.00	1,410,405.05	
	Sub Total II					**67,095,402.05**
III.	**PEKERJAAN LANTAI**					
1	*Pek. Pasir Urug Bawah Lantai*	M^3	-	*122,100.00*	-	
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	M^3	55.53	563,300.00	31,280,049.00	
	Sub Total III					**31,280,049.00**
	Total					**256,331,293.55**

Padang, September 201

PPTK

YEFRISON, ST
NIP. 19740913 2005 01 1 007

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ASIS ENGINERIA

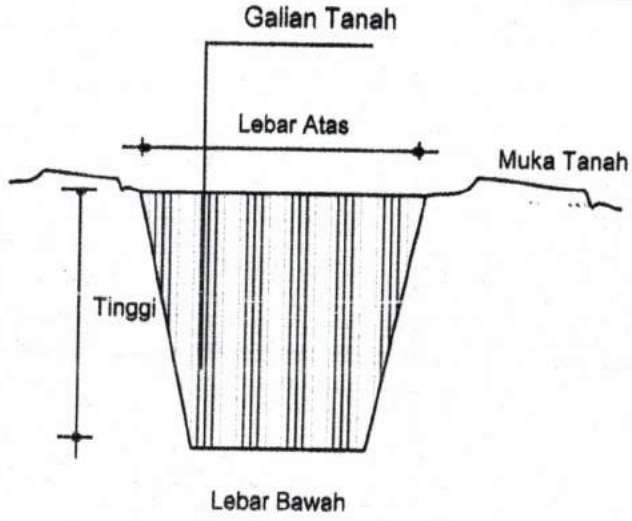
AFRI K. SALIM
Kuasa Direktur

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : : **PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Galian Tanah Biasa**
Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR



Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Jml	**Volume (M3)**	KETERANGAN
2.50	1.50	2.00	1.20	1	6.00	Pintu Masuk Saluran
7.00	1.50	2.00	1.20	1	16.80	Pintu Masuk Saluran
9.50	**JUMLAH**				**22.80**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : **: PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO**
LOKASI : : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : Galian Tanah Biasa
Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR	Panjang (M)	Tinggi (M')	Lebar (M')	**Volume (M3)**	KETERANGAN
	7.00	1.50	5.00	52.50	Rumah Turbin
	7.00	1.30	5.00	45.50	Kolam Penenang
	25.00	1.30	1.50	48.75	Saluran Buang Kesungai
	95.00	1.30	1.50	185.25	Saluran Buang Kesungai
	134.00	**JUMLAH**		**332.00**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

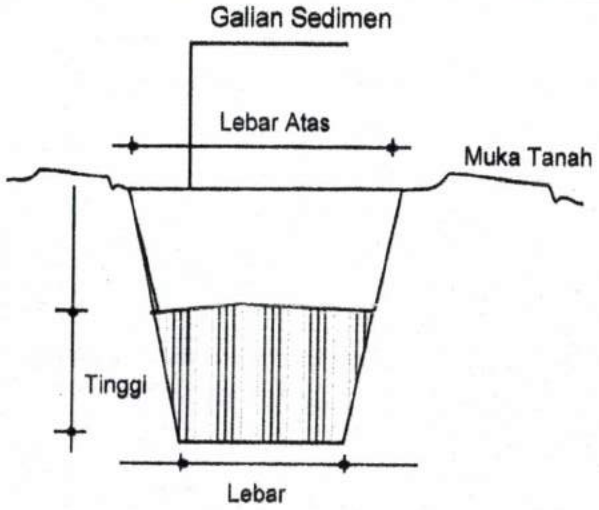
BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Galian Sedimen**

Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR



Sta	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Jml	**Volume (M1)**	KETERANGAN
0 + 000							
	120.00	0.50			1	120.00	Galian Sedimen
0 + 120							
0 + 000							
	188.50	0.30			1	188.50	Galian Sedimen
0 + 189							
			JUMLAH			**308.50**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

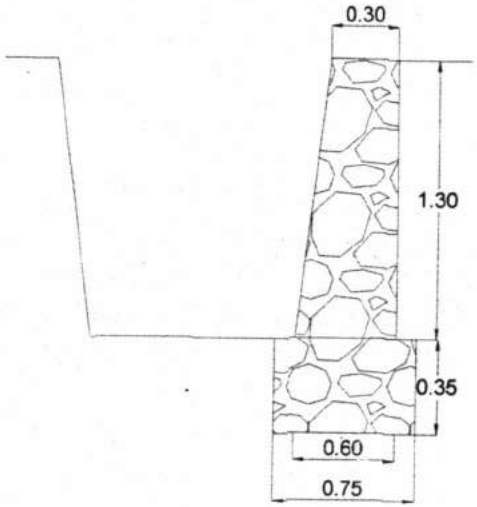
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Aanstanpang**

Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR		BADAN PASANGAN			KOPORAN				
	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	Jml	**Volume (M3)**	KET
	99.00				0.30	0.75	1	22.27	Pas. Baru Ka
	3.00				0.30	0.75	1	0.68	Pasang Kembali Ka
	11.00				0.30	0.75	1	2.47	Pasang Kembali Saluran Ka
	3.00				0.30	0.75	1	0.68	Pasang Sayap Ka
	3.00				0.30	0.75	1	0.68	Pasang Sayap Ki
	8.00				0.30	0.75	1	1.80	Pasang Kembali Saluran Ka
	127.00	**JUMLAH**						**28.56**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

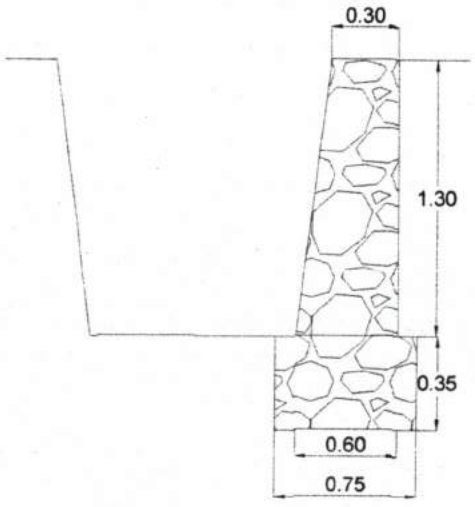
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Pasangan Batu Kali 1 : 2**
Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR	BADAN PASANGAN			KOPORAN				
	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	Jml	**Volume (M3)**	KET
	99.00	1.30	0.30	0.60	0.35	0.75	1	83.90	Pas. Baru Ka
	3.00	1.30	0.30	0.60	0.35	0.75	1	2.54	Pasang Kembali Ka
	11.00	1.30	0.30	0.60	0.35	0.75	1	9.32	Pasang Kembali Saluran Ka
	3.00	1.30	0.30	0.60	0.35	0.75	1	2.54	Pasang Sayap Ka
	3.00	1.30	0.30	0.60	0.35	0.75	1	2.54	Pasang Sayap Ki
	8.00	1.30	0.30	0.60	0.35	0.75	1	6.78	Pasang Kembali Saluran Ka
	127.00	**JUMLAH**						**107.63**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

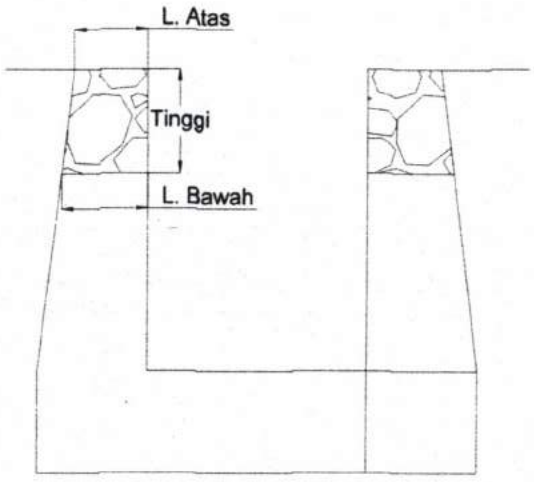
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Pasangan Batu Kali 1 : 2**
Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR	NO.	Panjang (M')	BADAN PASANGAN Tinggi (M')	BADAN PASANGAN Lebar Atas (M')	BADAN PASANGAN Lebar Bawah (M')	KOPORAN Tinggi (M')	KOPORAN Lebar (M')	Jml	**Volume (M3)**	KET
	2	47.50	0.40	0.30	0.50	-	-	2	15.20	Pasang Baru Kiri & Kanan
	7	24.00	0.30	0.30	0.50	-	-	1	2.88	Pasang Baru Kiri
	7	13.00	0.50	0.30	0.50	-	-	1	2.60	Pasang Baru Kanan
	8	106.48	0.50	0.30	0.50	-	-	2	42.59	Pasang Baru Kiri
	9	5.00	0.50	0.30	0.50	-	-	1	1.00	Pasang Baru Kanan
	9	5.00	1.30	0.30	0.60	0.35	0.75	1	4.24	Pasang Baru Kanan
		200.98	**JUMLAH**						**68.51**	
			TOTAL JUMLAH I + II						**176.14**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana


BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Timbunan Tanah Kembali**

Rehab Saluran

SKET'SA / GAMBAR	BADAN PASANGAN				KOPORAN				
	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	Jml	**Volume (M3)**	KET
	99.00	1.30	0.50	-			1	32.18	Pas. Baru Ka
	3.00	1.30	0.50	-			1	0.98	Pasang Kembali Ka
	11.00	1.30	0.50	-			1	3.58	Pasang Kembali Saluran Ka
	3.00	1.30	0.50	-			1	0.98	Pasang Sayap Ka
	3.00	1.30	0.50	-			1	0.98	Pasang Sayap Ki
	8.00	1.30	0.50	-			1	2.60	Pasang Kembali Saluran Ka
	127.00			**JUMLAH**				**41.28**	



Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengaw

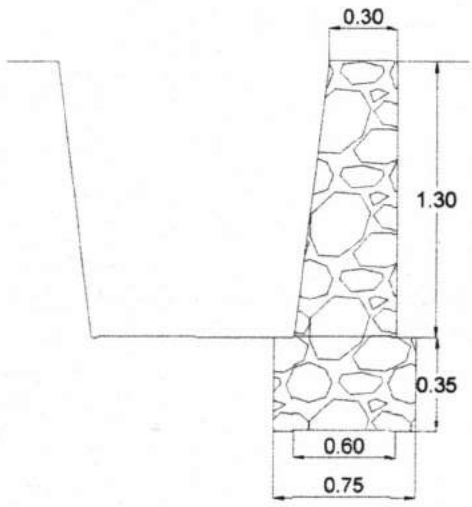
MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR
Rehab Saluran
Pekerjaan : **Plesteran Dinding 1:2**

SKETSA / GAMBAR	BADAN PASANGAN				KOPORAN				
	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar Atas (M')	Lebar Bawah (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	Jml	**Volume (M2)**	KET
	99.00	1.30	0.30				1	158.40	Pas. Baru Ka
	3.00	1.30	0.30				1	4.80	Pasang Kembali Ka
	11.00	1.30	0.30				1	17.60	Pasang Kembali Saluran Ka
	3.00	1.30	0.30				1	4.80	Pasang Sayap Ka
	3.00	1.30	0.30				1	4.80	Pasang Sayap Ki
	8.00	1.30	0.30				1	12.80	Pasang Kembali Saluran Ka
	127.00	**JUMLAH**						**203.20**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

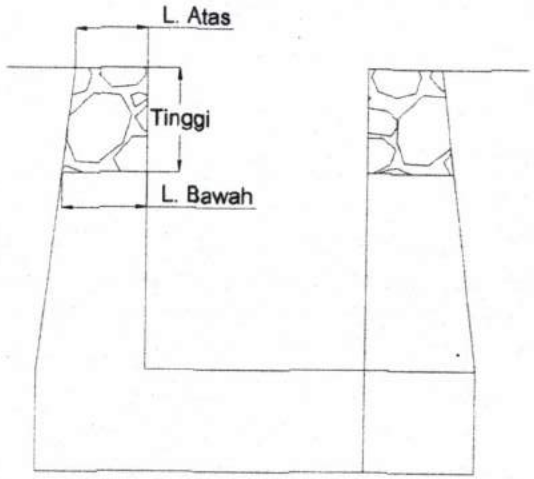
CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan **: Plesteran Dinding 1:2**
Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR	NO.	Panjang (M')	BADAN PASANGAN Tinggi (M')	BADAN PASANGAN Lebar Atas (M')	BADAN PASANGAN Lebar Bawah (M')	KOPORAN Tinggi (M')	KOPORAN Lebar (M')	Jml	Volume (M3)	KET
	2	47.50	1.30	0.30				2	76.00	Pasang Baru Kiri & Kanan
	7	24.00	1.30	0.30				1	38.40	Pasang Baru Kiri
	7	13.00	1.30	0.30				1	20.80	Pasang Baru Kanan
	8	128.00	1.30	0.30				2	204.80	Pasang Baru Kiri
	9	5.00	1.30	0.30				1	8.00	Pasang Baru Kanan
	9	5.00	1.30	0.30				1	8.00	Pasang Baru Kanan
		222.50	**J U M L A H**						**356.00**	
			TOTAL JUMLAH I + II						**559.20**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

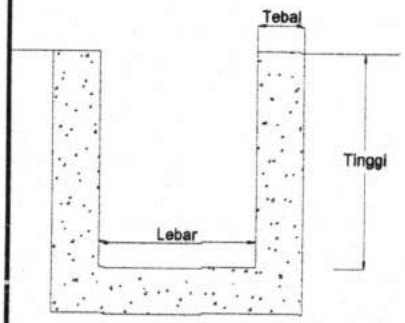
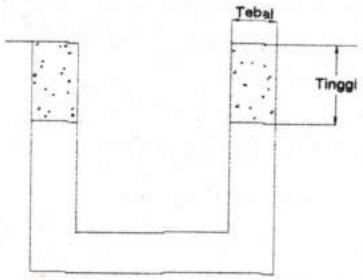
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Beton Bertulang (Sal. Gantung)**

Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR	NO.	Panjang (M')	Tinggi (M')	Tebal (M')	Lebar Lantai (M')	Tebal (M')	Jml	**Volume (M3)**	KET
		16.50	1.30	0.15	1.10	0.15	1	9.16	Saluran Gantung
		16.50	0.50	0.15	-	-	1	1.24	Tambahan Sal. Gantung Kiri& Kanan
									
		33.00			**JUMLAH**			**10.40**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengaw

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

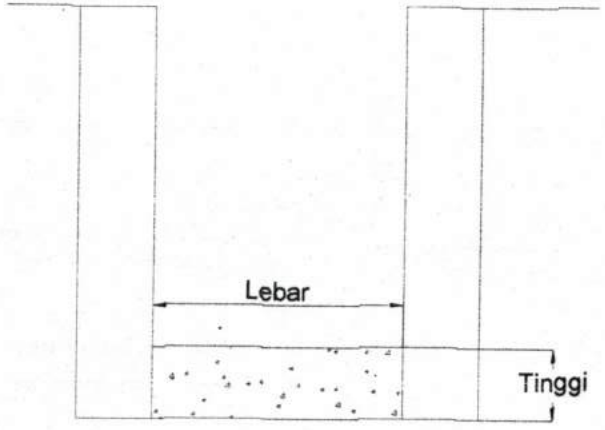
ELWAMASRI
Pelaksana

BACK UP DATA
PERHITUNGAN VOLUME

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN 1(SATU) UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
LOKASI : SERASAH BETUNG NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR

Pekerjaan : **Coran Lantai Saluran 1:2:3**

Rehab Saluran

SKETSA / GAMBAR	NO.	Panjang (M')	Tinggi (M')	Lebar (M')	Lebar Lantai (M')	Tebal (M')	Jml	**Volume (M3)**	KET
		308.50	0.15	1.20			1	55.53	Lantai Saluran
			JUMLAH					**55.53**	

Pengawas,

DIARI FADLI
NIP. 19810517 2010 01 1 018

Pengawas,

MARSUPRIADI, Amd
NIP. 19720327 2008 01 1 002

CV. ASIS ENGINERIA

ELWAMASRI
Pelaksana
