

KEURANGAN SPJ SERUMPUN

1. SPJ UPAH PEMBERSIHAN LANTAI ?!
2. KWITANSI UPAH MANDOR ??
3. FAKTUR ~~SPJ~~ PENGADAAN BAHAN PONDOK KERJA
4. FAKTUR PENGADAAN ATK
5. ~~K~~ FAKTUR PENGADAAN OBAT-OBATAN.
DI PAGU DANA - Rp 225.000,-
DI SPJ → Rp 250.000,-
BERLEBIH Rp 25.000,-
TOLONG PERBAIKI!!!
6. KWITANSI INSENTIF PENDAMPING
7. FAKTUR FOTOCOPI & DKK DARI LAPORAN KELOMPOK
8. SPJ PERTEMUAN KELOMPOK
5 KALI LAGI MARCA??

**KELOMPOK TANI
SERUMPUN**

**Jorong Situak Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten
Pasaman Barat**

**LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT**

LOKASI

JORONG	:	SITUAK
NAGARI	:	UJUANG GADIANG
KECAMATAN	:	LEMBAH MELINTANG
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT
PROVINSI	:	SUMATERA BARAT
TITIK KOORDINAT	:	N 00° 19' 22,1" E 099° 34' 32,5"



KEBUN BIBIT RAKYAT
tumbuh sejahtera bersama

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2011**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT

KELOMPOK TANI SERUMPUN

LOKASI PERSEMAIAN

JORONG : SITUAK
NAGARI : UJUANG GADIANG
KECAMATAN : LEMBAH MELINTANG
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PROVINSI : SUMATERA BARAT



Disetujui Oleh,
Ketua Tim Pengawas

MAHYUDDIN

Disusun Oleh,
Ketua Tim Pelaksana

ALI RAHMAN



Puji dan Syukur Kepada Allah SWT, atas izin-Nya sehingga Laporan Tahunan Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat ini dapat selesai. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan fisik dilapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi.

Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan laporan, kami mohon kritik dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat untuk pembangunan di bidang kehutanan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah memberikan peran serta positif, baik yang berada dilapangan maupun diluar lapangan. Semoga dengan adanya Laporan Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi kita semua umumnya dan kelompok khususnya.

SITUAK, Desember 2011

Kelompok Tani SERUMPUN,



DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Hal
1.	SK Penetapan kelompok Tani pelaksana KBR Th 2011	-1-
2.	SK Penetapan pendamping kelompok Tani pelaksana KBR Th 2011	-2-
3.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	-3-
4.	Dokumentasi Kegiatan	-4-
5.	Realisasi laporan Fisik dan Keuangan pembuatan KBR Th 2011	-5-



LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sasaran Kegiatan.....	2
1.4. Dasar Pelaksanaan Kegiatan.....	2
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	3
2.1. Gambaran Umum Lokasi Persemaian.....	3
2.2. Pembersihan Lokasi Persemaian	3
2.3. Sarana dan Prasarana Persemaian	3
2.4. Penyediaan Benih	4
2.5. Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih.....	5
2.6. Pembuatan Naungan	5
2.7. Penaburan Benih	6
2.8. Penyapihan	7
2.9. Pemeliharaan	7
2.10. Penyulaman	9
2.11. Bibit Siap Tanam	9
BAB III. PENUTUP	10
3.1. Kesimpulan	10
3.2. Saran	10
LAMPIRAN	



1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif dalam rangka untuk mengembangkan potensi melalui pemberdayaan masyarakat.

Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan salah satu program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok masyarakat, terutama di pedesaan. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan. Kebun Bibit Rakyat juga sebagai wahana peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dalam hal pembuatan persemaian, penyediaan bibit yang berkualitas, penanaman, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pelaksanaan pembuatan Kebun Bibit Rakyat peran serta dan partisipasi Kelompok Tani Serumpun di Jorong Situak Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang yang tergabung di dalamnya masyarakat setempat sangat penting demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Sehingga hutan dan lahan yang tidak produktif dapat terehabilitasi dengan penanaman dari bibit yang ada.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai Pembuatan Kebun Bibit Rakyat yang sudah dilaksanakan oleh Kelompok Tani Serumpun di Jorong Situak Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang, berikut Laporan Tahunan ini disusun dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan pembuatan Kebun Bibit Rakyat dilapangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Tahunan ini disusun sebagai gambaran bentuk pelaksanaan kegiatan kelompok secara fisik di lapangan dalam Pembuatan Kebun Bibit Rakyat di Jorong Situak Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang

Tujuan

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat di Jorong Situak Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang.

1.3 Sasaran

Tersedianya bibit Kebun Bibit Rakyat siap tanam sebanyak ± 50.000 batang di Jorong Situak Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang.

1.4 Dasar Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan dilapangan sesuai dengan peraturan yang mengacu tentang pelaksanaan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.23/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat tanggal 8 April 2011.
2. Surat Keputusan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011 Nomor : SK.250/Kpts/V/BPDAS.AK/2011 tentang Penetapan Pengangkatan dan Penetapan Lokasi Tugas Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PLRHL) satuan Kerja BPDAS Agam Kuantan tanggal 27 April 2011.
3. Surat Keputusan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011 Nomor : SK.254/Kpts/V/BPDAS.AK-2/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Masyarakat Pengelola Kegiatan KBR di Wilayah Kerja BPDAS Agam Kuantan tanggal 28 April 2011.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/2044/DINHUT/2011 tentang Penunjukan Petugas Pendamping Lapangan Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Juni 2011.



2.1. Gambaran Umum Lokasi Persemaian

Secara geografis Lokasi persemaian terletak pada koordinat N 00° 19' 22,1" dan E 099° 34' 32,5" dengan topografi relatif datar serta berada ± 200 mdpl dengan luas lokasi persemaian 0,25 ha. Secara administratif lokasi persemaian berada di Jorong Situak Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Lokasi persemaian tepatnya terletak di dusun Tombang Jarung yang berada di tengah pemukiman masyarakat dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan jarak ± 7 Km dari Pasar Ujuang Gadiang. Letak lokasi persemaian berada di pinggir jalan, hal ini memudahkan dalam aksesibilitas menuju lokasi penanaman dan dilalui oleh saluran air pedesaan sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air untuk melakukan penyiraman.

2.2. Pembersihan Lokasi Persemaian

Pembersihan lokasi persemaian di Jorong Situak Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat oleh kelompok tani Serumpun dilakukan secara gotong royong oleh anggota kelompok dan masyarakat sekitar dengan membawa peralatan dari rumahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Vegetasi atau gulma yang terdapat di lokasi yang dapat mengganggu pada pertumbuhan bibit di polybag di cabut atau dipotong dengan menggunakan alat berupa sabit, cangkul dan yang lain sebagainya. Sampah-sampah yang berada disekitar lokasi juga dibersihkan baik sampah organik maupun an organik dibuang di tempat yang telah ditentukan kemudian di bakar. Setelah selesai di bersihkan, kemudian di rancang tata letak yang akan dibangun di lokasi persemaian.

2.3. Sarana dan Prasarana

a. Gubuk Kerja

Gubuk kerja pada lokasi persemaian dengan ukuran 2 x 3 m, dindingnya terbuat dari papan dengan atap rumbia, dikerjakan dengan menggunakan tenaga kerja dari anggota kelompok. Gubuk kerja biasanya dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan persemaian.

b. Papan Nama Persemaian

Papan nama terbuat dari bahan berupa lembaran digital printing dengan bingkai dan tiang terbuat dari kayu yang berukuran lebar 120 cm, panjang 150 cm, dicat warna hijau dengan huruf warna putih. Papan nama berisikan informasi berupa : nama kelompok pelaksana kegiatan, lokasi persemaian, luas persemaian, jenis tanaman, jumlah produksi bibit, dan tahun pelaksanaan kegiatan.

c. Papan Pengenal Tanaman

Papan pengenal tanaman dibuat per bedeng, Papan ini memuat informasi antara lain : nama/ nomor bedeng, jenis tanaman, jumlah tanaman, asal tanaman, dan tahun saph/ tanam.

d. Pembuatan Bangunan Pemroses Media

Bangunan ini bersifat sementara berupa sebuah bangunan terbuka terdiri dari tiang dan atap plastik tanpa dinding. Dengan ukuran bangunan 2 x 2 m yang ditempatkan dekat dengan bedeng saph sehingga memudahkan distribusi polybag yang sudah berisi media dan melindungi anggota kelompok dari terik matahari maupun hujan.

e. Instalasi air dan bak penampungan

Saluran air dibuat dengan menggunakan pipa berukuran 3/4, dengan menggunakan sebuah mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air dari sumber air dan dimasukkan ke dalam sebuah penampung yang terbuat dari terpal dengan ukuran bak penampung ± 2 x 2 m.

f. Pagar

Pemagaran lokasi persemaian sangat perlu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga lokasi persemaian dari gangguan yang datang dari luar, dapat berupa dari hewan ternak, maupun manusia terutama dari jangkauan anak-anak. Lokasi persemaian kelompok tani serumpun yang terletak ditengah pemukiman masyarakat sangat memungkinkan hal itu terjadi. Pemagaran dilakukan disekeliling lokasi persemaian dengan menggunakan pagar waring sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan dan mudah didapat.

2.4. Penyediaan Benih

Benih dapat berupa bahan generatif (biji) dan bahan vegetatif adalah bahan tanaman yang yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman kehutanan. Jenis, jumlah, dan asal benih yang dibutuhkan untuk persemaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



No.	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)	Sumber benih
1	Mahoni	16.000	Pasaman
2	Surian	7.000	Pasaman
3	Durian	4.000	Lokal
4	Karet	23.000	Medan
	Jumlah	50.000	

2.5. Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih

1. Pembuatan Bedeng Tabur

a. Bedeng Tabur

Jenis benih yang ditabur pada lokasi persemaian kelompok tani serumpun adalah surian, sedangkan jenis yang lain langsung ditanamkan di polybag dengan tujuan menghemat biaya dan waktu. Bedeng tabur berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1 x 5 m. Permukaan tanahnya (dari top soil), ditinggikan dari permukaan tanah 10 – 15 cm. Media yang digunakan untuk bedeng tabur adalah pasir halus yang terlebih dahulu disangrai karena syarat media harus bersih, steril dan gembur. Media yang digunakan adalah media yang netral, yaitu media tanpa dicampur dengan pupuk, baik pupuk kandang maupun kimia, karena sifat media di bedeng tabur hanya sebagai penghantar berkecambahnya benih yang sifatnya hanya sementara waktu. Media di bedeng tabur diusahakan dengan kondisi yang lembab, jika lembab maka kecambah sulit muncul karena media tersebut padat serta dapat terserang penyakit akar busuk dan jamur.

b. Bedeng Sapih

Bedengan sapih dibuat segi empat dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dilapangan. Secara umum ukuran bedeng sapih yang dibuat adalah 1,5 x 10 m dengan pinggiran bedeng diperkuat dengan pohon pinang yang telah dibelah sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar polybag yang sudah berisi media lebih tertata rapi di persemaian. Media bedeng sapih yang digunakan berupa tanah top soil : sekam padi atau serbuk gergaji : pupuk kandang/pupuk organik dengan perbandingan 3 : 1 : 1. Pencampuran media yang digunakan bertujuan : media menjadi berpori-pori sehingga air mudah meresap ke dalam media, berat media per polybag per bibit menjadi lebih ringan, mengurangi kebutuhan volume air dan menghemat waktu penyiraman, dan menjaga kelembapan media.



2.6. Pembuatan Naungan

Secara teori Pembuatan Naungan bertujuan untuk melindungi benih, kecambah, maupun bibit untuk jenis-jenis pohon yang bersifat toleran. Pembuatan naungan dilokasi persemaian adalah dengan memanfaatkan pelepah sawit, karena mudah diperoleh di daerah sekitar dan tentunya lebih ekonomis dengan ketinggian rata-rata dari permukaan tanah 2M. Selain itu naungan Berguna untuk melindungi benih, kecambah, bibit, maupun media tumbuh dari tetesan langsung curah hujan yang kemungkinan dapat merusak. Faktor cahaya banyak mempengaruhi bibit melalui proses fotosintesis untuk pertumbuhan bibit dan juga untuk membantu perkecambahan. Reaksi (kepekaan) jenis-jenis pohon terhadap cahaya berlainan. Reaksi ini dinamakan toleransi. Tanaman jenis toleransi adalah jenis tanaman yang tahan naungan pada waktu kecil. Sedangkan tanaman jenis intoleransi adalah jenis tanaman yang tidak tahan naungan pada waktu kecil.

2.7. Penaburan Benih

Penaburan benih adalah kegiatan menanam benih pada media tabur. Kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran benih dan letak lembaga (titik tumbuh benih). Besar kecilnya benih akan menentukan kedalaman benih ditanam, sedangkan letak titik tumbuh menentukan posisi benih ditanam. Penaburan benih dapat dilakukan di bedeng tabur, dapat juga langsung disemai dalam kantong plastik (polybag) berisi media tumbuh semai.

Pada kegiatan penaburan benih ini hanya dilakukan pada jenis surian saja, sedangkan jenis lain langsung di semai ke dalam polybag. Untuk benih mahoni dan surian terlebih dahulu di semai pada bedeng tabur, sedangkan untuk benih karet dan durian langsung di tabur dalam polybag.

a. Benih Mahoni

- Benih mahoni termasuk ukuran sedang, ditanam sedalam 2/3 bagian benih dengan letak lembaga di dalam tanah atau bagian yang tebal disebelah bawah dan dapat di semai langsung kedalam polybag.

b. Benih Surian

- Sebelum benih disemai terlebih dahulu di rendam \pm 4 jam dengan menggunakan air dingin.
- Benih terlebih dahulu dicampurkan dengan pasir.
- Benih ditaburkan secara merata pada media tabur.
- Selanjutnya ditutup dengan pasir halus atau tanah secara merata dan tipis sampai benih tertutup.



- c. Benih Karet
 - Benih karet termasuk ukuran besar.
 - Untuk benih karet, tidak dilakukan penyemaian benih. Tetapi langsung disemai ke dalam polybag.
 - Benih ditanam langsung sedalam 1/3 bagian benih dengan posisi lembaga dibawah tanah.
- d. Benih Durian
 - Benih durian juga termasuk benih berukuran besar, penyemaian langsung bisa dilakukan ke dalam polybag.
 - Benih ditanam langsung sedalam 1/3 bagian benih dengan posisi lembaga dibawah tanah.

2.8. Penyapihan

Penyapihan adalah kegiatan memindahkan kecambah dari bedeng perkembahan ke bedeng saph. Penyapihan juga dapat dilakukan pada benih yang ditanam langsung di wadah saph, apabila kecambah tumbuh lebih dari satu. Pada umumnya penyapihan dilakukan ketika akar cabang mulai tumbuh dan batangnya mulai mengayu, kondisi seperti ini biasanya terjadi pada umur semai 1 minggu hingga 1 bulan setelah benih berkecambah.

2.9. Pemeliharaan

Pemeliharaan bibit adalah kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang sebaik mungkin guna pertumbuhan semai sehingga akhirnya diperoleh bibit yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Pemeliharaan persemaian meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit.

- a. Penyiraman
 - Penyiraman adalah memberi air dalam jumlah yang cukup sehingga terciptanya suatu kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan semai.
 - Penyiraman biasanya dilakukan pada pagi hari, hal ini dilakukan sebelum terjadinya proses fotosintesis. Sehingga pada saat proses foto sintesis berlangsung pada tanaman sudah tersedia air.
 - Alat penyiraman yang digunakan berupa handsprayer untuk bedeng perkembahan, sedangkan untuk bedeng penyapihan berupa gembor.
 - Intensitas penyiraman dilakukan tergantung pada iklim (curah hujan, temperatur, kelembapan, dan angin).
 - Untuk lokasi persemaian yang berada di Jorong Timbo Abu ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga penyiraman agak dikurangi, karena penyiraman yang berlebihan akan mengakibatkan kekurangan udara dalam media, sehingga perakaran tidak dapat



berkembang dengan baik dan menghambat mobilitas unsur hara dalam media.

b. Penyiangan

- Penyiangan adalah kegiatan untuk menghilangkan gulma atau tumbuhan liar yang tidak diinginkan tumbuh bersama semai atau bibit. Tujuannya adalah untuk membebaskan semai atau bibit dari persaingan dengan tumbuhan liar dalam hal memperoleh cahaya, udara, air, dan unsur-unsur hara mineral.
- Cara yang dilakukan di dalam bedeng dengan cara mencabut tumbuhan liar dengan tidak merusak perakaran semai atau bibit. Untuk diluar bedeng dapat dilakukan dengan pencangkulan.
- Adapun frekwensi penyiangan dilakukan satu kali seminggu, terkadang tergantung pertumbuhan tanaman liar disekitar persemaian.

c. Pemupukan

- Pemupukan bertujuan meningkatkan produktivitas media pertumbuhan semai atau bibit agar hasil produksi bibit berkualitas baik.
- Pupuk yang digunakan berupa pupuk NPK dan Urea dengan cara dilarutkan dalam air, kemudian disiramkan pada semai dengan menggunakan gembor.

d. Pengendalian Hama dan Penyakit

- Pengendalian hama dan penyakit adalah upaya pemeliharaan kesehatan bibit yang bertujuan agar bibit yang dihasilkan dalam keadaan sehat dan kuat sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi ketika ditanam di lapangan.
- Hama ialah gangguan yang mengakibatkan kerugian semai yang disebabkan oleh binatang seperti serangga, cacing, tikus, dan binatang-binatang lainnya.
- Hama yang sering pada persemaian berupa hewan ternak seperti ayam dan kambing masuk ke dalam persemaian sehingga merusak, oleh karena hal tersebut pemasangan pagar berupa waring disekeliling persemaian sangat baik untuk mencegah hama.
- Penyakit tanaman sampai sejauh ini belum ada gejala, karena kebersihan lingkungan tetap dijaga. Kebersihan lingkungan meliputi drainase dan kebersihan gulma. Drainase dimaksudkan dengan cara menjaga agar air tetap lancar, sehingga tidak tergenang di lantai tempat penyusunan polybag, jika terjadi genangan air maka akan mempermudah tumbuhnya jamur akar.



2.10. Penyulaman

Penyulaman dimaksudkan untuk mengganti semai atau sapihan yang mati, kerdil, atau tidak sehat. Penyulaman tetap dilakukan sehingga bibit yang disalikan mencapai ukuran yang seragam dan jumlah yang sudah ditargetkan.

2.11. Bibit Siap Tanam

Bibit siap tanam adalah tersedianya bibit sebanyak \pm 50.000 batang dengan terlebih dahulu melakukan seleksi awal dan seleksi akhir. Seleksi awal adalah kegiatan untuk mengelompokkan memilih dan memilah bibit berdasarkan jenis, pertumbuhan, dan serangan hama dan penyakit. Seleksi akhir adalah kegiatan memilih bibit siap tanam berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Bibit yang memenuhi standar dipisahkan dari bibit yang tidak memenuhi standar.

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Dari Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan secara keseluruhan kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat sesuai dengan tujuan yang sudah ditargetkan yaitu tersedianya bibit siap tanam sebanyak ± 50.000 batang. Dengan rincian dapat dilihat pada table dibawah ini.

No.	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Btg)
1	Mahoni	16.000
2	Surian	7.000
3	Durian	4.000
4	Karet	23.000
	Jumlah	50.000

3.2. SARAN

Dengan adanya kerjasama kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat antara kelompok tani dengan pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan Pasaman Barat agar lebih ditingkatkan kerjasamanya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua dan Pasaman Barat Khususnya untuk masa yang akan datang.



LAMPIRAN 1.
SK Penetapan kelompok Tani pelaksana KBR Th 2011





KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAS AGAM KUANTAN
NOMOR : SK. 254/Kpts/IV/BPDAS.AK-2/2011

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA KEGIATAN KEBUN BIBIT RAKYAT
DI WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN DAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011

KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAS AGAM KUANTAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyediaan bibit yang lebih baik berbasis pemberdayaan masyarakat untuk rehabilitasi hutan dan lahan perlu didukung dengan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR);
 - bahwa KBR merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat, terutama di perdesaan;
 - bahwa didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Balai Pengeloaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011, dialokasikan kegiatan pembangunan KBR sebanyak 98 unit di wilayah kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan lokasi dan kelompok pelaksana KBR dengan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
 - Undang Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pendapatan Negara ;
 - Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2004 tentang APBN Tahun 2005 ;
 - Undang-Undang RI Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 - Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 606/KMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 ;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 298/Kpts-II/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan di Bidang Pelaksanaan Anggaran di Propinsi kepada Koordinator ;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.15/MENHUT-II/2007 tanggal 4 Mei 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008, tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2011 tanggal 9 Maret 2011, tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011, tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011 Nomor : 0238/029-04.2.01/03/2011 Tanggal 20 Desember 2010;
 - Rencana Operasional Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011;
 - Hasil verifikasi proposal KBR Tahun 2011 oleh Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan.

MEMUTUSKAN. *f*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAS AGAM KUANTAN TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA KEGIATAN KEBUN BIBIT RAKYAT DI WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN DAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011
- KESATU : Lokasi dan Kelompok Masyarakat Pengelola Kebun Bibit Rakyat (KBR) di wilayah kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2011 Nomor : 0238/029-04.2.01/03/2011 Tanggal 20 Desember 2010.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 April 2011



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan di JAKARTA
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan di JAKARTA
3. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan di JAKARTA
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kehutanan di JAKARTA
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Wilayah III Prop. Sumatera Barat di PADANG
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di SIMPANG EMPAT
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Agam di LUBUK BASUNG
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Mineral Kab. Pesisir Selatan di PAINAN
10. Kepala Dinas Pertanian Tan. Pangan Holtikultura Bunhut Kab. Pdg Pariaman di PARIAMAN
11. Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman di PARIAMAN.
12. Kepala Dinas Pertanakhunhut Kota Padang di PADANG
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang di PADANG

NOMOR : SK. 254 /Kpts/V/BPDASAK-2/2011
TANGGAL : 28 APRIL 2011

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA KEGIATAN KEBUN BIBIT RAKYAT
DI WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN DAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi			Jumlah (Unit)	Keterangan
		Kecamatan	Nagar/Jorong (Kelurahan)	Nama Kelompok Masyarakat		
I. KABUPATEN PASAMAN BARAT						
	Talau	Sinuruk/Kemajuan	Bangkok Sakato	1		
	Talau	Sinuruk/Kemakmuran	Ingin Makmur	1		
	Talau	Talu/Tabek Sirah	Gemilang	1		
	Talau	Talu/Merdeka	Ingin Maju	1		
	Talau	Kajai/Timbo Abu	(Maju Bersama)	1		
	Talau	Kajai/Mudik Simpang	Aia Talang	1		
	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai/Sudirman	Sakinah	1		
	Pasaman	Aia Gadang/Labuah Lurus	Labuah Lurus Sepakat	1		
	Luhak Nan Duo	Koto Baru/Giri Maju	Sakato	1		
	Lembah Melintang	Ujung Gading/Situak	Serumpun	1		
	Jumlah I			10		
II. KABUPATEN PESIR SELATAN						
	Koto XI Tarusan	Nanggalo/Nanggalo	Beriang Indah	1		
	Koto XI Tarusan	Nanggalo/Sungai Tawar	Sahabat Mandiri	1		
	Koto XI Tarusan	Mandeh/Baru	Maju Bersama	1		
	Koto XI Tarusan	Mandeh/Taratak	Taratak Sakato	1		
	IV Jurai	Sago Salido/Sianik	Kayu Gadih	1		
	IV Jurai	Sago Salido/Sianik	Talawi Saiyo	1		
	IV Jurai	Painan/Painan Timur	Timbulun	1		
	IV Jurai	Salido/Laban	Harapan Baru	1		
	IV Jurai	Lumpo/Rimbo Laweh	Harapan Maju	1		
	IV Jurai	Lumpo/Batu Kunik	Bukik Gadang	1		
	IV Jurai	Sei Gayo	Kampung Dalam Sepakat	1		
	Batang Kapas	IV Koto Mudiek/Teratak Tempatih	Sarasa Saiyo	1		
	Batang Kapas	Koto Nan Duo/Sungai Bungin	Bukik Cakuah	1		
	Batang Kapas	IV Koto Hiliie/Taluak Batung	Patambuan	1		
	Batang Kapas	IV Koto Hiliie/Koto Tuo	Tunas Baru	1		
	Batang Kapas	IV Koto Hiliie/Jalamu	Ujung Bukit Jalamu	1		
	Batang Kapas	Koto Nan Duo/Teluk Kasai	Bukit Jalan Lingkar	1		
	Sutera	Surantih/Rawang	Tabek Indah	1		
	Sutera	Amping Parak Timur/Gunung Pauh	Gunung Pauh	1		
	Sutera	Surantih/Kayu Gadang	Bukik Sepanggung	1		
	Sutera	Surantih/Pasir Nan Panjang	Panadue Kampung	1		
	Sutera	Taratak	Harapan Maju	1		
	Lengayang	Kambang/Medan Baik	Pulutan Indah	1		

+

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Lokasi Negari/Jorong (Kelurahan)	Nama Kelompok Masyarakat	Jumlah (Unit)	Keterangan
		Ranah Pesisir	Pelangai/Sungai Liku Ateh	Bukit Kaciak Permai	1	
		Ranah Pesisir	Pelangai/Limau Sundai	Wanita Jaya Saiyo	1	
		Ranah Pesisir	Pelangai/Bintungan	Bintungan Indah	1	
		Linggo Sari Baganti	Punggasan/Koto Panjang	Tunas Muda	1	
		Linggo Sari Baganti	Air Haji/Bukit Silapu	Bina Usaha	1	
		Linggo Sari Baganti	Air Haji/Koto Gadang	Maju Bersama	1	
		Pancung Soal	Indrapura Utara/Hilang Panjang	Sarai Sarumpun	1	
		Bayang	Koto Berapak/Lubuk Gambir	Teladan	1	
		Bayang	Koto Ranah	Tunas Harapan	1	
		Basa IV Balai	Ampang Tulak/Sungai Rumbai	Sejati	1	
		Basa IV Balai	Binjai	Air Serik	1	
		IV Nagari Bayang Utara	Muaro Aie/Muaro Aie	Bayang Nyalo	1	
					35	
	III. KABUPATEN AGAM					
		Lubuk Basung	Manggopoh/Batu Hampar	Rajang Saiyo	1	
		Lubuk Basung	Kampung Pinang/Pasar Durian	Bintungan Jaya	1	
		Lubuk Basung	Lubuk Basung/Siguhung	Bina Usaha	1	
		Ampek Nagari	Sitanang/Simpang Ampek	Maju Bersama	1	
		Ampek Nagari	Batu Kambang/Pasar	Hati Hilbo	1	
		Matur	Matur Hilir/Matua Katik	Gantiang Sepakat	1	
		Matur	Matur Mudiak/Padang Galanggang	Sepakat Maju	1	
		Matur	Matur Hilir/Labuah Lurah Taganang	Manggala Bhakti	1	
		Palembayan	Ampek Koto/Jorong Piliadang	Usaha Bersama	1	
		Palembayan	Sungai Puar/Sungai Puar	Bimba	1	
		IV Koto	Sungai Landia/Ranah	Sawah Liek	1	
		IV Koto	Koto Tuo/Galudua	Singgaling Merapi	1	
		Tilatang Kamang	Koto Tangah/Koto Laweh	Batu Kabau	1	
		Tilatang Kamang	Kapau/Koto Panalok	Cahaya	1	
		Kamang Magek	Kamang Hilir/Batu Kaluak	Petani Hutan	1	
		Kamang Magek	Kamang Mudik/Balai	Indang Saiyo	1	
		Palupuah	Pasia Laweh/Lurah Dalam	Laju Prima	1	
		Palupuah	Koto Rantang/Muaro	Elok Saiyo	1	
		Palupuah	Nan Tujuh/Kuran-kuran	Saiyo Sakato	1	
		Baso	Koto Tinggi/Koto Gadang	Amanah	1	
		Tanjung Raya	Maninjau/Gasang	Saiyo Saraso	1	
		Tanjung Raya	Koto Malintang/Pauh Taruko	Pauh Taruko	1	
		Banuhampu	Pakan Sinayan/Kalampaian	Saiyo Sakato	1	
		Banuhampu	Padang Lua/Salimpariak	Usaha Baru	1	
		Banuhampu	Padang Lua/Salimpariak	Amanah	1	
		Sungai Puar	Sungai Puar/Galuang	Mitra Mandiri	1	
		Sungai Puar	Padang Laweh/Kubu	Kubu Indah	1	

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Lokasi	Nama Kelompok Masyarakat	Jumlah (Unit)	Keterangan
		Sungai Puar	Batu Palano/Simpang III	PISKO	1	
		Tanjung Mutiara	Tiku Utara/Cacang Tinggi	Amal Remaja	1	
		Tanjung Mutiara	Tiku Utara/Durian Kapeh	Mutiara Indah Perkasa	1	
		Canduang	Canduang Koto Laweh/Candung Guguk	Sarumpun Indah	1	
	Jumlah III				31	
IV. KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
		V Koto Timur	Gunung Padang Alai/Batang Piaman	Saiyo Sakato	1	
		V Koto Kp. Dalam	Campago/Bukit Calliak	Saiyo	1	
		VII Koto Sei Sarik	Sungai Sarik/Ambung Kapur	Yakin Utama	1	
		Sei Geringging	Sungai Sirah KurANJI Hulu/Sungai Rantai	Makmur	1	
		Sei Geringging	Malai III Koto/Lambe	Rimbo Samaung	1	
		Lubuk Alung	Pasie Laweh/Sakayan	Aur Serumpun	1	
		Lubuk Alung	Lubuk Alung/Salibutan	Usaha Tani Sepakat	1	
		Sungai Limau	Malai V Suku/Kantarok	Makmur Jaya	1	
		Sungai Limau	Pilubang/Lembak Pasang	Remaja Lagan (RELAG)	1	
		2 X 11 Kayu Tanam	Anduring/Lubuk Aur	Sepakat Batu Larung	1	
		2 X 11 Kayu Tanam	Guguk/Padang Lapai	Sinar Pagi II	1	
		2 X 11 Enam Lingkung	Lubuk Pandan/Padang Bukit	Sipinang Jaya	1	
		Batang Anai	Sungai Buluh/Salisikan	Bukit Kandang Harimau	1	
	Jumlah IV				13	
V. KOTA PARIAMAN						
		Pariaman Utara	Sungai Rambai/Sungai Rambai Utara	Rambai Sakato	1	
		Pariaman Timur	Kajai/Kajai Timur	Tebing Saiyo	1	
	Jumlah V				2	
VI. KOTA PADANG						
		Koto Tengah	Air Dingin/Balai Gadang	Hidup Sejahtera	1	
		Koto Tengah	Lubuk Minturun/Sei Lareh	Tani Maju	1	
		Lubuk Kilangan	Koto Lalang/Koto Lalang	Saiyo	1	
		Lubuk Kilangan	Koto Lalang/Koto Lalang	Koto Duku	1	
		Bungus Teluk Kabung	Bungus/Bungus Selatan	Baitul Makmur	1	
		Bungus Teluk Kabung	Teluk Kabung/Teluk Kabung Utara	Air Cindakir	1	
		Bungus Teluk Kabung	Teluk Kabung/Teluk Kabung Utara	Saiyo Sepakat	1	
	Jumlah VI				7	
					Jumlah I sd. VI	



REPUBLIK INDONESIA
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 BALAI PARIAMAN
 M. SI AJANTO, M.Si
 08560911 198603 1 001

LAMPIRAN 2.

SK Penetapan pendamping kelompok Tani pelaksana KBR Th 2011





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Sukamenanti Kecamatan Pasaman

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 522/ 2044 /DINHUT/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING LAPANGAN KEGIATAN
KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) PADA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2011 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu ditunjuk Petugas Pendamping Lapangan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR),
- b. bahwa pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pendamping Lapangan pada kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada Dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011,
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b di atas maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.70/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.12/Menhut-II/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.23/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Menunjuk Petugas Pendamping Lapangan kegiatan Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2011 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pedamping Lapangan kegiatan Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2011 sebagaimana dimaksud diktum pertama memiliki tugas melakukan bimbingan terhadap kelompok tani dalam teknis pembuatan bibit dan pembuatan laporan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan tahun 2010 nomor : 0238/029-04.2.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Mei 2011, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukamemanti

Pada Tanggal : 15 Juni 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. ZUWENDRA
Nip. 19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :


- 1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)*
- 2. Kepala Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sukamemanti*
- 3. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang*
- 4. Yang bersangkutan*
- 5. Arsip*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/2044/DINHUT/2011
 Tanggal : 15 Juni 2011
 Tentang : Penunjukan Petugas Pendamping Lapangan Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011

No	Nama	Lokasi		Kelompok Tani
		Kecamatan	Nagari/Jorong	
1.	Syamsinir	Talamau	Talu/Merdeka	Ingin Maju
2.	Surahdi, S.Si	Talamau	Kajai/Timbo Abu	Maju Bersama
3.	Yuhan Sahri, S.Hut	Luhak Nan Duo	Koto Baru/Giri Maju	Sakato
4.	Renita, S.Hut	Talamau	Sinuruik/Kemakmuran	Ingin Makmur
5.	Yandra Yusda	Talamau	Talu/Tabek Sirah	Gemilang
6.	Nurul Oktovan, S.Hut	Lembah Melintang	Ujung Gading/Situak	Serumpun
7.	Anhar, S.Hut	Talamau	Kajai/Mudik Simpang	Aia Talang
8.	Fajri Elita, SP	Pasaman	Aia Gadang/Labuah Lurus	Labuah Lurus Sepakat
9.	Exandra, S.Pt	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai/Sudirman	Sakinah
10.	Erna Lita	Talamau	Sinuruik/Kemajuan	Bangkok Sakato

Ditetapkan di : Sukamenanti
 Pada Tanggal : 15 Juni 2011

Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat


Ir. ZUWENDRA
 Nip. 19601219 198801 1 001

LAMPIRAN 3.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan



LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Gambar (1) dan (2) adalah kegiatan pembersihan di lokasi persemaian.



Gambar (1)



Gambar (2)

2. Gambar (3) dan (4) merupakan kegiatan pencampuran media tanam.



Gambar (3)



Gambar (4)

3. Gambar (5) dan (6) adalah kegiatan pengisian kantong polybag.




Gambar (5)



Gambar (6)

4. Gambar (7) dan (8) adalah kegiatan pembuatan bedeng saph.



Gambar (7)



Gambar (8)

5. Gambar (9) dan (10) adalah proses pemindahan polibag ke bedeng saph.




Gambar (9)



Gambar (10)

6. Gambar (11) dan (12) adalah pembuatan dan bentuk dari gubuk kerja.



Gambar (11)



Gambar (12)

7. Gambar (13) dan (14) adalah bentuk ukuran dari bedeng saph dan tiang naungan.



Gambar (13)




Gambar (14)

8. Gambar (15) dan (16) adalah kegiatan pembuatan bedeng tabur.



Gambar (15)

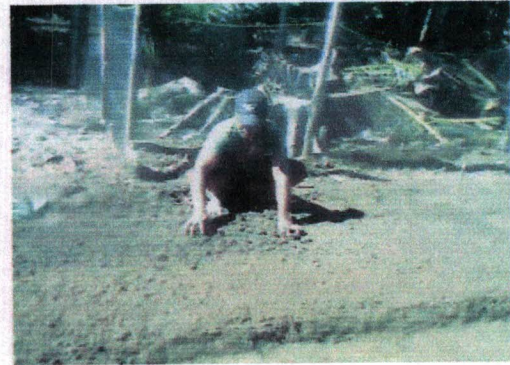

Gambar (16)

9. Gambar (17) dan (18) adalah benih surian serta proses penaburannya di bedeng tabur.



Gambar (17)



Gambar (18)

10. Gambar (19) dan (20) adalah penyemaian benih surian dan mahoni pada polybag.



Gambar (19)



Gambar (20)

11. Gambar (21) dan (22) adalah benih durian dan surian yang mulai tumbuh pada polybag.




Gambar (21)



Gambar (22)

12. Gambar (23) dan (24) adalah bentuk atap naungan dan bak penampung air.

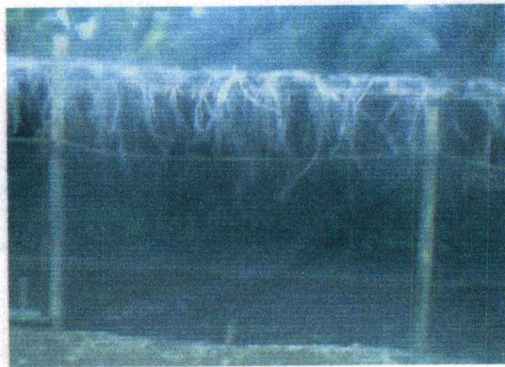

Gambar (23)



Gambar (24)

13. Gambar (25) dan (26) adalah benih karet yang telah tumbuh di polybag.



Gambar (25)



Gambar (26)

14. Gambar (27) dan (28) adalah benih mahoni yang telah tumbuh di polybag.



Gambar (27)



Gambar (28)

15. Gambar (29) adalah papan nama persemaian.



Gambar (29)

LAMPIRAN 5.

Realisasi laporan Fisik dan Keuangan pembuatan KBR Th 2011



LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan : Mei 2011

Kelompok Masyarakat : **Kelompok Tani Serumpun**
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Situak
 Nagari : Ujuang Gadiang
 Kecamatan : Kecamatan Lembah Melintang
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00° 19'22,1" E 099° 34'32,5"

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target		Realisasi s/d Bln Lalu		Realisasi Bulan ini		Realisasi s/d bulan ini		Ket
		Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
A	PENYUSUNAN RUKK			-	-	-	-	-	-	
B	PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN									
1	Pengadaan bahan papan nama kegiatan	1 buah	450,000	-	-	-	-	-	-	
2	Pengadaan bahan papan mutasi/rencana kerja	1 unit	300,000	-	-	-	-	-	-	
3	Pengadaan bahan bedengan tabur/kecambah	3 buah	165,000	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan bahan bedeng saph	55 bedeng	3,025,000	-	-	-	-	-	-	
5	Pengadaan naungan	1 paket	2,100,000	-	-	-	-	-	-	
6	Pengadaan tiang naungan	50 batang	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
7	Pengadaan peralatan kerja	1 paket	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
8	Pengadaan pompa air dan instalasi pengairan	1 unit	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
9	Pengadaan bahan pondok kerja	1 unit	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
10	Pembersihan lapangan	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
11	Pembuatan dan pemasangan papan nama mutasi	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
12	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
13	Pemasangan instalasi air dan bak penampung	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
14	Pemasangan naungan	15 HOK	525,000	-	-	-	-	-	-	
15	Pembuatan pondok kerja	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
C	PRODUKSI BIBIT									
16	Pembuatan bibit, jenis :									
	a. Mahoni	1,500 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Surian	26,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Karet	21,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Durian	1,500 biji	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pengadaan ATK & buku adm kelompok	1 keg	200,000	-	-	-	-	-	-	
18	Pengadaan kantong plastik	275 kg	11,000,000	-	-	-	-	-	-	
19	Pengadaan tanah top soil	25 m3	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
20	Pengadaan kompos	150 kg	150,000	-	-	-	-	-	-	
21	Pengadaan pupuk an. organik	40 kg	400,000	-	-	-	-	-	-	
22	Pengadaan benih	1 paket	5,500,000	-	-	-	-	-	-	
23	Pengadaan obat-obatan	2 liter	225,000	-	-	-	-	-	-	
24	Pembuatan/ pencampuran media	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
25	Pengisian kantong plastik	90 HOK	3,150,000	-	-	-	-	-	-	
26	Penaburan, penyapihan, penyiraman, dll	250 HOK	8,750,000							
	Rincian :									
	a. Penaburan	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
	b. Penyapihan	80 HOK	2,800,000	-	-	-	-	-	-	
	c. Penyiraman	100 HOK	3,500,000	-	-	-	-	-	-	
	d. Penyiangan	24 HOK	840,000	-	-	-	-	-	-	
	e. Pemupukan	4 HOK	140,000	-	-	-	-	-	-	
	f. Penanggulangan HPT	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
	g. Penyulaman	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
27	Mandor/ pengawas	8 OB	2,400,000	-	-	1 OB	-	1 OB	-	
D	PERTEMUAN KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN									
28	Pertemuan kelompok tani	8 kali	1,200,000	-	-	1 kali	-	1 kali	-	
29	Insentif pendamping	8 OB	2,400,000	-	-	1 OB	-	1 OB	-	
30	Fotocopy rancangan RDK/RDKK dan laporan aktifitas kelompok	1 paket	250,000	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		54,690,000							0

Situak, Mei 2011

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

Mahyuddin
(MAHYUDDIN)

Ketua Tim Pelaksana

Ali Rahman
(ALI RAHMAN)



LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan : Juni 2011

Kelompok Masyarakat : **Kelompok Tani Serumpun**
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Situak
 Nagari : Ujuang Gadiang
 Kecamatan : Kecamatan Lembah Melintang
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00° 19'22,1" E 099° 34'32,5"

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target		Realisasi s/d Bln Lalu		Realisasi Bulan ini		Realisasi s/d bulan ini		Ket
		Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
A	PENYUSUNAN RUKK			-	-	-	-	-	-	
B	PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN									
1	Pengadaan bahan papan nama kegiatan	1 buah	450,000	-	-	-	-	-	-	
2	Pengadaan bahan papan mutasi/rencana kerja	1 unit	300,000	-	-	-	-	-	-	
3	Pengadaan bahan bedengan tabur/kecambah	3 buah	165,000	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan bahan bedeng saphi	55 bedeng	3,025,000	-	-	-	-	-	-	
5	Pengadaan naungan	1 paket	2,100,000	-	-	-	-	-	-	
6	Pengadaan tiang naungan	50 batang	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
7	Pengadaan peralatan kerja	1 paket	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
8	Pengadaan pompa air dan instalasi pengairan	1 unit	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
9	Pengadaan bahan pondok kerja	1 unit	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
10	Pembersihan lapangan	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
11	Pembuatan dan pemasangan papan nama mutasi	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
12	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
13	Pemasangan instalasi air dan bak penampung	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
14	Pemasangan naungan	15 HOK	525,000	-	-	-	-	-	-	
15	Pembuatan pondok kerja	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
C	PRODUKSI BIBIT									
16	Pembuatan bibit, jenis :									
	a. Mahoni	1,500 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Surian	26,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Karet	21,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Durian	1,500 biji	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pengadaan ATK & buku adm kelompok	1 keg	200,000	-	-	-	-	-	-	
18	Pengadaan kantong plastik	275 kg	11,000,000	-	-	-	-	-	-	
19	Pengadaan tanah top soil	25 m3	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
20	Pengadaan kompos	150 kg	150,000	-	-	-	-	-	-	
21	Pengadaan pupuk an. organik	40 kg	400,000	-	-	-	-	-	-	
22	Pengadaan benih	1 paket	5,500,000	-	-	-	-	-	-	
23	Pengadaan obat-obatan	2 liter	225,000	-	-	-	-	-	-	
24	Pembuatan/ pencampuran media	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
25	Pengisian kantong plastik	90 HOK	3,150,000	-	-	-	-	-	-	
26	Penaburan, penyapihan, penyiraman, dll	250 HOK	8,750,000							
	Rincian :									
	a. Penaburan	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
	b. Penyapihan	80 HOK	2,800,000	-	-	-	-	-	-	
	c. Penyiraman	100 HOK	3,500,000	-	-	-	-	-	-	
	d. Penyiangan	24 HOK	840,000	-	-	-	-	-	-	
	e. Pemupukan	4 HOK	140,000	-	-	-	-	-	-	
	f. Penanggulangan HPT	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
	g. Penyulaman	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
27	Mandor/ pengawas	8 OB	2,400,000	-	-	1 OB	-	1 OB	-	
D	PERTEMUAN KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN									
28	Pertemuan kelompok tani	8 kali	1,200,000	-	-	1 kali	-	1 kali	-	
29	Insentif pendamping	8 OB	2,400,000	-	-	1 OB	-	1 OB	-	
30	Fotocopy rancangan RDK/RDKK dan laporan aktifitas kelompok	1 paket	250,000	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		54,690,000						0	

Situak, Juni 2011

Mengetahui/menyetujui
 Ketua Tim Pengawas

(Signature)
 (MAHYUDDIN)

Ketua Tim Pelaksana

(Signature)
 (ALI RAHMAN)



(YASRI)

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : Juli 2011

Kelompok Masyarakat : **Kelompok Tani Serumpun**
 Lokasi :
 Jorong/Blok : Situak
 Nagari : Ujuang Gadiang
 Kecamatan : Kecamatan Lembah Melintang
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00° 19'22,1" E 099° 34'32,5"

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target		Realisasi s/d Bln Lalu		Realisasi Bulan ini		Realisasi s/d bulan ini		Ket
		Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
A	PENYUSUNAN RUKK			-	-	-	-	-	-	
B	PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN									
1	Pengadaan bahan papan nama kegiatan	1 buah	450,000	-	-	-	-	-	-	
2	Pengadaan bahan papan mutasi/rencana kerja	1 unit	300,000	-	-	-	-	-	-	
3	Pengadaan bahan bedengan tabur/kecambah	3 buah	165,000	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan bahan bedeng saph	55 bedeng	3,025,000	-	-	-	-	-	-	
5	Pengadaan naungan	1 paket	2,100,000	-	-	-	-	-	-	
6	Pengadaan tiang naungan	50 batang	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
7	Pengadaan peralatan kerja	1 paket	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
8	Pengadaan pompa air dan instalasi pengairan	1 unit	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
9	Pengadaan bahan pondok kerja	1 unit	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
10	Pembersihan lapangan	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
11	Pembuatan dan pemasangan papan nama mutasi	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
12	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
13	Pemasangan instalasi air dan bak penampung	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
14	Pemasangan naungan	15 HOK	525,000	-	-	-	-	-	-	
15	Pembuatan pondok kerja	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
C	PRODUKSI BIBIT									
16	Pembuatan bibit, jenis :									
	a. Mahoni	1,500 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Surian	26,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Karet	21,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Durian	1,500 biji	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pengadaan ATK & buku adm kelompok	1 keg	200,000	-	-	-	-	-	-	
18	Pengadaan kantong plastik	275 kg	11,000,000	-	-	-	-	-	-	
19	Pengadaan tanah top soil	25 m3	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
20	Pengadaan kompos	150 kg	150,000	-	-	-	-	-	-	
21	Pengadaan pupuk an. organik	40 kg	400,000	-	-	-	-	-	-	
22	Pengadaan benih	1 paket	5,500,000	-	-	-	-	-	-	
23	Pengadaan obat-obatan	2 liter	225,000	-	-	-	-	-	-	
24	Pembuatan/ pencampuran media	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
25	Pengisian kantong plastik	90 HOK	3,150,000	-	-	-	-	-	-	
26	Penaburan, penyapihan, penyiraman, dll	250 HOK	8,750,000							
	Rincian :									
	a. Penaburan	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
	b. Penyapihan	80 HOK	2,800,000	-	-	-	-	-	-	
	c. Penyiraman	100 HOK	3,500,000	-	-	-	-	-	-	
	d. Penyiang	24 HOK	840,000	-	-	-	-	-	-	
	e. Pemupukan	4 HOK	140,000	-	-	-	-	-	-	
	f. Penanggulangan HPT	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
	g. Penyulaman	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
27	Mandor/ pengawas	8 OB	2,400,000	-	-	1 OB	-	1 OB	-	
D	PERTEMUAN KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN									
28	Pertemuan kelompok tani	8 kali	1,200,000	-	-	1 kali	-	1 kali	-	
29	Insentif pendamping	8 OB	2,400,000	-	-	1 OB	-	1 OB	-	
30	Fotocopy rancangan RDK/RDKK dan laporan aktifitas kelompok	1 paket	250,000	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		54,690,000						0	

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

Mahyuddin
(MAHYUDDIN)



Situak, Juli 2011

Ketua Tim Pelaksana

Ali Rahman
(ALI RAHMAN)

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan : Agustus 2011

Kelompok Masyarakat : **Kelompok Tani Serumpun**
 Lokasi : -
 Jorong/Blok : Situak
 Nagari : Ujung Gading
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°19'22,1" E 099°34'32,5"

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target		Realisasi s/d Bln Lalu		Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d bulan ini		Ket
		Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
A	PENYUSUNAN RUIK			-	-	100%	-	100%	-	
B	PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN									
1	Pengadaan bahan papan nama kegiatan	1 buah	450,000	-	-	-	-	-	-	
2	Pengadaan bahan papan mutasi/rencana kerja	1 unit	300,000	-	-	-	-	-	-	
3	Pengadaan bahan bedengan tabur/kecambah	3 buah	165,000	-	-	3 buah	165,000	3 buah/100%	165,000	
4	Pengadaan bahan bedeng saphi	55 bedeng	3,025,000	-	-	-	-	-	-	
5	Pengadaan naungan	1 paket	2,100,000	-	-	-	-	-	-	
6	Pengadaan tiang naungan	50 batang	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
7	Pengadaan peralatan kerja	1 paket	1,000,000	-	-	50%	200,000	50%	200,000	
8	Pengadaan pompa air dan instalasi pengairan	1 unit	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
9	Pengadaan bahan pondok kerja	1 unit	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
10	Pembersihan lapangan	10 HOK	350,000	-	-	10 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	
11	Pembuatan dan pemasangan papan nama mutasi	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
12	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	30 HOK	1,050,000	-	-	10 HOK	350,000	10 HOK	350,000	
13	Pemasangan instalasi air dan bak penampung	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
14	Pemasangan naungan	15 HOK	525,000	-	-	2 HOK	-	2 HOK	-	
15	Pembuatan pondok kerja	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
C	PRODUKSI BIBIT									
16	Pembuatan bibit, jenis :									
	a. Mahoni	16,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Karet	23,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Durian	4,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Surtan	7,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pengadaan ATK & buku adm kelompok	1 keg	200,000	-	-	1 Keg	-	1 keg	-	
18	Pengadaan kantong plastik	275 kg	11,000,000	-	-	185 kg	8,000,000	180 kg	8,000,000	
19	Pengadaan tanah top soil	25 m3	2,500,000	-	-	15m3	1,000,000	15 m3	1,000,000	
20	Pengadaan kompos	150 kg	150,000	-	-	150 kg	150,000	150 kg/100%	150,000	
21	Pengadaan pupuk an. organik	40 kg	400,000	-	-	-	-	-	-	
22	Pengadaan benih	1 paket	5,500,000	-	-	0,25 paket	1,000,000	0,25 paket	1,000,000	
23	Pengadaan obat-obatan	2 liter	225,000	-	-	-	-	-	-	
24	Pembuatan/ pencampuran media	30 HOK	1,050,000	-	-	15 HOK	525,000	15 HOK	525,000	
25	Pengisian kantong plastik	90 HOK	3,150,000	-	-	28 HOK	980,000	28 HOK	980,000	
26	Penaburan, penyapihan, penyiraman, dll Rindan :	250 HOK	8,750,000							
	a. Penaburan	30 HOK	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
	b. Penyapihan	80 HOK	2,800,000	-	-	-	-	-	-	
	c. Penyiraman	100 HOK	3,500,000	-	-	-	-	-	-	
	d. Penyilangan	24 HOK	840,000	-	-	-	-	-	-	
	e. Pemupukan	4 HOK	140,000	-	-	-	-	-	-	
	f. Penangutangan HPT	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
	g. Penyulaman	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
27	Mandor/ pengawas	8 OB	2,400,000	-	-	1 OB	-	1OB	-	
D	PERTEMUAN KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN									
28	Pertemuan kelompok tani	8 kali	1,200,000	2 kali	-	1 kali	-	3 kali	-	
29	Insentif pendamping	8 OB	2,400,000	-	-	-	-	-	-	
30	Fotocopy rancangan RDK/RDKK dan laporan aktifitas kelompok	1 paket	250,000	-	-	10%	-	10%	-	
	Jumlah		54,690,000				12,720,000		12,720,000	

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

Mahyuddin
(Mahyuddin)

Talu, 30 Agustus 2011

Ketua Tim Pelaksana

Ali Rahman
(Ali Rahman)



LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : September 2011

Kelompok Masyarakat : **Kelompok Tani Serumpun**
 Lokasi : -
 Jorong/Blok : Situak
 Nagari : Ujung Gading
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°19'22,1" E 099°34'32,5"

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target		Realisasi s/d Bin Lalu		Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d bulan ini		Ket
		Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
A	PENYUSUNAN RUIK			100%	-	100%	-	100%	-	
B	PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN									
1	Pengadaan bahan papan nama kegiatan	1 buah	450,000	-	-	-	-	-	-	
2	Pengadaan bahan papan mutasi/rencana kerja	1 unit	300,000	-	-	-	-	-	-	
3	Pengadaan bahan bedengan tabur/kecambah	3 buah	165,000	3 buah	165,000	-	-	3 buah/100%	165,000	
4	Pengadaan bahan bedeng saphi	55 bedeng	3,025,000	-	-	-	-	-	-	
5	Pengadaan naungan	1 paket	2,100,000	-	-	-	-	-	-	
6	Pengadaan tiang naungan	50 batang	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
7	Pengadaan peralatan kerja	1 paket	1,000,000	50%	200,000	20%	-	70%	200,000	
8	Pengadaan pompa air dan instalasi pengairan	1 unit	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
9	Pengadaan bahan pondok kerja	1 unit	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
10	Pembersihan lapangan	10 HOK	350,000	10 HOK	350,000	-	-	10 HOK/100%	350,000	
11	Pembuatan dan pemasangan papan nama mutasi	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
12	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	30 HOK	1,050,000	10 HOK	350,000	10 HOK	-	20 HOK	350,000	
13	Pemasangan instalasi air dan bak penampung	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
14	Pemasangan naungan	15 HOK	525,000	2 HOK	-	-	-	2 HOK	-	
15	Pembuatan pondok kerja	10 HOK	350,000	-	-	2 HOK	-	2 HOK	-	
C	PRODUKSI BIBIT									
16	Pembuatan bibit, jenis :									
	a. Mahoni	16,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Karet	23,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Durian	4,000 biji	-	-	-	4,000 biji	-	4,000 biji	-	
	d. Surian	7,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pengadaan ATK & buku adm kelompok	1 keg	200,000	1 keg	-	1 Keg	-	1 keg	-	
18	Pengadaan kantong plastik	275 kg	11,000,000	185 kg	8,000,000	90kg	3,000,000	275 kg/100%	11,000,000	
19	Pengadaan tanah top soil	25 m3	2,500,000	15m3	1,000,000	5 m3	930,000	20 m3	1,930,000	
20	Pengadaan kompos	150 kg	150,000	150 kg	150,000	-	-	150 kg/100%	150,000	
21	Pengadaan pupuk an. organik	40 kg	400,000	-	-	-	-	-	-	
22	Pengadaan benih	1 paket	5,500,000	0,25 paket	1,000,000	0,75 paket	4,500,000	1 paket/100%	5,500,000	
23	Pengadaan obat-obatan	2 liter	225,000	-	-	-	-	-	-	
24	Pembuatan/ pencampuran media	30 HOK	1,050,000	15 HOK	525,000	5 HOK	-	20 HOK	525,000	
25	Pengisian kantong plastik	90 HOK	3,150,000	28 HOK	980,000	7 HOK	-	35 HOK	980,000	
26	Penaburan, penyepihan, penyiraman, dll Rincian :	250 HOK	8,750,000							
	a. Penaburan	30 HOK	1,050,000	-	-	10 HOK	-	10 HOK	-	
	b. Penyepihan	80 HOK	2,800,000	-	-	-	-	-	-	
	c. Penyiraman	100 HOK	3,500,000	-	-	5 HOK	-	5 HOK	-	
	d. Penyilangan	24 HOK	840,000	-	-	-	-	-	-	
	e. Pemupukan	4 HOK	140,000	-	-	-	-	-	-	
	f. Penanggulangan HPT	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
	g. Penyulaman	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
27	Mandor/ pengawas	8 OB	2,400,000	1 OB	-	1 OB	-	2 OB	-	
D	PERTEMUAN KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN									
28	Pertemuan kelompok tani	8 kali	1,200,000	3 kali	-	1 kali	-	4 kali	-	
29	Insentif pendamping	8 OB	2,400,000	-	-	-	-	-	-	
30	Fotocopy rancangan RDK/RDKK dan laporan akufitas kelompok	1 paket	250,000	20%	-	10%	-	30%	-	
Jumlah			54,690,000		12,720,000		8,430,000		21,150,000	

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

Mahyuddin
(Mahyuddin)

Talu, 30 September 2011

Ketua Tim Pelaksana

All Rahman
(All Rahman)



LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : Oktober 2011

Kelompok Masyarakat : **Kelompok Tani Serumpun**
 Lokasi : -
 Jorong/Blok : Situak
 Nagari : Ujung Gading
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°19'22,1" E 099°34'32,5"

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target		Realisasi s/d Bin Laju		Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d bulan ini		Ket
		Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
A	PENYUSUNAN RUKK			100%	-	100%	-	100%	-	
B	PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN									
1	Pengadaan bahan papan nama kegiatan	1 buah	450,000	-	-	1 buah	450,000	1 buah/100%	450,000	
2	Pengadaan bahan papan mutasi/rencana kerja	1 unit	300,000	-	-	1 buah	300,000	1 buah/100%	300,000	
3	Pengadaan bahan bedengan tabur/kecambah	3 buah	165,000	3 buah	165,000	-	-	3 buah/100%	165,000	
4	Pengadaan bahan bedeng saph	55 bedeng	3,025,000	-	-	55 bedeng	2,345,000	55 bdg/100%	2,345,000	
5	Pengadaan naungan	1 paket	2,100,000	-	-	1 paket	2,100,000	1 paket/100%	2,100,000	
6	Pengadaan tiang naungan	50 batang	1,000,000	-	-	50 bgt	1,000,000	50 bgt/100%	1,000,000	
7	Pengadaan peralatan kerja	1 paket	1,000,000	70%	200,000	30%	800,000	100%/1 paket	1,000,000	
8	Pengadaan pompa air & instalasi pengairan	1 unit	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
9	Pengadaan bahan pondok kerja	1 unit	2,000,000	-	-	1 unit	2,000,000	1 unit/100%	2,000,000	
10	Pembersihan lapangan	10 HOK	350,000	10 HOK	350,000	-	-	10 HOK/100%	350,000	
11	Pembuatan dan pemasangan papan nama mutasi	10 HOK	350,000	-	-	10 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	
12	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph	30 HOK	1,050,000	20 HOK	350,000	10 HOK	700,000	30 HOK/100%	1,050,000	
13	Pemasangan instalasi air dan bak penampung	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
14	Pemasangan naungan	15 HOK	525,000	2 HOK	-	13 HOK	525,000	15 HOK/100%	525,000	
15	Pembuatan pondok kerja	10 HOK	350,000	2 HOK	-	8 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	
C	PRODUKSI BIBIT									
16	Pembuatan bibit, jenis :									
a.	Mahoni	16,000 biji	-	-	-	16,000 biji	-	16,000 biji	-	
b.	Karet	23,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Durian	4,000 biji	-	4,000 biji	-	-	-	4,000 biji	-	
d.	Surian	7,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pengadaan ATK & buku adm kelompok	1 keg	200,000	1 keg	-	1 Keg	200,000	1 keg/100%	200,000	
18	Pengadaan kantong plastik	275 kg	11,000,000	275 kg	11,000,000	-	-	275 kg/100%	11,000,000	
19	Pengadaan tanah top soil	25 m3	2,500,000	20m3	1,930,000	5 m3	570,000	25 m3/100%	2,500,000	
20	Pengadaan kompos	150 kg	150,000	150 kg	150,000	-	-	150 kg/100%	150,000	
21	Pengadaan pupuk an. organik	40 kg	400,000	-	-	40 kg	400,000	40 kg/100%	400,000	
22	Pengadaan benih	1 paket	5,500,000	1 paket	5,500,000	-	-	1 paket/100%	5,500,000	
23	Pengadaan obat-obatan	2 liter	225,000	-	-	-	-	-	-	
24	Pembuatan/ pencampuran media	30 HOK	1,050,000	20 HOK	525,000	10 HOK	525,000	30 HOK/100%	1,050,000	
25	Pengisian kantong plastik	90 HOK	3,150,000	35 HOK	980,000	55 HOK	2,170,000	90 HOK/100%	3,150,000	
26	Penaburan, penyipihan, penyiraman, dll	250 HOK	8,750,000							
	Rincian :									
a.	Penaburan	30 HOK	1,050,000	10 HOK	-	10 HOK	665,000	20 HOK	665,000	
b.	Penyipihan	80 HOK	2,800,000	-	-	-	-	-	-	
c.	Penyiraman	100 HOK	3,500,000	5 HOK	-	5 HOK	-	10 HOK	-	
d.	Penyiangan	24 HOK	840,000	-	-	-	-	-	-	
e.	Pemupukan	4 HOK	140,000	-	-	-	-	-	-	
f.	Penanggulangan HPT	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
g.	Penyulaman	6 HOK	210,000	-	-	-	-	-	-	
27	Mandor/ pengawas	8 OB	2,400,000	1 OB	-	1 OB	-	1 OB	-	
D	PERTEMUAN KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN									
28	Pertemuan kelompok tani	8 kali	1,200,000	4 kali	-	1 kali	300,000	5 kali	300,000	
29	Insentif pendamping	8 OB	2,400,000	-	-	-	-	-	-	
30	Fotocopy rancangan RDK/RDKK dan laporan aktifitas kelompok	1 paket	250,000	30%	-	10%	150,000	40%	150,000	
	Jumlah		54,690,000		21,150,000		15,900,000		37,050,000	

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

Mahyuddin
(Mahyuddin)

Talu, 28 Oktober 2011

Ketua Tim Pelaksana

All Rahman
(All Rahman)



LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan : November 2011

Kelompok Masyarakat : **Kelompok Tani Serumpun**
 Lokasi : -
 Jorong/Blok : Situak
 Nagari : Ujung Gading
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°19'22,1" E 099°34'32,5"

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target		Realisasi s/d Bin Lalu		Realisasi Bulan ini		Realisasi s/d bulan ini		Ket
		Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
A	PENYUSUNAN RUKK			100%	-	100%	-	100%	-	
B	PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN									
1	Pengadaan bahan papan nama kegiatan	1 buah	450,000	1 buah/100%	450,000	100%	-	1 buah/100%	450,000	
2	Pengadaan bahan papan mutasi/rencana kerja	1 unit	300,000	1 buah/100%	300,000	100%	-	1 buah/100%	300,000	
3	Pengadaan bahan bedengan tabur/kecambah	3 buah	165,000	3 buah/100%	165,000	100%	-	3 buah/100%	165,000	
4	Pengadaan bahan bedeng saphi	55 bedeng	3,025,000	55 bdg/100%	2,345,000	100%	-	55 bdg/100%	2,345,000	
5	Pengadaan naungan	1 paket	2,100,000	1 paket/100%	2,100,000	100%	-	1 paket/100%	2,100,000	
6	Pengadaan tiang naungan	50 batang	1,000,000	50 btg/100%	1,000,000	100%	-	50 btg/100%	1,000,000	
7	Pengadaan peralatan kerja	1 paket	1,000,000	100%/1 paket	1,000,000	100%	-	100%/1 paket	1,000,000	
8	Pengadaan pompa air & Instalasi pengaliran	1 unit	2,500,000	-	-	-	-	-	-	
9	Pengadaan bahan pondok kerja	1 unit	2,000,000	1 unit/100%	2,000,000	100%	-	1 unit/100%	2,000,000	
10	Pembersihan lapangan	10 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	100%	-	10 HOK/100%	350,000	
11	Pembuatan dan pemasangan papan nama mutasi	10 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	100%	-	10 HOK/100%	350,000	
12	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	30 HOK	1,050,000	30 HOK/100%	1,050,000	100%	-	30 HOK/100%	1,050,000	
13	Pemasangan instalasi air dan bak penampung	10 HOK	350,000	-	-	-	-	-	-	
14	Pemasangan naungan	15 HOK	525,000	15 HOK/100%	525,000	100%	-	15 HOK/100%	525,000	
15	Pembuatan pondok kerja	10 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	100%	-	10 HOK/100%	350,000	
C	PRODUKSI BIBIT									
16	Pembuatan bibit, jenis :									
	a. Mahoni	16,000 biji	-	16,000 biji	-	-	-	16,000 biji	-	
	b. Karet	23,000 biji	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Durian	4,000 biji	-	4,000 biji	-	-	-	4,000 biji	-	
	d. Surian	7,000 biji	-	-	-	7,000 biji	-	7,000 biji	-	
17	Pengadaan ATK & buku adm kelompok	1 keg	200,000	1 keg/100%	200,000	100%	-	1 keg/100%	200,000	
18	Pengadaan kantong plastik	275 kg	11,000,000	275 kg/100%	11,000,000	100%	-	275 kg/100%	11,000,000	
19	Pengadaan tanah top soil	25 m3	2,500,000	25 m3/100%	2,500,000	100%	-	25 m3/100%	2,500,000	
20	Pengadaan kompos	150 kg	150,000	150 kg/100%	150,000	100%	-	150 kg/100%	150,000	
21	Pengadaan pupuk an. organik	40 kg	400,000	40 kg/100%	400,000	100%	-	40 kg/100%	400,000	
22	Pengadaan benih	1 paket	5,500,000	1 paket/100%	5,500,000	100%	-	1 paket/100%	5,500,000	
23	Pengadaan obat-obatan	2 liter	225,000	-	-	-	-	-	-	
24	Pembuatan/ pencampuran media	30 HOK	1,050,000	30 HOK/100%	1,050,000	100%	-	30 HOK/100%	1,050,000	
25	Pengisian kantong plastik	90 HOK	3,150,000	90 HOK/100%	3,150,000	100%	-	90 HOK/100%	3,150,000	
26	Penaburan, penyapihan, penyiraman, dll	250 HOK	8,750,000							
	Rincian :									
	a. Penaburan	30 HOK	1,050,000	20 HOK	665,000	5 HOK	-	25 HOK	665,000	
	b. Penyapihan	80 HOK	2,800,000	-	-	20 HOK	-	20 HOK	-	
	c. Penyiraman	100 HOK	3,500,000	10 HOK	-	30 HOK	-	40 HOK	-	
	d. Penyiangan	24 HOK	840,000	-	-	8 HOK	-	8 HOK	-	
	e. Pemupukan	4 HOK	140,000	-	-	1 HOK	-	1 HOK	-	
	f. Penanggulangan HPT	6 HOK	210,000	-	-	1 HOK	-	1 HOK	-	
	g. Penyulaman	6 HOK	210,000	-	-	2 HOK	-	2 HOK	-	
27	Mandor/ pengawas	8 OB	2,400,000	1 OB	-	1 OB	-	1 OB	-	
D	PERTEMUAN KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN									
28	Pertemuan kelompok tani	8 kali	1,200,000	5 kali	300,000	1 kali	-	6 kali	300,000	
29	Insentif pendamping	8 OB	2,400,000	-	-	-	-	-	-	
30	Fotocopy rancangan RDK/RDCK dan laporan akblitas kelompok	1 paket	250,000	40%	150,000	30%	-	70%	150,000	
	Jumlah		54,690,000		37,050,000				37,050,000	

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

(Mahyuddin)
(Mahyuddin)

Talu, 30 November 2011

Ketua Tim Pelaksana

(Ali Rahman)
(Ali Rahman)



LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR

Bulan : Desember 2011

Kelompok Masyarakat : **Kelompok Tani Serumpun**
 Lokasi : -
 Jorong/Blok : Situak
 Nagari : Ujung Gading
 Kecamatan : Lembah Melintang
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Provinsi : Sumatera Barat
 Koordinat Geografis : N 00°19'22,1" E 099°34'32,5"

No	Uraian Kegiatan	Rencana/Target		Realisasi s/d Bln Lalu		Realisasi Bulan ini		Realisasi s/d bulan ini		Ket
		Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
A	PENYUSUNAN RUKK			100%	-	100%	-	100%	-	
B	PEMBANGUNAN SARANA PERSEMAIAN									
1	Pengadaan bahan papan nama kegiatan	1 buah	450,000	1 buah/100%	450,000	100%	-	1 buah/100%	450,000	
2	Pengadaan bahan papan mutasi/rencana kerja	1 unit	300,000	1 buah/100%	300,000	100%	-	1 buah/100%	300,000	
3	Pengadaan bahan bedengan tabur/kecambah	3 buah	165,000	3 buah/100%	165,000	100%	-	3 buah/100%	165,000	
4	Pengadaan bahan bedeng saphi	55 bedeng	3,025,000	55 bdg/100%	2,345,000	100%	680,000	55 bdg/100%	3,025,000	
5	Pengadaan naungan	1 paket	2,100,000	1 paket/100%	2,100,000	100%	-	1 paket/100%	2,100,000	
6	Pengadaan tiang naungan	50 batang	1,000,000	50 btg/100%	1,000,000	100%	-	50 btg/100%	1,000,000	
7	Pengadaan peralatan kerja	1 paket	1,000,000	100%/1 paket	1,000,000	100%	-	100%/1 paket	1,000,000	
8	Pengadaan pompa air & instalasi pengairan	1 unit	2,500,000	-	-	100%	2,500,000	100%	2,500,000	
9	Pengadaan bahan pondok kerja	1 unit	2,000,000	1 unit/100%	2,000,000	100%	-	1 unit/100%	2,000,000	
10	Pembersihan lapangan	10 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	100%	-	10 HOK/100%	350,000	
11	Pembuatan dan pemasangan papan nama mutasi	10 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	100%	-	10 HOK/100%	350,000	
12	Pembuatan bedeng tabur dan bedeng saphi	30 HOK	1,050,000	30 HOK/100%	1,050,000	100%	-	30 HOK/100%	1,050,000	
13	Pemasangan instalasi air dan bak penampung	10 HOK	350,000	-	-	100%	350,000	100%	350,000	
14	Pemasangan naungan	15 HOK	525,000	15 HOK/100%	525,000	100%	-	15 HOK/100%	525,000	
15	Pembuatan pondok kerja	10 HOK	350,000	10 HOK/100%	350,000	100%	-	10 HOK/100%	350,000	
C	PRODUKSI BIBIT									
16	Pembuatan bibit, jenis :									
	a. Mahoni	16,000 biji	-	16,000 biji	-	100%	-	16,000 biji	-	
	b. Karet	23,000 biji	-	-	-	100%	-	23,000 biji	-	
	c. Durian	4,000 biji	-	4,000 biji	-	100%	-	4,000 biji	-	
	d. Surian	7,000 biji	-	-	-	100%	-	7,000 biji	-	
17	Pengadaan ATK & buku adm kelompok	1 keg	200,000	1 keg/100%	200,000	100%	-	1 keg/100%	200,000	
18	Pengadaan kantong plastik	275 kg	11,000,000	275 kg/100%	11,000,000	100%	-	275 kg/100%	11,000,000	
19	Pengadaan tanah top soil	25 m3	2,500,000	25 m3/100%	2,500,000	100%	-	25 m3/100%	2,500,000	
20	Pengadaan kompos	150 kg	150,000	150 kg/100%	150,000	100%	-	150 kg/100%	150,000	
21	Pengadaan pupuk an. organik	40 kg	400,000	40 kg/100%	400,000	100%	-	40 kg/100%	400,000	
22	Pengadaan benih	1 paket	5,500,000	1 paket/100%	5,500,000	100%	-	1 paket/100%	5,500,000	
23	Pengadaan obat-obatan	2 liter	225,000	-	-	100%	-	100%	225,000	
24	Pembuatan/ pencampuran media	30 HOK	1,050,000	30 HOK/100%	1,050,000	100%	-	30 HOK/100%	1,050,000	
25	Pengisian kantong plastik	90 HOK	3,150,000	90 HOK/100%	3,150,000	100%	-	90 HOK/100%	3,150,000	
26	Penaburan, penyapihan, penyiraman, dll	250 HOK	8,750,000							
	Rincian :									
	a. Penaburan	30 HOK	1,050,000	25 HOK	665,000	5 HOK	385,000	30 HOK	1,050,000	
	b. Penyapihan	80 HOK	2,800,000	40 HOK	-	40 HOK	2,800,000	80 HOK	2,800,000	
	c. Penyiraman	100 HOK	3,500,000	40 HOK	-	40 HOK	3,500,000	100 HOK	3,500,000	
	d. Penyiangkan	24 HOK	840,000	8 HOK	-	14 HOK	840,000	24 HOK	840,000	
	e. Pemupukan	4 HOK	140,000	1 HOK	-	3 HOK	140,000	4 HOK	140,000	
	f. Penanggulangan HPT	6 HOK	210,000	1 HOK	-	3 HOK	210,000	6 HOK	210,000	
	g. Penyulaman	6 HOK	210,000	2 HOK	-	4 HOK	210,000	6 HOK	210,000	
27	Mandor/ pengawas	8 OB	2,400,000	1 OB	-	5 OB	2,400,000	8 OB	2,400,000	
D	PERTEMUAN KELOMPOK DAN PENDAMPINGAN									
28	Pertemuan kelompok tani	8 kali	1,200,000	6 kali	300,000	2 kali	900,000	8 kali	1,200,000	
29	Insentif pendamping	8 OB	2,400,000	-	-	-	2,400,000	8 OB	2,400,000	
30	Fotocopy rancangan RDK/RDKK dan laporan aktifitas kelompok	1 paket	250,000	70%	150,000	30%	100,000	1 paket	250,000	
	Jumlah		54,690,000		37,050,000		17,415,000		54,690,000	

Mengetahui/menyetujui
Ketua Tim Pengawas

Mahyuddin
(Mahyuddin)



Situak, 30 Desember 2011

Ketua Tim Pelaksana


Ali Rahman
(Ali Rahman)

DAFTAR PEMBAYARAN INSENTIF PENDAMPING KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) TAHUN 2011

BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2011

BERDASARKAN SK KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO. 522/2044/DINHUT/2011

No	Nama	JumlahPenerimaan (Rp)				TandaTangan
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	NURUL OKTOVAN, S.Hut	-	300.000	300.000	300.000	900.000 1. 


Situak 28 Desember 2011

Mengetahui,
PetugasPendamping


NURUL OKTOVAN, S.Hut



Yang Membayarkan,
BendaharaKelompokTani



DAFTAR PEMBAYARAN UPAH MANDOR/PENGAWAS KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) TAHUN 2011
 BULAN MEI S/D AGUSTUS 2011

No	Nama	JumlahPenerimaan (Rp)				Tanda Tangan	
		MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS		Total
1	MAHYUDDIN	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	<i>Mahyudin</i>

Situak, 28 Agustus 2011

Mengetahui,
 PetugasPendamping

[Signature]
 MWC OLEMAN, S.Hut



Yang Membayar,
 BendaharaKelompokTani

[Signature]

No. _____

Telah terima dari Bendahara kel. Paksi KBR Serumpun

Uang sejumlah Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Biaya pengadaan tanah top soil

Situak 20 Agustus 2011
Yang menerima

Rp. 2.500.000

Hilmani
HILMANI

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kep. Thau KBR Serumpun

Uang sejumlah

Satu juta Rupiah.

Untuk pembayaran _____

Biaya pengadaan Tiang pakuhan

7 SEPTEMBER 2011

Yang Inspektur

Hilmi
Hilmi

Rp. 1.000.000,-

Printshop : Jl. Jhoni Anwar No.3A Lapai Padang
 Workshop : Jl. Limau Puriuk J.14 Lapai Padang
 Telp : (0751) 447377, 444636

INVOICE

No. 000721

Tanggal, 16...../11..... / 2011...

 Perusahaan :
 Nama :
 Alamat :
 Telp. / Fax. :

Advertising - Digital Printing- Graphic Design - Display Promosi - Las Kontruksi - Pagar - Canopy - Perlengkapan LaluLintas - Sign Board

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Harga @ Rp.	Jumlah Rp.
	Papan nama	1	450.000 450.000,-	450.000,- 450.000,-

LUNAK

02 NOV 2011

Keterangan :

Yang Menyetujui,

Catatan :

1. Hak Cipta Desain diluar tanggung jawab kami.
2. Harga print tidak termasuk harga desain.
3. Untuk Digital Print, kesalahan gambar & warna setelah proof disetujui diluar tanggung jawab kami.
4. Saat penyerahan, harap diperiksa barang dalam kondisi baik & lengkap. Kami tidak melayani claim susulan.
5. Dengan menandatangani invoice ini berarti pelanggan telah menyetujui syarat-syarat yang tercantum diatas.

Hormat Kami,

Total

DP

Sisa

26/08/2011

Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
275 kg	Poly bag		11.000.000,-
			}

Jumlah Rp. 11.000.000,-

Tanda Terima



Formal kami

Emp

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kef THA UKBR Serumpuan

Uang sejumlah Tiga Ratus Ribu Rupiah.

Untuk pembayaran _____

Biaya pengadaan bahan papan muntisi
Pencaana Kerja

4 OKTOBER 2011

Yang menerima

YASRI

Rp. 300.000,-

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kertani KBR SERUMPUN

Uang sejumlah Tiga juta dua puluh lima Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan Bedang Sapih

4 NOPEMBER 2011

Yang menerima

NAMUS

(NAMUS)

Rp. 3.025.000,-

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kel. Tari KBR Serumpun

Uang sejumlah sepuluh enam puluh lima Ribu Rupiah

Untuk pembayaran pengadaan bahan bedeng TABUR /
keCambaH.

7 Agustus 2011

Yang menerima
R. J. M.
Diswaan

Rp. 165000,-

No. _____

Telah terima dari Bendahara Ket. Tari KBR SERUMPUN

Uang sejumlah SOROTUS Lima puluh Ribu Rupiah.

Untuk pembayaran Biaya pembelian pupuk lempas

10 Agustus 2011

Yang menerima

YASRI

Rp. 150.000,-

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kertawai KBR Serumpun

Uang sejumlah Dua juta seratus ribu Rupiah.

Untuk pembayaran Biaya pengadaan makanan

2 Nopember 2011

Yang menerima

Ajwir

ASWIR

Rp. 2.100.000,-

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kep.Tani KBR Serumpun

Uang sejumlah seratus lima puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Biaya pertemuan Kep.Tani

SITUU 6 Desember 2011
Yang menerima

Rp. 150.000


YASRI

Kegiatan : Pembuatan Ulem BIBIT Rakyat (KBR) 2011
 Jenis Pekerjaan : pertemuan kelompok
 Lokasi : Jorong Situak c. Grading
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : 6 DESEMBER 2011

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	Jasri									Jasri	
2	Marnis									Marnis	
3	Alian									Alian	
4	Darminah									Darminah	
5	Sarifah									Sarifah	
6	Jupri									Jupri	
7	Suib									Suib	
8	Marnis									Marnis	
9	Marnis									Marnis	
10	Mubri hadi									Mubri hadi	
11	Maimah									Maimah	
12	Risman									Risman	
13	Yusrida									Yusrida	
14	Iham									Iham	
15	Zulkifu									Zulkifu	
16	Risman									Risman	
17	Sahil									Sahil	
18	Wosnam									Wosnam	
19	Aswir									Aswir	
20	Samson									Samson	
21	Mahyuddin									Mahyuddin	
22	Parman									Parman	
23	Ikzan									Ikzan	
24	Jakbar									Jakbar	
25	Ali Rahman									Ali Rahman	
26	Hilman									Hilman	
27	Zulpanri									Zulpanri	
28	Manang									Manang	
29	Dalima									Dalima	
30	Cheria									Cheria	
	JUMLAH										

Situak, 6 Desember 2011

Mengetahui
 Petugas Pendamping kegiatan

[Signature]
 NURUL AKBAR, STP

Setuju Bayar Oleh
 Ketua Kelompok Kerja



Dibayar Oleh
 Bendaharawan Kelompok Kerja

[Signature]
 YUSRIDA

No. _____

Telah terima dari Bevdahara ket. Tani KBR. Sekumpuan

Uang sejumlah sekarus lima puluh Ribu Rupiah


Untuk pembayaran _____

Biaya Penemuan ket. Tani

SITUAH 8 NOPEMBER 2011

Yang menerima

Rp. 150.000


YASRI

Kegiatan : Pembuatan kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011
 Jenis Pekerjaan : Perencanaan kelompok
 Lokasi : Jorong Situak C. GADING
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : 8 Oktober 2011

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	YASRI										Yasri
2	RIANIS										Rianis
3	ACIATI										Acitati
4	DARWINZAH										Darwinzah
5	SAPIFAH										Sapifah
6	JUFRI										Jufri
7	SUIS										Suis
8	MARNIS										Marnis
9	MARLUK										Marluk
10	JUPRI HADI										Jupri Hadi
11	NAIMAH										Naimah
12	RISWAN										Riswan
13	YUSRIDA										Yusrida
14	ILHAM										Ilham
15	ZULKIFLI										Zulkifli
16	RISMAN										Risman
17	SAMRIL										Samril
18	WASNAM										Wasnam
19	ASWIR										Aswir
20	SAMUDAN										Samudan
21	MAMHULDIAN										Mamhul dian
22	PERMAN										Perman
23	IRWAN										Irwan
24	JAKBAR										Jakbar
25	ALI RAHMANS										Ali Rahmans
26	HILMAN										Hilman
27	ZULPANDI										Zulpandi
28	HALANG										Halang
29	DALIMA										Dalima
30	GUSRIA										Gusria
	JUMLAH										

Situak, 8 Oktober 2011

Mengetahui
 Petugas Pendamping kegiatan

[Signature]
 NURUL OCTAVIA S-HUT

Setuju Bayar Oleh
 Ketua Kelompok Kerja



Dibayar Oleh
 Bendaharawan Kelompok Kerja

[Signature]
 YUSRIDA

No. _____

Telah terima dari Bendahara kel. Tari KBR SERUMPUN

Uang sejumlah SERATUS lima puluh RIBU Rupiah.

Untuk pembayaran Biaya pertemuan kel. Tari

SITUAH 4 OKTOBER 2011
Yang menerima

Rp. 150.000

JuA
YASRI

Kegiatan : Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011
 Jenis Pekerjaan : Pertemuan Kelompok
 Lokasi : Jorong Situak U. Gading
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : 4 OKTOBER 2011

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	YASRI										Yasri
2	MARNIS										Marnis
3	AGIATI										Agia
4	DARMINZAH										Darmin
5	SARIPAH										Saripah
6	JUPRI										Jupri
7	SUIB										Suib
8	MARNIS										Marnis
9	NAHLUN										Nahlun
10	Jupri Hadi										Jupri Hadi
11	Naimah										Naimah
12	RISWAN										Riswan
13	YUSRIDA										Yusrida
14	ILHAM										Ilham
15	Zulkifli										Zulkifli
16	Risman										Risman
17	SAHRIL										Sahril
18	WAZNAM										Waznam
19	ASWIR										Aswir
20	SAMUDU										Samudu
21	MAMYUDDIN										Mamyudin
22	DARMAN										Darman
23	IRZAN										Irzan
24	JAKBAR										Jakbar
25	Ali Rahman										Ali Rahman
26	ZULPARI										Zulpari
27	NAWANG										Nawang
28	DALIMA										Dalima
29	HILMAN										Hilman
30	GUSRIAN										Gusriani
	JUMLAH										

SITUAK, 4 OKTOBER 2011

Mengetahui
 Petugas Pendamping kegiatan

[Signature]
 MURU OKTOVANSI HUT

Setuju Bayar Oleh
 Ketua Kelompok Kerja



Dibayar Oleh
 Bendaharawan Kelompok Kerja

[Signature]
 YUSRIDA

No. _____

Telah terima dari Bendahara KRT Trai KBR Serumpun

Uang sejumlah lima Ratus dua puluh Lima Ribu Rupiah.

Untuk pembayaran Cupah pemangkasan tanaman

3 SEPTEMBER 2011

Yang menerima
ASWIR

Rp. 525000,-

Kegiatan : Pembuatan Kebun Bibit Ranyat (KBR) 2011
 Jenis Pekerjaan : pemasangan Naungan
 Lokasi : Jorong Situak, L. Gading
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : Agustus 2011

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	ASWIR							3	35.000	105000	<i>Aswir</i>
2	NANANG							3	35.000	10.5000	<i>Nanang</i>
3	PARMAN							3	35.000	10.5000	<i>Parman</i>
4	ASWAR							3	35.000	10.5000	<i>Aswar</i>
5	NAMNIS							3	35.000	10.5000	<i>Namnis</i>
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
	JUMLAH							15		525000	

SITUAK, AGUSTUS 2011

Mengetahui
 Petugas Pendamping kegiatan

[Signature]

NARUL OKTAVIAN, SH



Setuju Bayar Oleh
 Ketua Kelompok Kerja

[Signature]
YASRI

Dibayar Oleh
 Bendaharawan Kelompok Kerja

[Signature]
Yusuf DA

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kel Tani KBR SERUMPUN

Uang sejumlah Delapan juta tujuh Ratus Lima puluh
Ribu Rupiah.

Untuk pembayaran Upah Penaburan Buih/pengapitan,

penjiraman, penjiangan.

27 Desember 2011

Yang menerima

Diwi

METRIA

Rp. 8.750.000,-

Kegiatan : *Pembuatan Kebun Bibit Ralejat (KBR) 2011*
 Jenis Pekerjaan : *Penaburan Benih, Penyapuhan, Penyiraman, Penyirangan.*
 Lokasi : *Jorong Situak - C. Gading*
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : *11 SEPTEMBER 2011*

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	<i>NETRIA</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>JAKBAR</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>DALIMA</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>CTUSPIA</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>ILHAM</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>ALIASI</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>MARNIS</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>ZULKIFLI</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>MAIMAH</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>AGWAR</i>							<i>25</i>	<i>35.000</i>	<i>875000</i>	<i>[Signature]</i>
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
	JUMLAH							<i>250</i>		<i>8750.000</i>	

Situak ... 11 SEPTEMBER ... 2011

Mengetahui
 Petugas Pendamping kegiatan
[Signature]
 NUPUL OKTAVIANI S.H.



Setuju Bayar Oleh
 Ketua Kelompok Kerja
[Signature]
 HASRI

Dibayar Oleh
 Bendaharawan Kelompok Kerja
[Signature]
 YUSRI

No. _____

Telah terima dari Bendahara Keltan KBR SERUMPUN

Uang sejumlah TIGA RATUS Lima puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran UPAH PEMBUNGTAN PONTON KERJA

29 OKTOBER 2011

Yang menerima

Hulman

HULMAN

Rp. 350.000,-

Kegiatan : Pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) 2011
 Jenis Pekerjaan : Pembedaan pondok kerja
 Lokasi : Jorong Situak U. Gading
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : September 2011

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	HILMAN							3	35.000	10.5000	Hilman
2	AGATI							3	35.000	10.5000	Agati
3	YASRI							3	35.000	10.5000	Yasri
4	ASWIR							1	35.000	3.5000	Aswir
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
	JUMLAH							10		350.000	

SITUAK, SEPTEMBER 2011

Mengetahui
 Petugas Pendamping kegiatan

M. O. S. H.
 MURUL OETAWAN, S.H.



Setuju Bayar Oleh
 Ketua Kelompok Kerja

Yasri
 YASRI

Dibayar Oleh
 Bendaharawan Kelompok Kerja

Yusri
 YUSRI

No. _____

Telah terima dari Bendahara kel. tani KBR Sekumpun

Uang sejumlah Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran _____

Cipah pembelian dan pemasangan

Papan Nama, Mutasi

5 SEPTEMBER 2011

Yang menerima

Rp. 350.000,-

Jendral
SAHRIL

Kegiatan : Pembuatan kebun BIBIT kacang (KBR) 2011
 Jenis Pekerjaan : Pembuatan dan pemasangan papan nama, mutasi
 Lokasi : Jorong Situak U Candang
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : OKTOBER 2011

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	Satrik							2	35.000	70.000	<i>Satrik</i>
2	Awir							2	35.000	70.000	<i>Awir</i>
3	Parman							2	35.000	70.000	<i>Parman</i>
4	Ikzhal							2	35.000	70.000	<i>Ikzhal</i>
5	Aliari							2	35.000	70.000	<i>Aliari</i>
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
JUMLAH								10.		350.000	

Situak, OKTOBER 2011

Mengetahui
Petugas Pendamping kegiatan

[Signature]
KIRUL OKTOGAN, S.H.



Setuju Bayar Oleh
Ketua Kelompok Kerja

[Signature]
MASRI

Dibayar Oleh
Bendaharawan Kelompok Kerja

[Signature]
YUSRI DA
YUSRI DA

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kepala KBR SERUMPUN

Uang sejumlah Satu juta lima puluh Ribun Rupiah

Untuk pembayaran Upah pembuat dan penempatan media

3 NOPEMBER 2018

Yang menerima

JURZAN

Rp. 1.050.000,-

Kegiatan : *Pembinaan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011*
 Jenis Pekerjaan : *Pembinaan/pemaduan media*
 Lokasi : *Jorong Situa U. LINDING*
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : *AGUSTUS 2011*

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	IRZAN							5	35.000	175000	<i>[Signature]</i>
2	NAHLUN							5	35.000	175000	<i>[Signature]</i>
3	ZULFANRI							5	35.000	175000	<i>[Signature]</i>
4	MARNIS							5	35.000	175000	<i>[Signature]</i>
5	USRI A							5	35000	175000	<i>[Signature]</i>
6	JAKBAR							5	35.000	175000	<i>[Signature]</i>
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
	JUMLAH							30		1.050000	

Situaa Agustus 2011

Mengetahui
Petugas Pendamping kegiatan

[Signature]
MUEL OTHMAN S.H



Setuju Bayar Oleh
Ketua Kelompok Kerja

[Signature]
TASRI

Dibayar Oleh
Bendaharawan Kelompok Kerja

[Signature]
[Name]

No. _____

Telah terima dari Bendahara Lehi Talu KBE Sekumpul

Uang sejumlah tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah

Untuk pembayaran upah pengisian kantong plastik

SITUAK 12 SEPTEMBER 2011

Zany Mumpima

(Signature)
NORJA

Rp. 3.150,000

Kegiatan : Pembuatan Lubem Bibit Kacang (KBR) 2011
 Jenis Pekerjaan : Pengisian Leanteng Plastik
 Lokasi : Jerong Situau U. GADING
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : 6 - 11 SEPTEMBER 2011

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	NETRIA							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
2	MITRAH							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
3	ELLY QUSIATI							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
4	MEGAWATI							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
5	DARWILIZAH							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
6	PARMAN							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
7	ILHAM							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
8	ZUBAIDAH							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
9	MURLIAN							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
10	AISAH							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
11	TAYANNI							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
12	SRIH							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
13	FATIMAH							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
14	ROSITA.							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
15	HAIMAH							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
JUMLAH								90		3.150.000	

Situau... 12 SEPTEMBER... 2011

Mengetahui
 Petugas Pendamping kegiatan
[Signature]
 NURUL OCTAVIANI Hut

Setuju Bayar Oleh
 Ketua Kelompok Kerja
[Signature]
 JASE



Dibayar Oleh
 Bendaharawan Kelompok Kerja
[Signature]
 FUSRIDA

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kat TAUIKAR SERUMPUR

Uang sejumlah Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran _____

UPAH PEMASANGAN INTLOZI AIR DAN
BAU PENAMPUNGAN. ✓

28 Desember 2011

Yang Menerima

RSM

RISWAN

Rp. 350.000

Kegiatan : Pembuatan kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011
 Jenis Pekerjaan : Pemasangan Instalasi Ate dan Bale penampungan
 Lokasi : Jorong Situak U. Gadang
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : Desember 2011

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	Riswadi							2	35.000	70.000	Riswadi
2	Nanang							2	35.000	70.000	Nanang
3	Pakman							2	35.000	70.000	Pakman
4	Jupri							2	35.000	70.000	Jupri
5	Seni							2	35.000	70.000	Seni
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
	JUMLAH							10		350.000	

Situak Desember 2011

Mengetahui
 Petugas Pendamping kegiatan

[Signature]
 MURUL OBTWAN, S.Pd



Setuju Bayar Oleh
 Ketua Kelompok Kerja

[Signature]
 YASRI

Dibayar Oleh
 Bendaharawan Kelompok Kerja

[Signature]
 YUSRIWA

No. _____

Telah terima dari Bendahara Kot Tahi KBR SERCUMPUN

Uang sejumlah Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran _____

upah pembuatan bedeng tabur dan
Bedeng Sapit.

2 NOPEMBER 2011

Jang menerima

RSW
R. S. W. S.

Rp. 1.050.000,-

Kegiatan : *Pembuatan Kebun Bibit Padi (KBR) 2011*
 Jenis Pekerjaan : *Pembuatan Bedeng Tabur/Bedeng Sapih.*
 Lokasi : *Jorong Situak L. Cading*
 SPKN No. / Tanggal :
 Tanggal Pekerjaan : *AGUSTUS 2011*

No	Nama Pekerja	Tanggal Kegiatan						Jumlah HOK	Biaya/Hari	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	<i>RISWAN</i>							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
2	<i>DARMINZAH</i>							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
3	<i>NAIMAH</i>							6	35.000	210.000	<i>[Signature]</i>
4	<i>ASWAR</i>							5	35.000	175.000	<i>[Signature]</i>
5	<i>SAMRIL</i>							5	35.000	175.000	<i>[Signature]</i>
6	<i>SUIB</i>							2	35.000	70.000	<i>[Signature]</i>
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
	JUMLAH							30		1.050.000	

SITUAK, AGUSTUS 2011

Mengetahui
Petugas Pendamping kegiatan

[Signature]
NURUL OKTAVIAN, S.H.



Setuju Bayar Oleh
Ketua Kelompok Kerja

[Signature]
JASRI

Dibayar Oleh
Bendaharawan Kelompok Kerja

[Signature]
FUSYIDA
